



		2018								2019	
Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

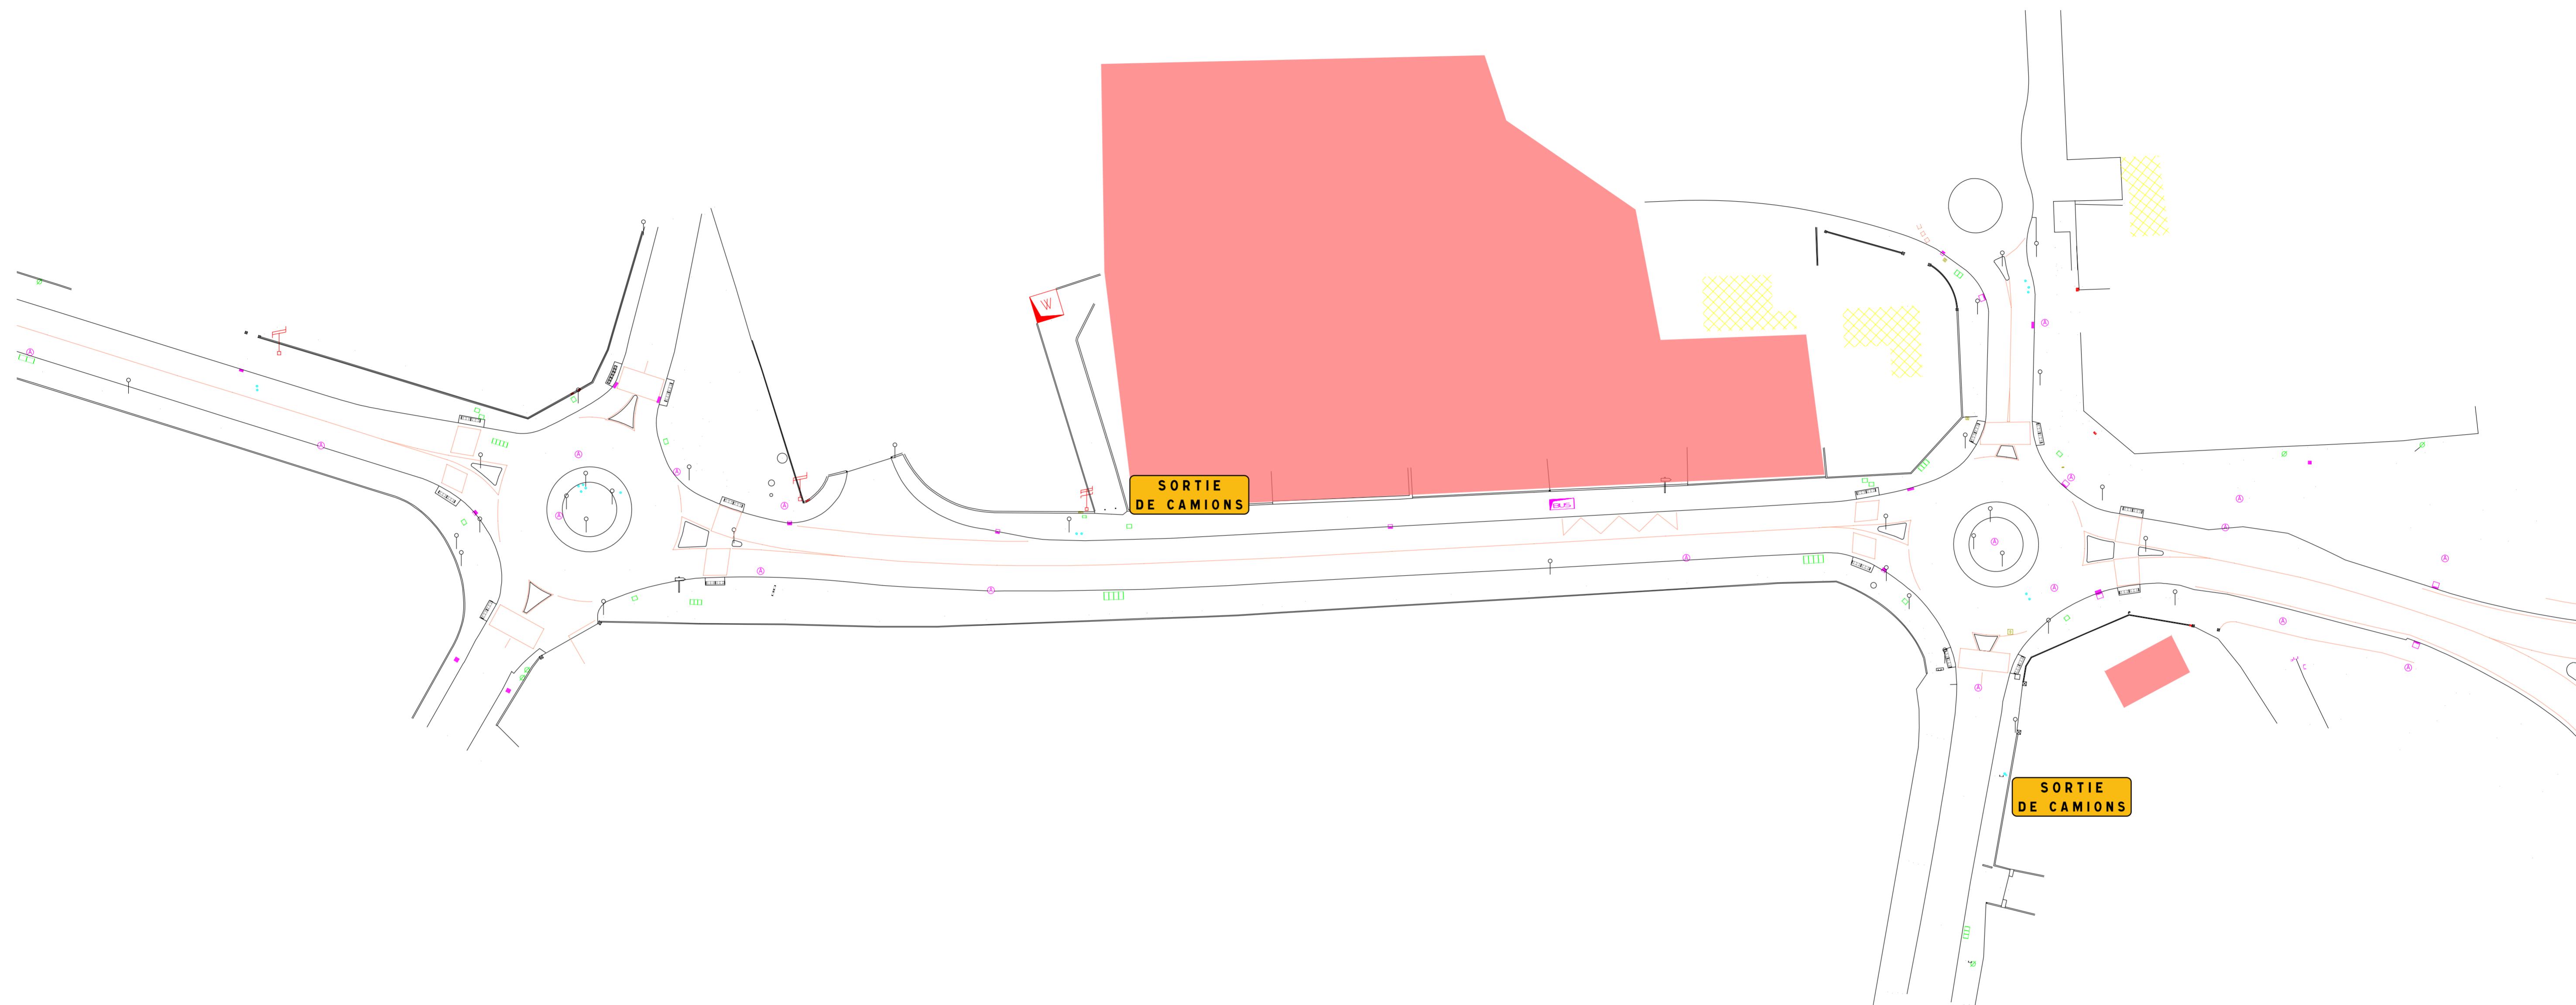


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2018						
			Mars			Avril			
			11	12	13	14	15	16	17
Phase 0 - Travaux Prépa			[Gantt bar spanning from start of March to end of April]						
Installations de chantier			[Gantt bar spanning from start of March to end of April]						
Installations de chantier	12/03/2018 08:00	12/04/2018 16:00	[Gantt bar from March 12 to April 12]						
Installation secondaire			[Gantt bar spanning from start of March to end of April]						
Installation secondaire	13/04/2018 08:00	26/04/2018 16:00	[Gantt bar from April 13 to April 26]						

				2018					2019		
Mars	Avril	Mai	Juin	Juliet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

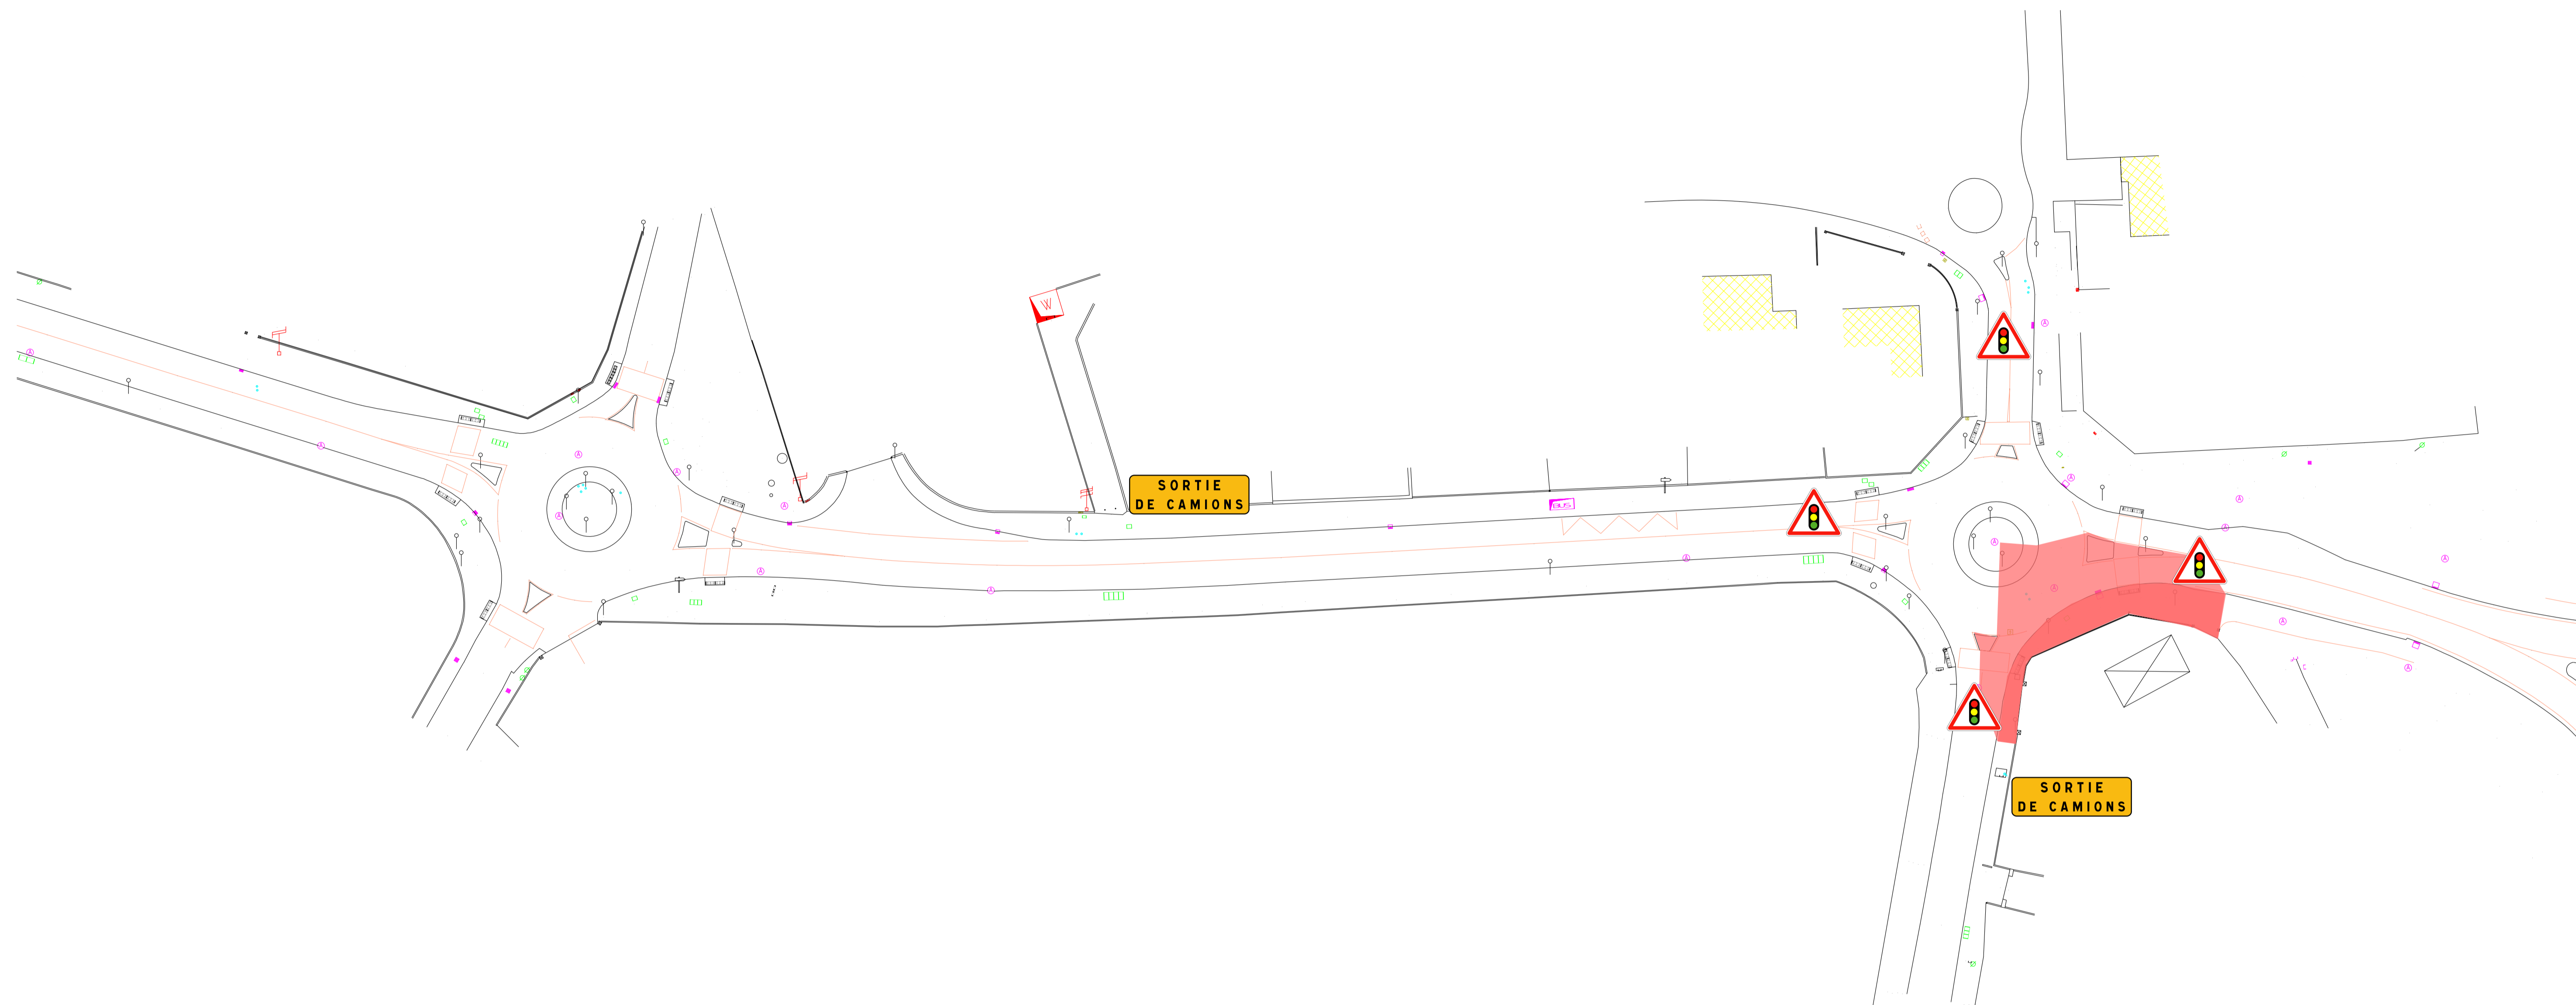

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2018				
			Juin		Juillet		
			26	27	28	29	30
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est							
GirEst : zone des trottoirs							
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations	03/07/2018 09:55	05/07/2018 09:10		■			
Pose de bordures et pavés	10/07/2018 09:10	11/07/2018 09:10			■ ■ ■ ■		
Réglage terre végétale	11/07/2018 09:10	12/07/2018 09:10			■		
Démolition bordures et pavés	27/06/2018 09:55	29/06/2018 09:55	■				
Fraisage et dégrappage du bord	29/06/2018 09:55	03/07/2018 09:55	■ ■ ■ ■ ■				
Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord	06/07/2018 10:39	10/07/2018 09:10		■			
Revêtements trottoir	23/07/2018 16:00	23/07/2018 16:00					
GirEst : zone complète							
Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour)	19/07/2018 09:10	20/07/2018 15:00				■	
Installations et signalisation	26/06/2018 08:00	27/06/2018 09:55	■ ■ ■ ■				
Couche de réglage / planie	17/07/2018 08:00	19/07/2018 09:10				■	
Signalisation	23/07/2018 16:00	23/07/2018 16:00					
Fraisage de chaussée	12/07/2018 09:10	13/07/2018 15:00			■		


2018						2019					
Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

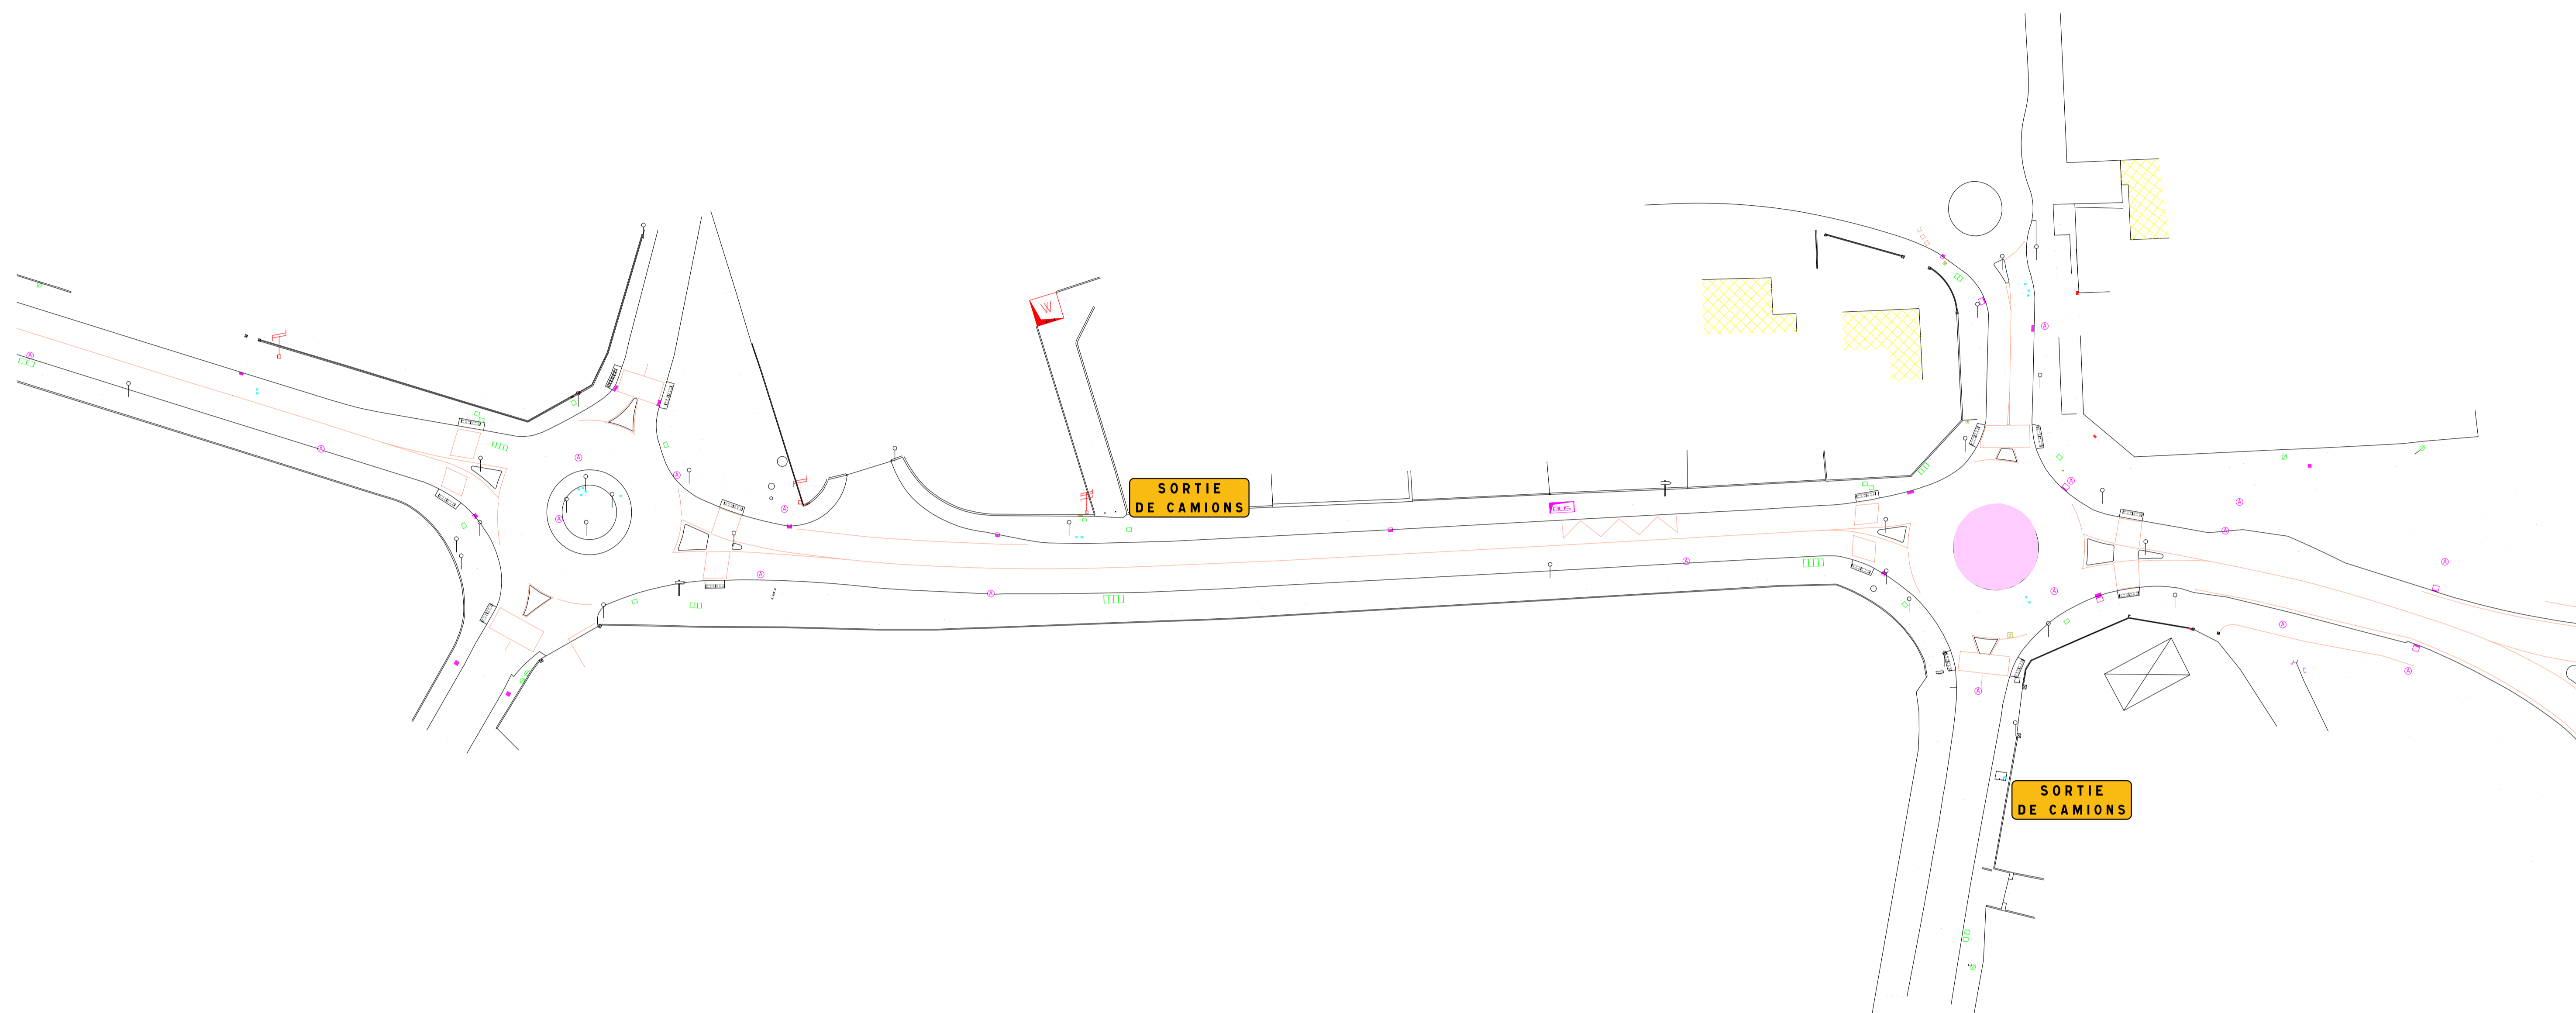

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2018	
			34	35
Phase 3b : Aménagement du TPC				
Terre-plein central				
Phase 3b : Aménagement du TPC (Terrassement, végétalisation...)	24/08/2018 08:00	31/08/2018 15:00		

Phase 6 : Pavage final

2018										2019	
Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février

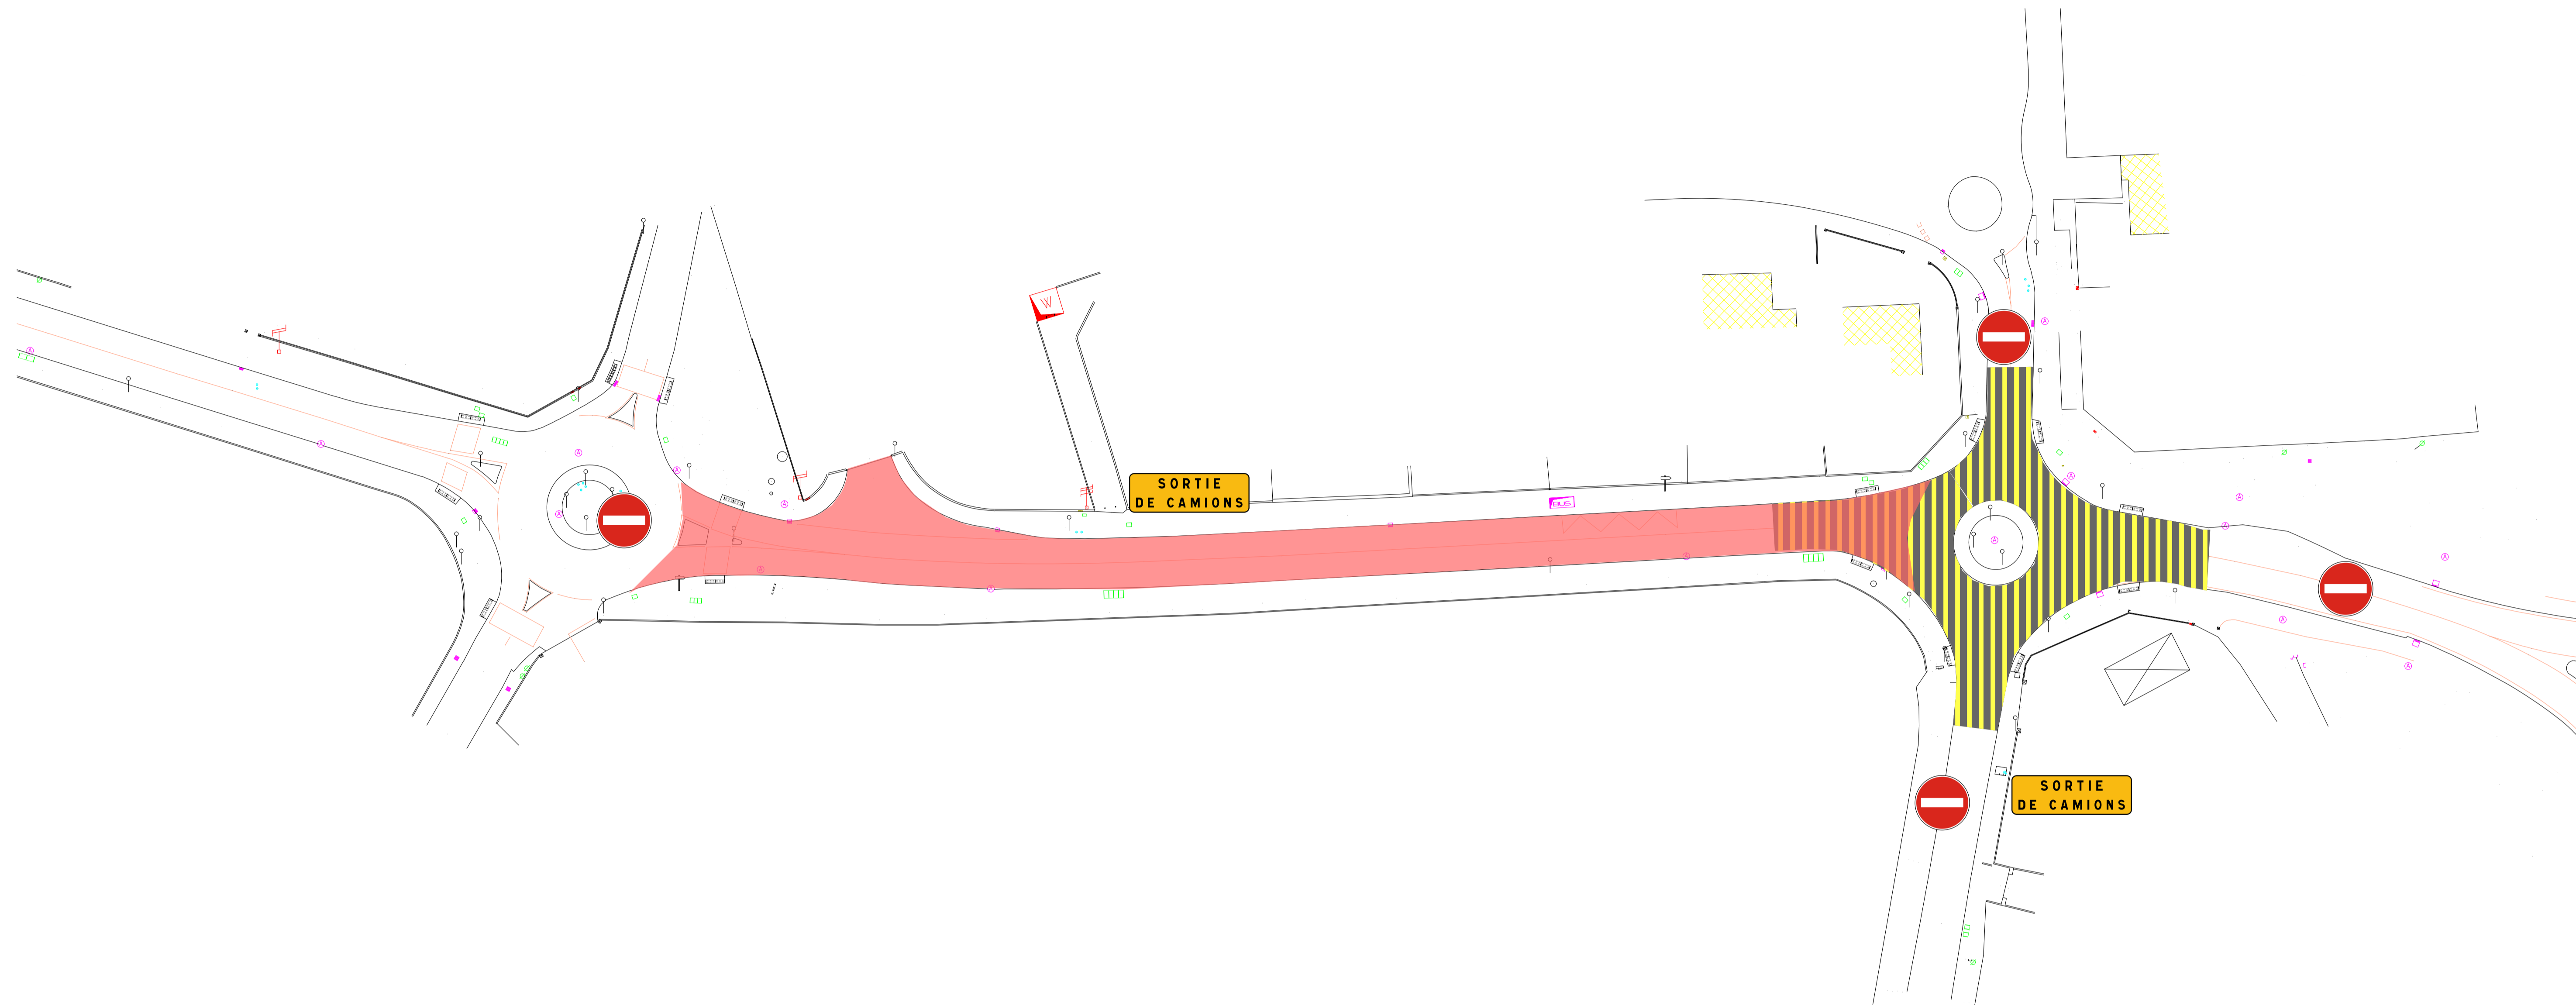

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019		
			Février		
			6	7	8
Phase 6 : Pavage final					
Chaussée complète					
Signalisation et travaux préparatoires	08/02/2019 08:00	12/02/2019 15:00	-----		
Couche de roulement 3A (Circulation bi-directionnel de nuit)	14/02/2019 08:00	15/02/2019 15:00		■■■■■■■■■■	
Couche de roulement 3B (Circulation bi-directionnel de nuit)	21/02/2019 08:00	21/02/2019 15:00			■■■■
Chaussée giratoire					■■■■
Couche de roulement giratoire Croix-Blanche (Circulation déviée de weekend)	21/02/2019 08:00	21/02/2019 15:00			■■■■
