

Phase 1 - Préparation chantier

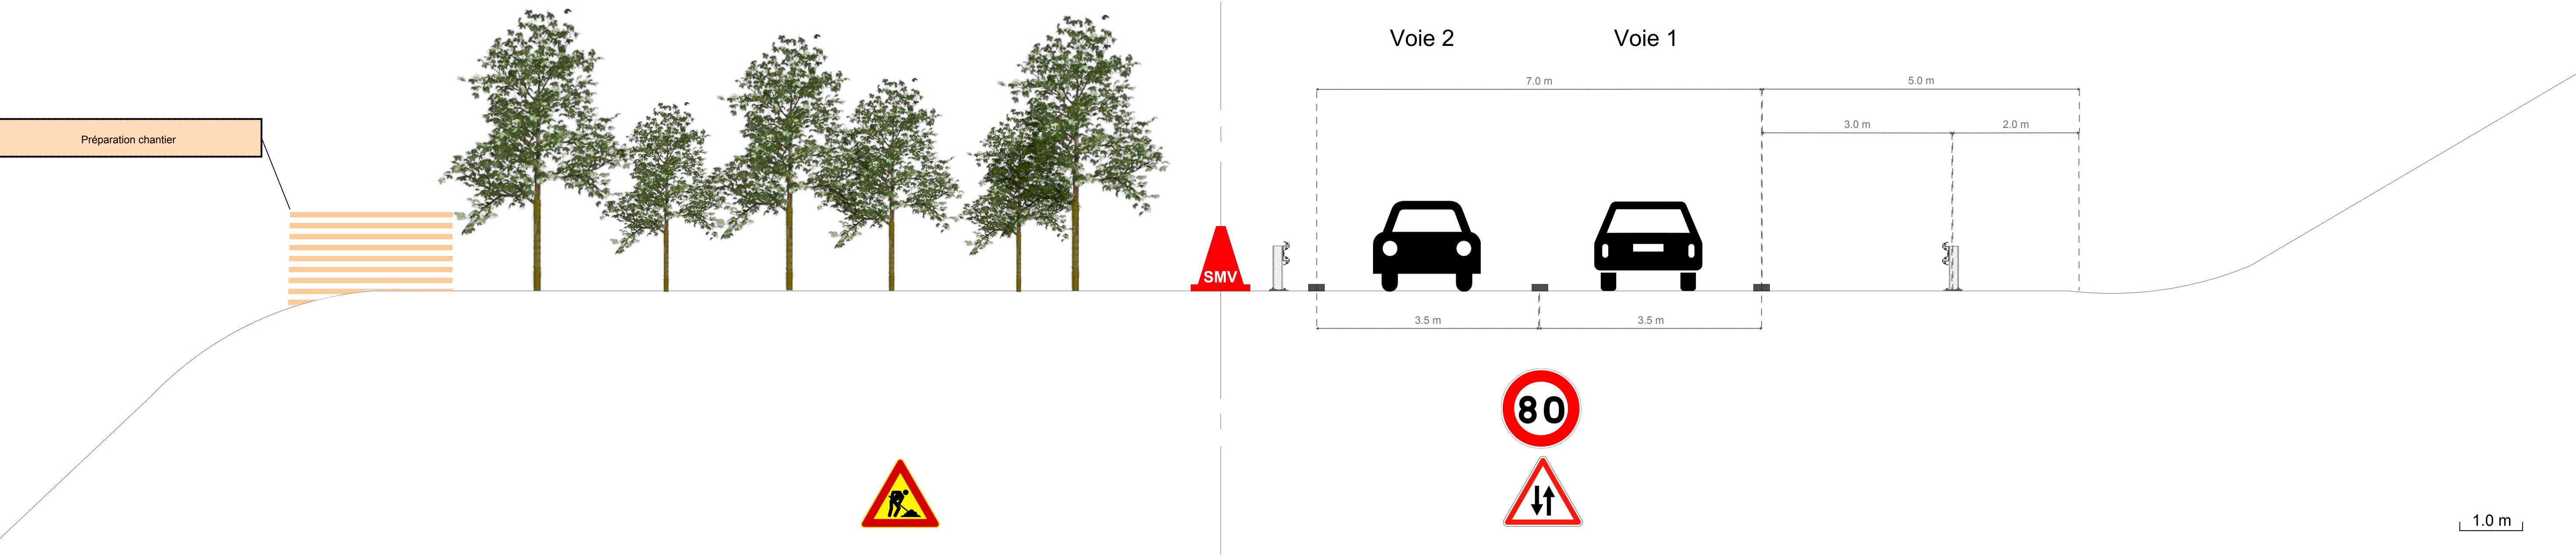


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 2 - Déboisement

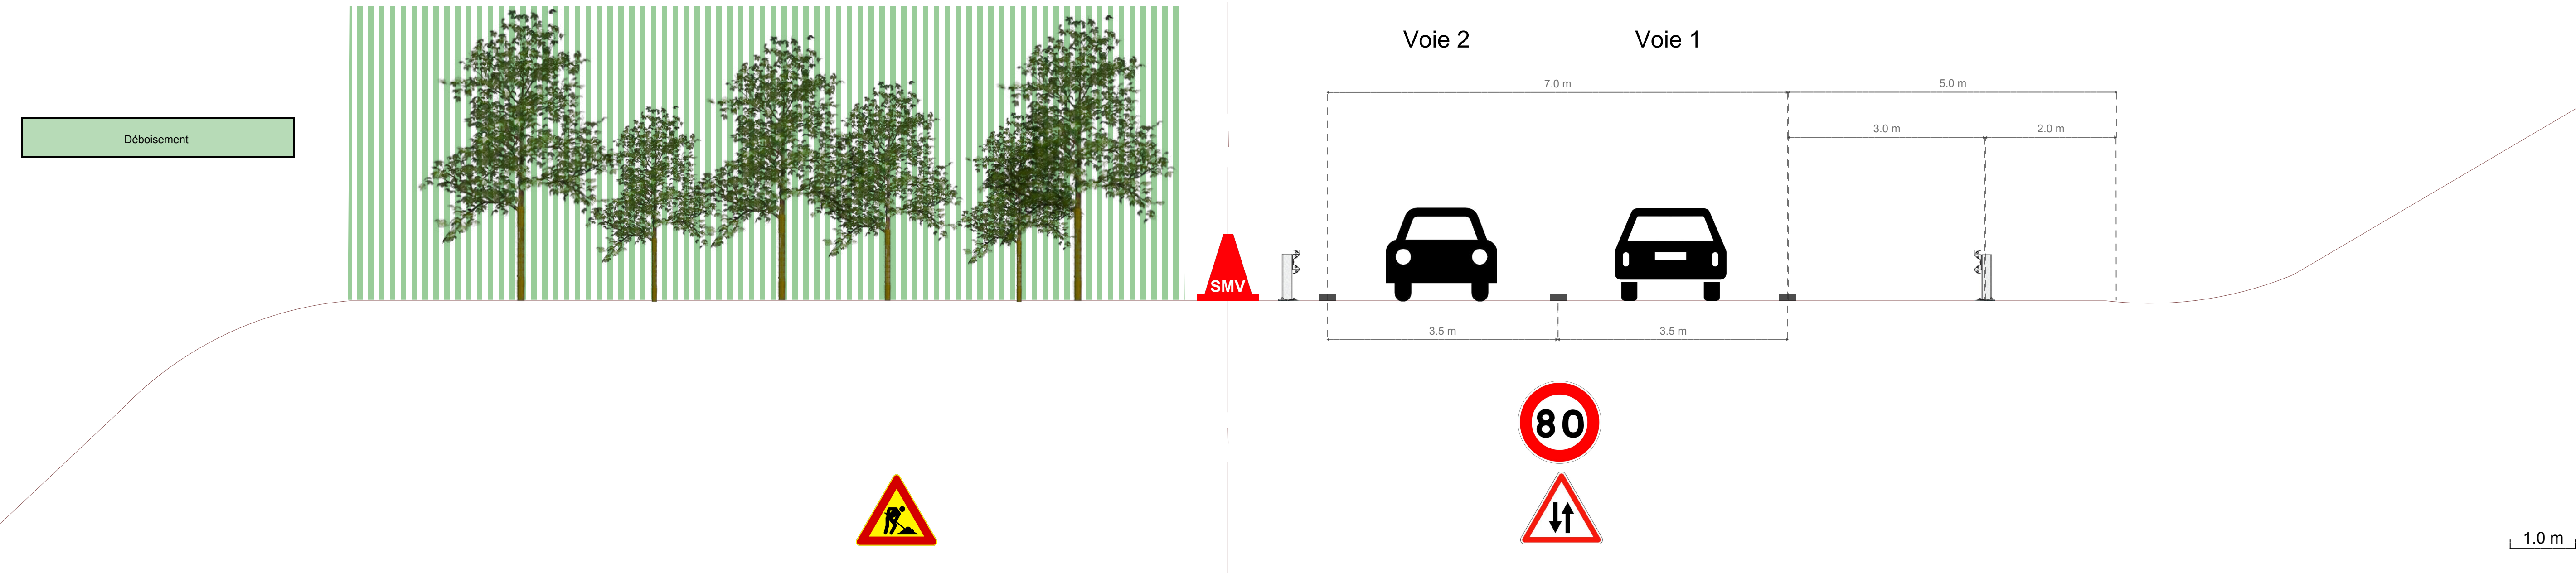


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST

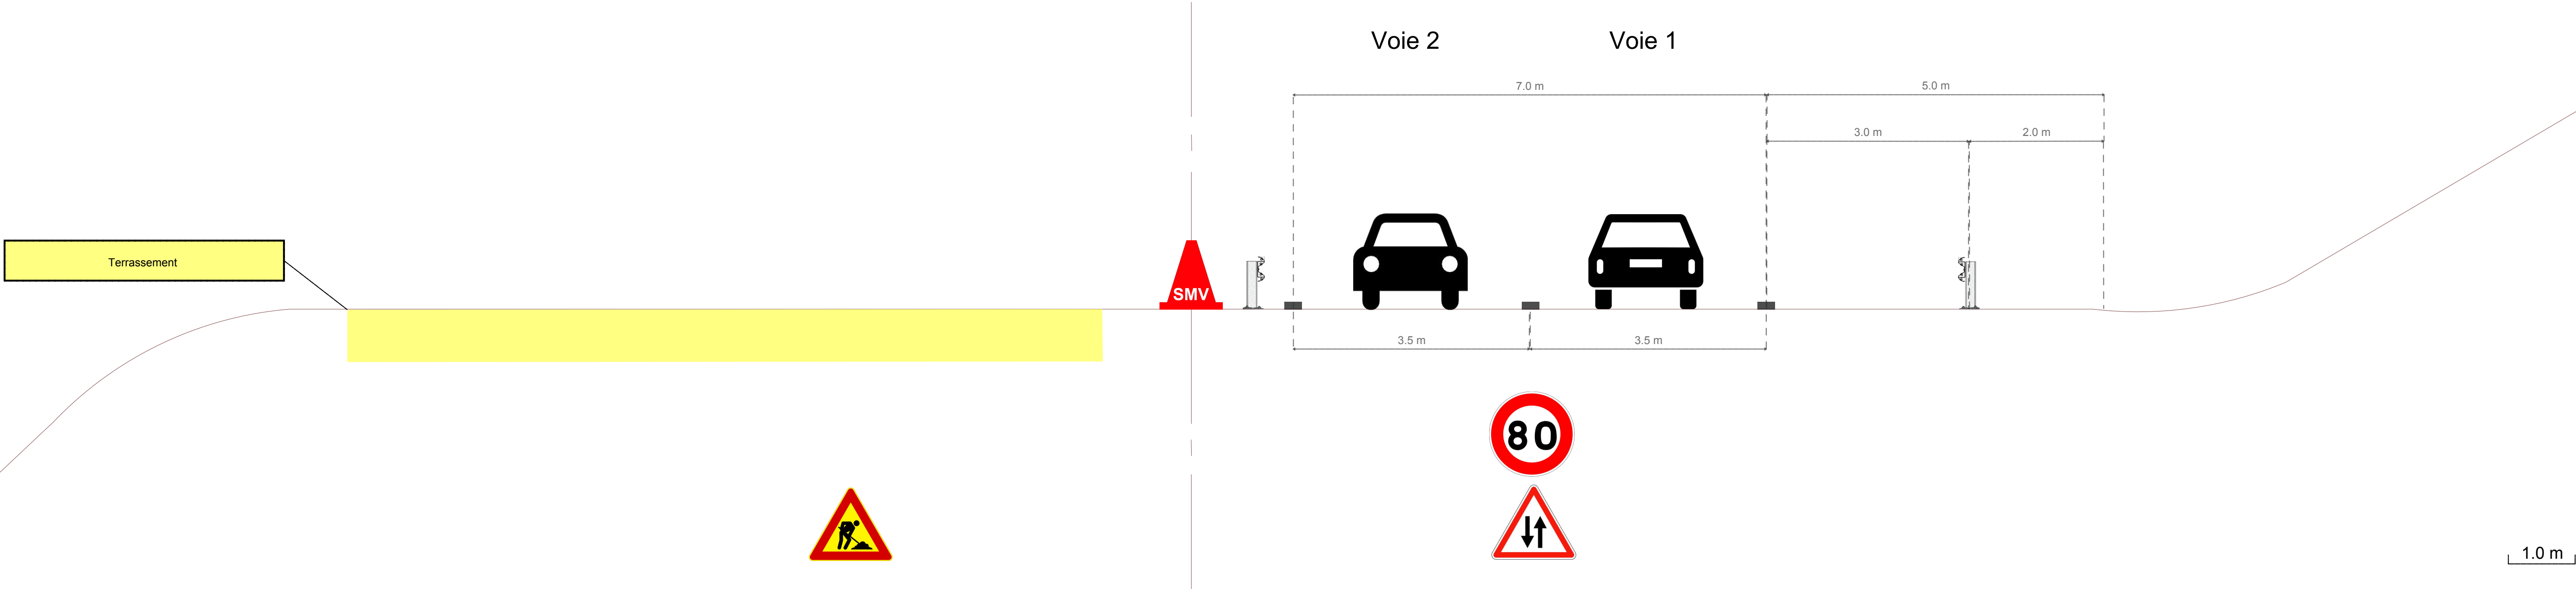


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																										
			Janvier					Fevrier					Mars					Avril					Mai					Juin	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																										
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																										
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																										
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																										
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																										
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																										
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																										
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de formé																										
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																										
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																										
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																										
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																										
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																										
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																										
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																										
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																										
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																										
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																										
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																										
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																										
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																										
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																										
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrasse..																										
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																										
Phase 11 - Mise en place TPC			Ph..																										
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																										
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Ph																										
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																										

Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST

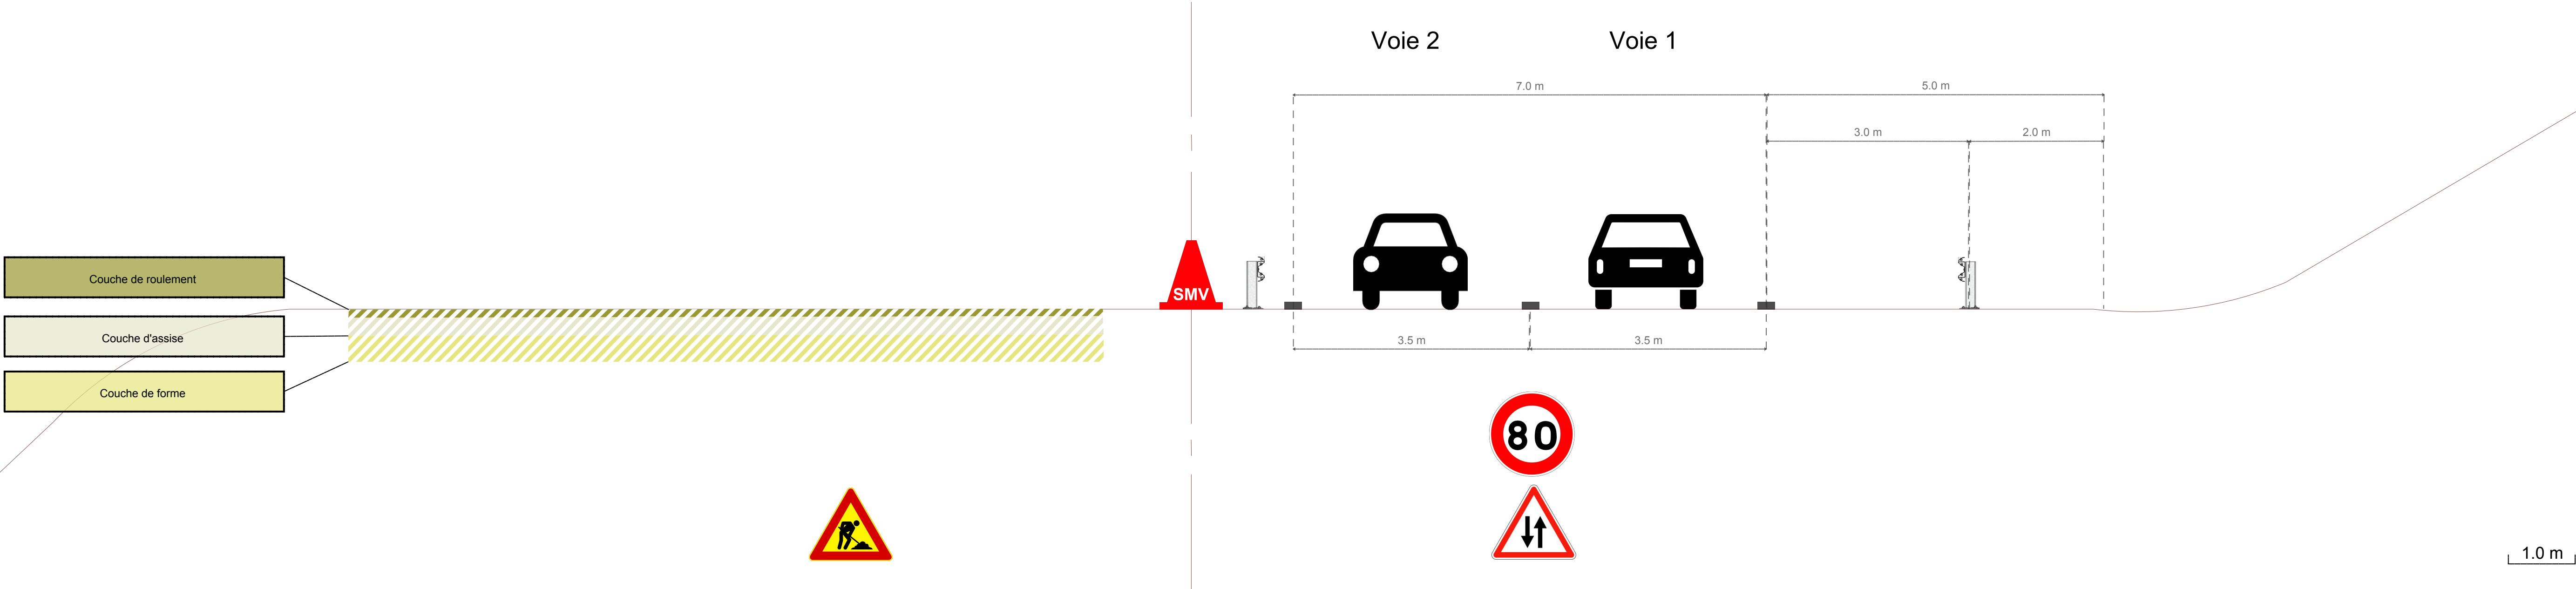


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST							Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																			
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10					Terrassement																			
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST							Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																			
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10					Couche de forme																			
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10					Couche d'assise																			
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10					Couche de roulement																			
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST							Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																			
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00									Installation équipements															
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST											Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST															
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39									Démontage équipements															
Phase 7 - Terrassement chaussée EST											Phase 7 - Terrassement chaussée EST															
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55									Terrassement															
Phase 8 - Mise en place chaussée EST											Phase 8 - Mise en place chaussée EST															
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55													Couche de forme											
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55													Couche d'assise											
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14													Couche de roulement											
Phase 9 - Equipements chaussée EST															Phase 9 - Equipements chaussée EST											
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14													Installation équipements											
Phase 10 - Terrassement TPC															Phase 10 - Terrassement TPC											
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00													Terrassement TPC											
Phase 11 - Mise en place TPC															Phase 11 - Mise en place TPC											
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00													Mise en place du TPC + Végétation											
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2															Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2											
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00													Ouverture autoroute											

Phase 5 - Equipements chaussée OUEST

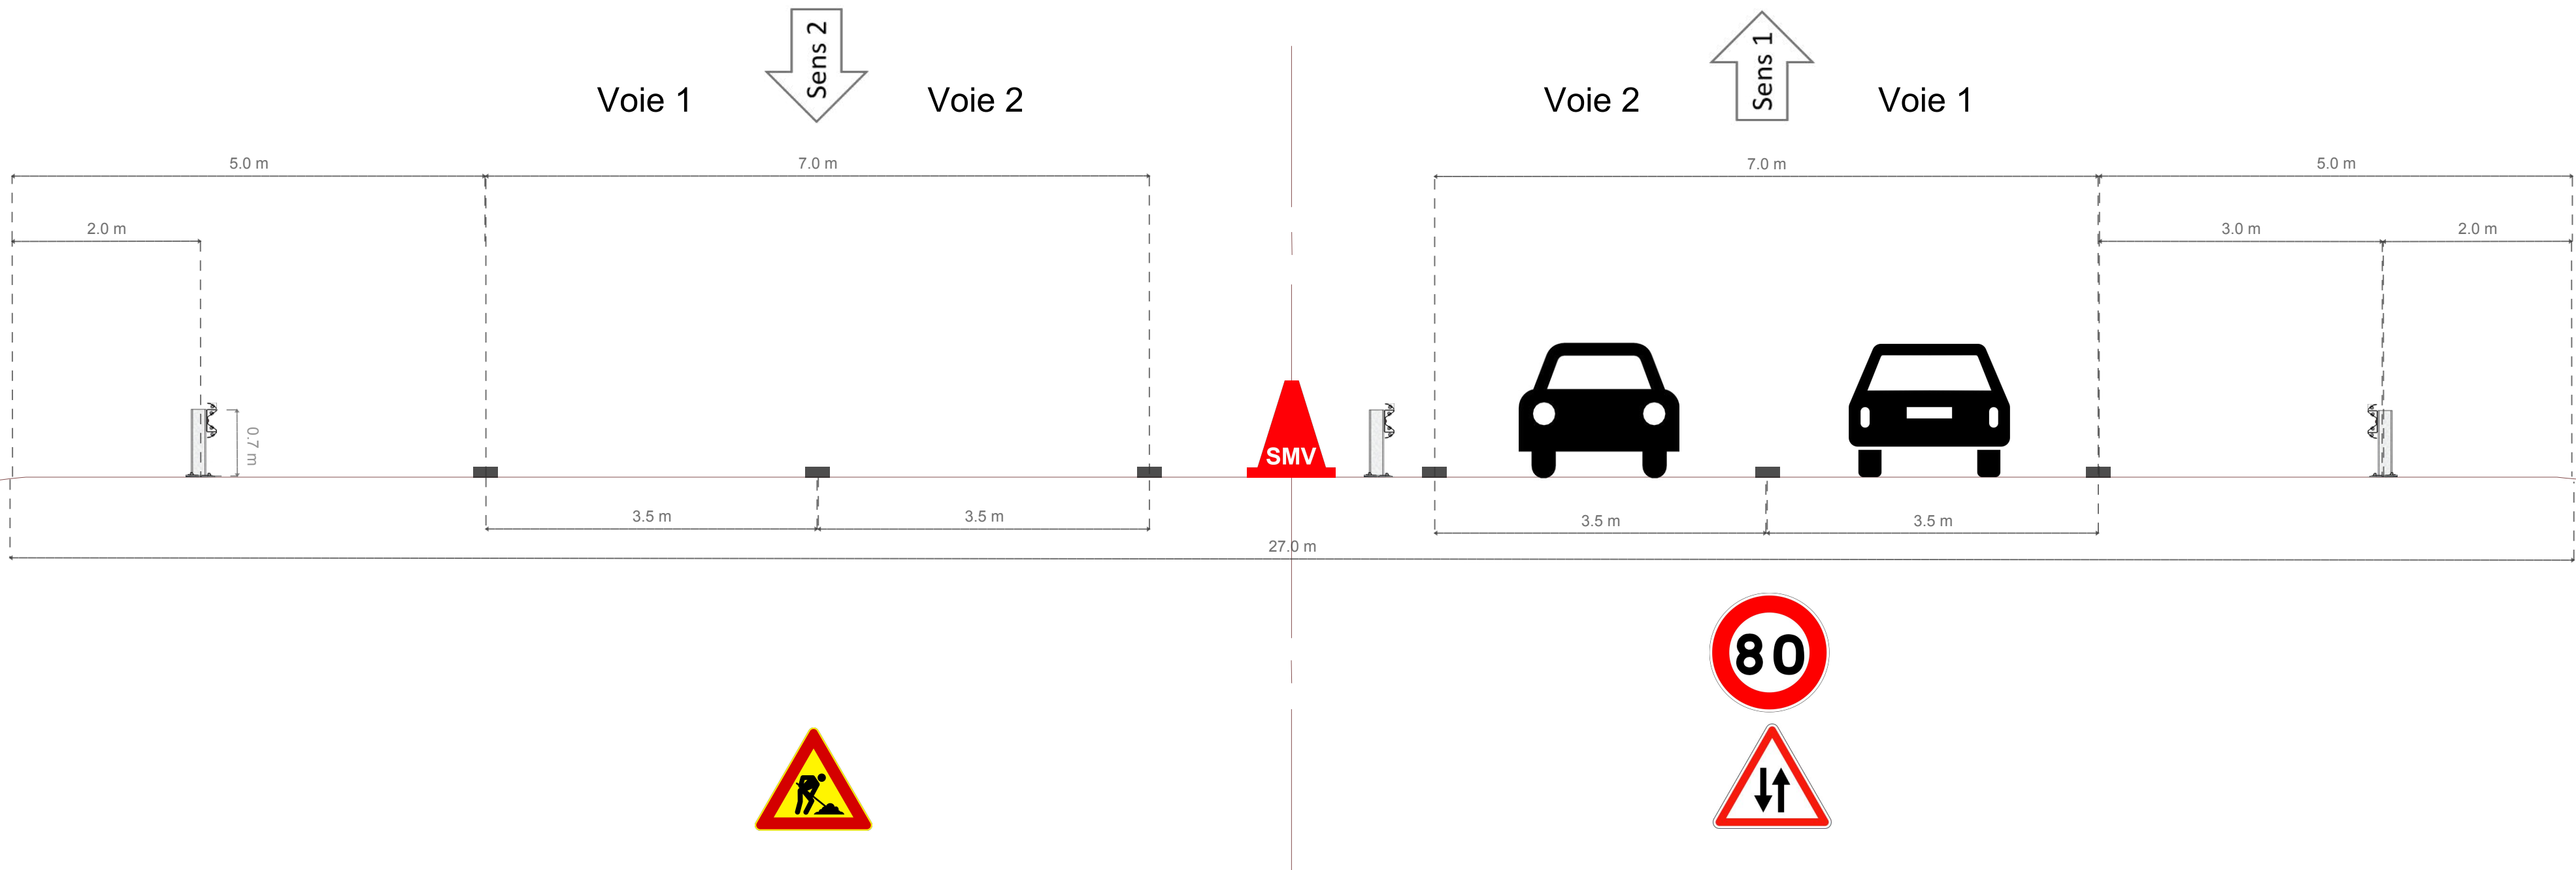


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST

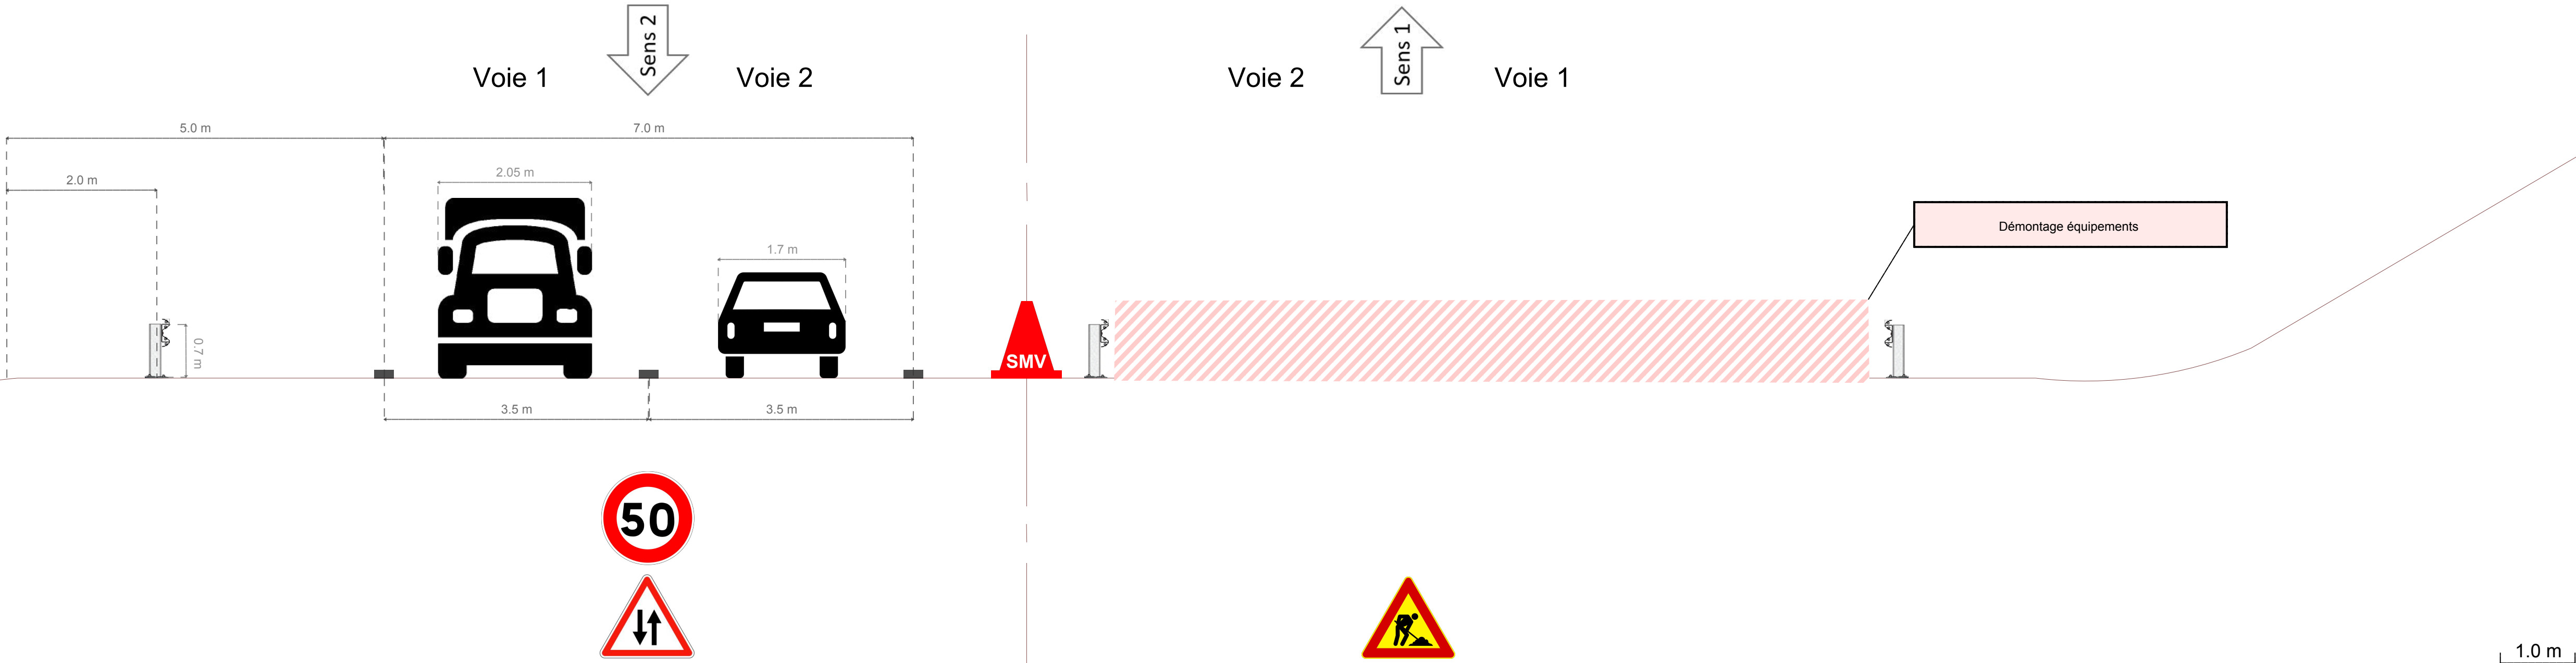


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier				Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 7 - Terrassement chaussée EST

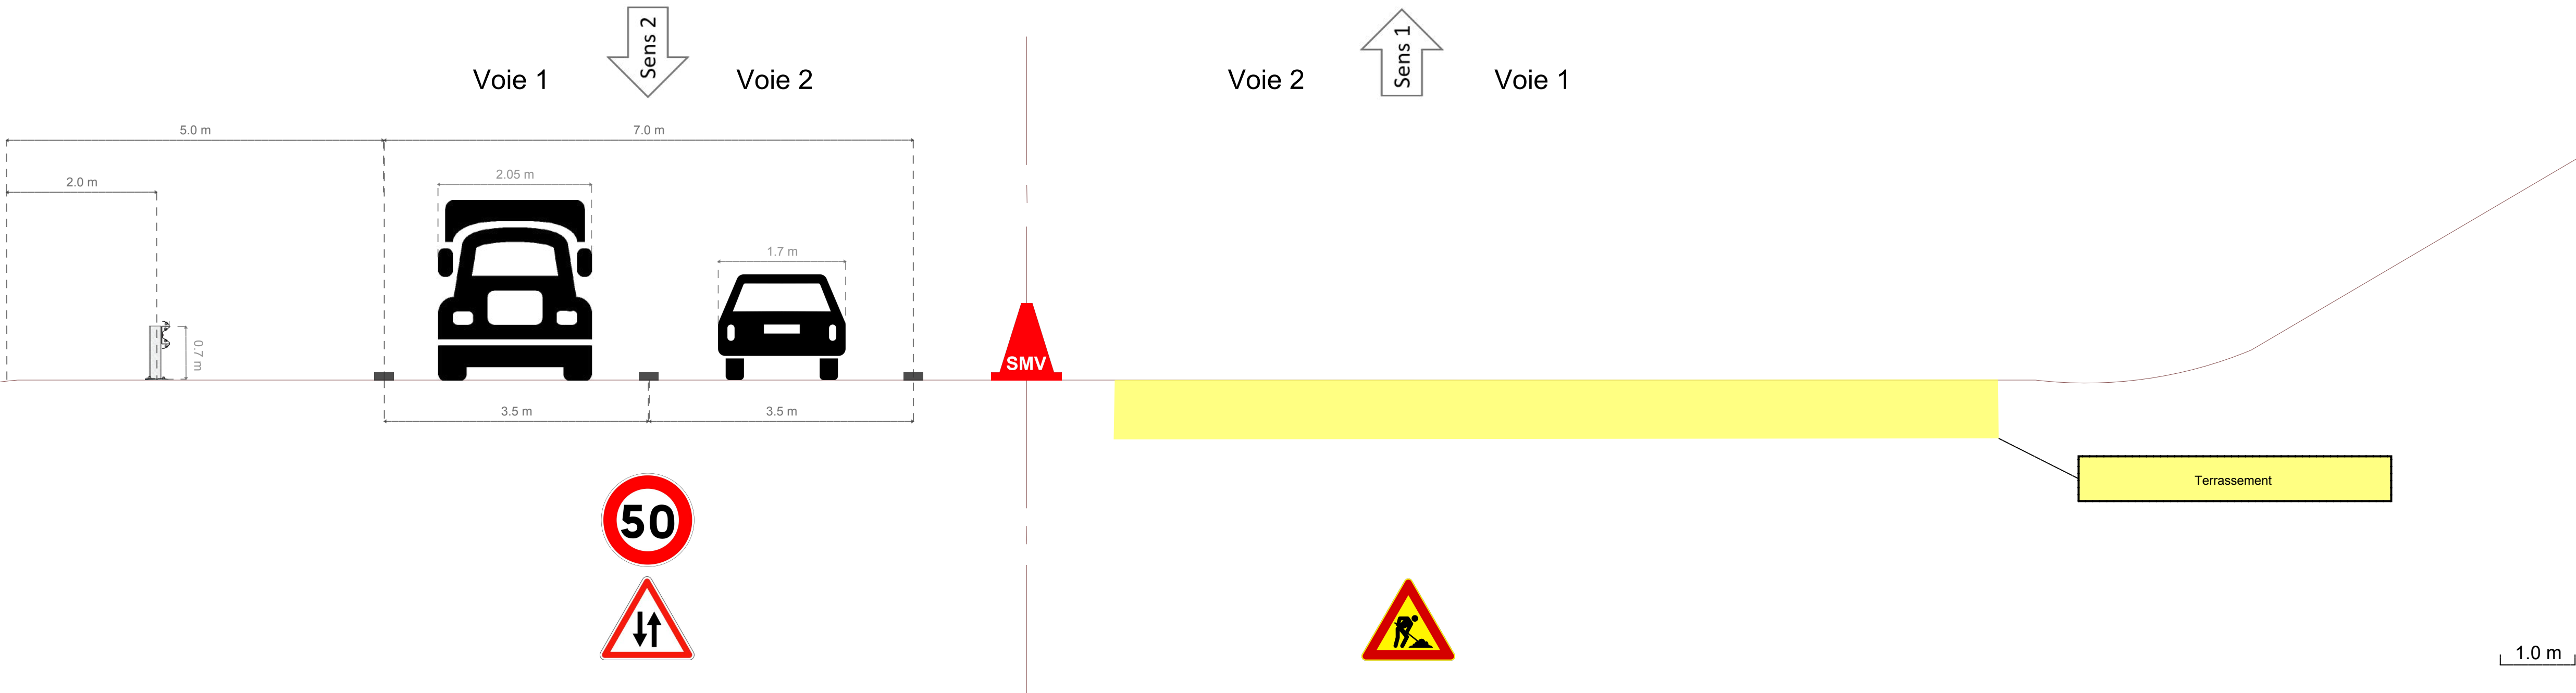


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier					Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de formé																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrasse..																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Ph..																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Ph																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 8 - Mise en place chaussée EST

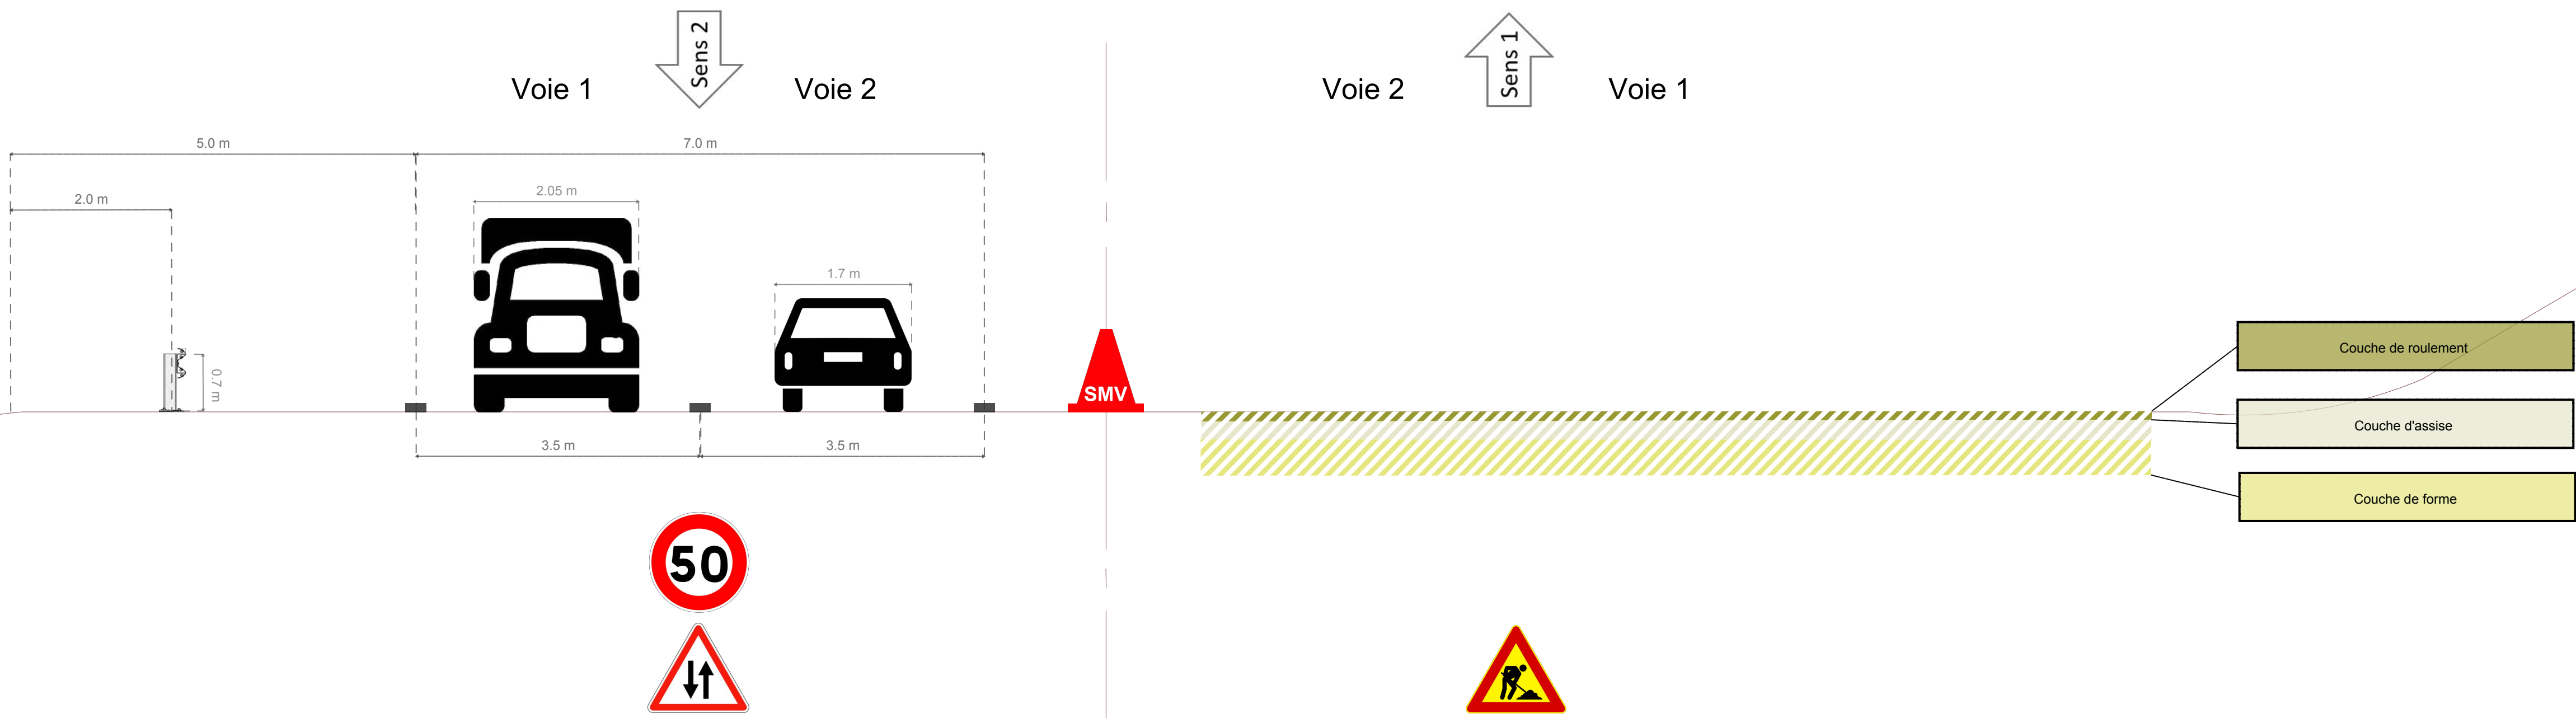


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																									
			Janvier					Fevrier					Mars					Avril				Mai					Juin	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																									
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																									
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																									
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																									
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																									
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																									
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																									
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de formé																									
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																									
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																									
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																									
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																									
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																									
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																									
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																									
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																									
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																									
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																									
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																									
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																									
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																									
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																									
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrasse..																									
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																									
Phase 11 - Mise en place TPC			Ph..																									
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																									
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Ph																									
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																									

Phase 9 - Equipements chaussée EST

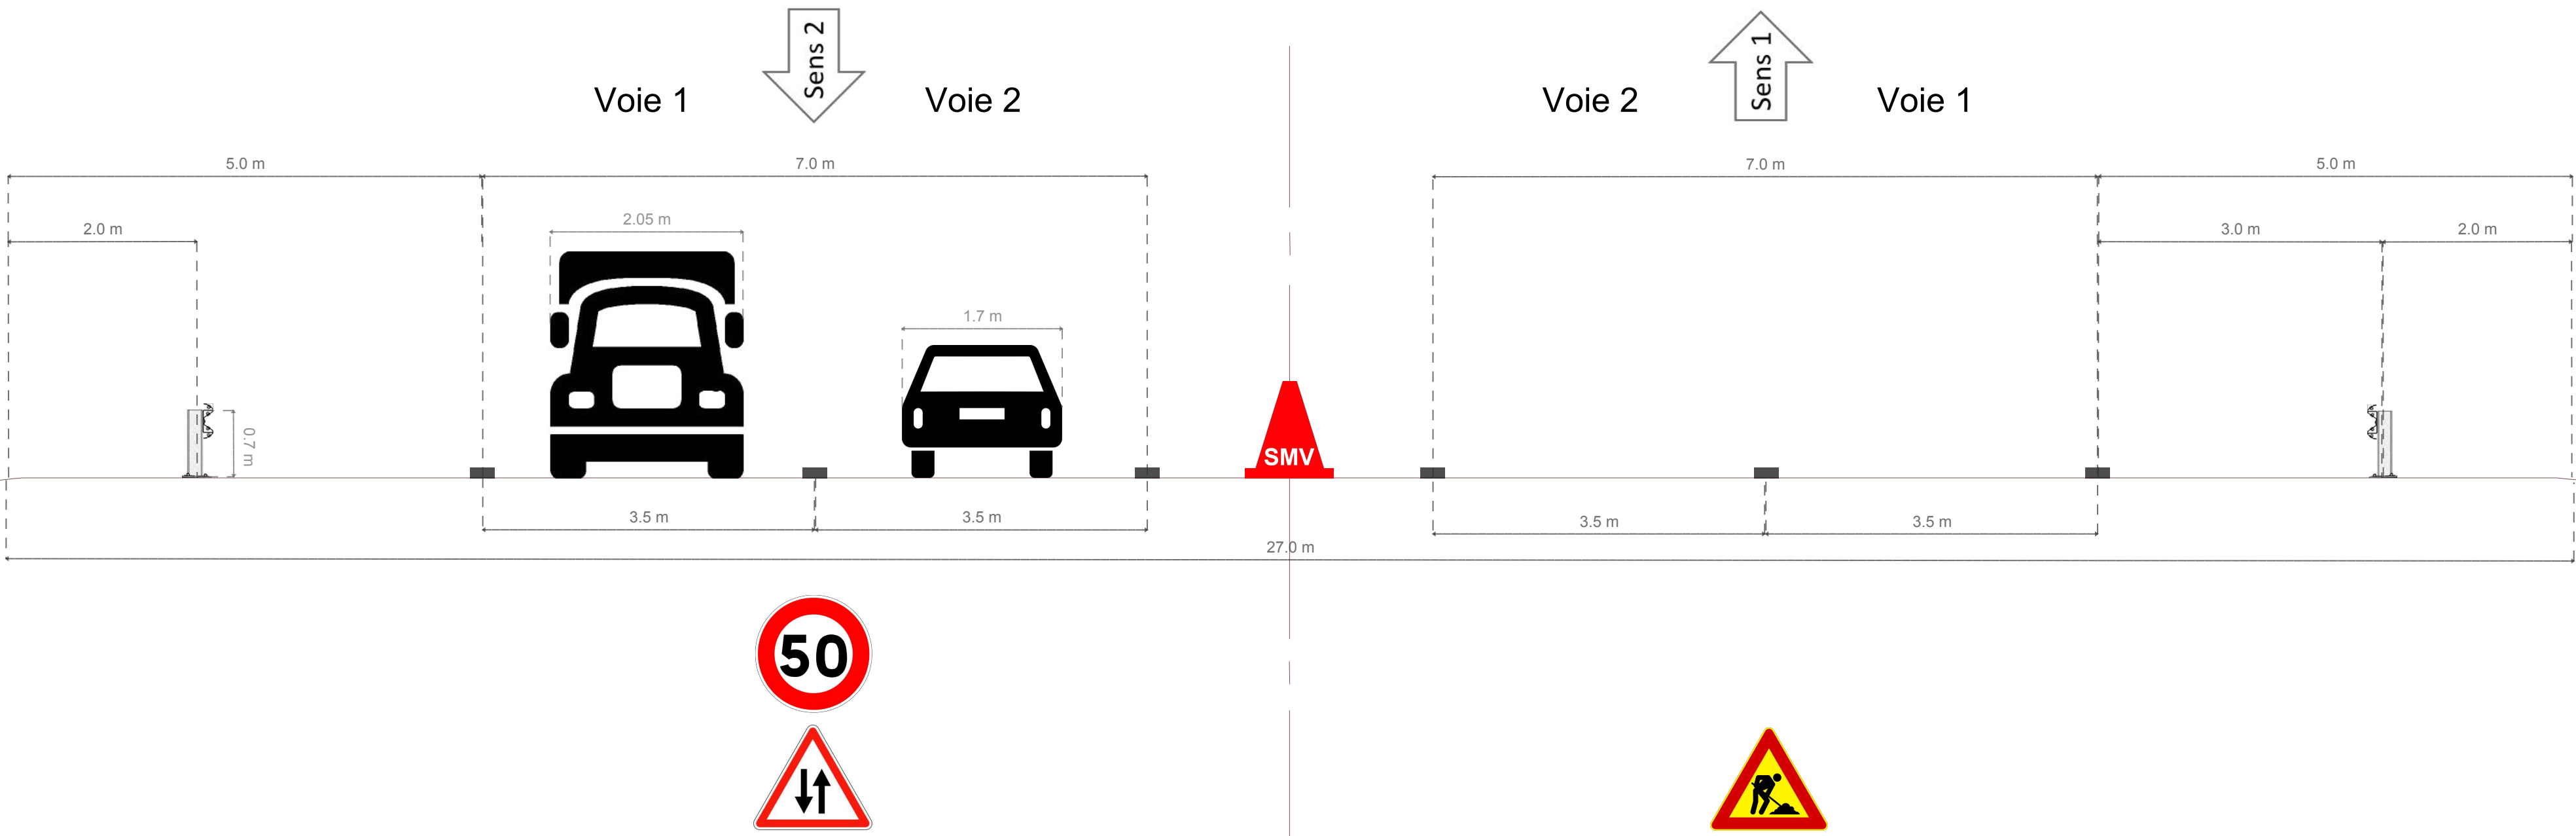


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																									
			Janvier					Fevrier					Mars					Avril				Mai					Juin	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																									
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																									
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																									
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																									
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																									
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																									
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																									
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																									
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																									
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																									
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																									
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																									
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																									
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																									
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																									
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																									
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																									
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																									
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																									
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																									
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																									
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																									
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																									
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																									
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																									
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																									
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																									
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																									

The diagram illustrates a road construction site layout with two lanes and a central TPC. Key dimensions and features include:

- Lane Widths:** 5.0 m (outer), 7.0 m (inner), and 3.5 m (inner lane width).
- Vehicle Positions:** A truck is positioned in the left lane, and a car is positioned in the right lane.
- Traffic Signs:** 50 km/h speed limit signs, no entry signs, and a warning sign for construction.
- TPC Dimensions:** The TPC is 7.0 m wide and 3.5 m high.
- Scale:** 1.0 m.

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																												
			Janvier					Fevrier					Mars					Avril					Mai					Juin			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																												
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																												
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																												
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																												
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																												
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																												
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																												
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																												
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																												
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																												
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																												
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																												
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																												
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																												
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																												
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																												
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																												
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																												
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																												
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																												
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																												
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																												
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																												
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																												
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																												
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																												
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																												
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																												

Phase 11 - Mise en place TPC

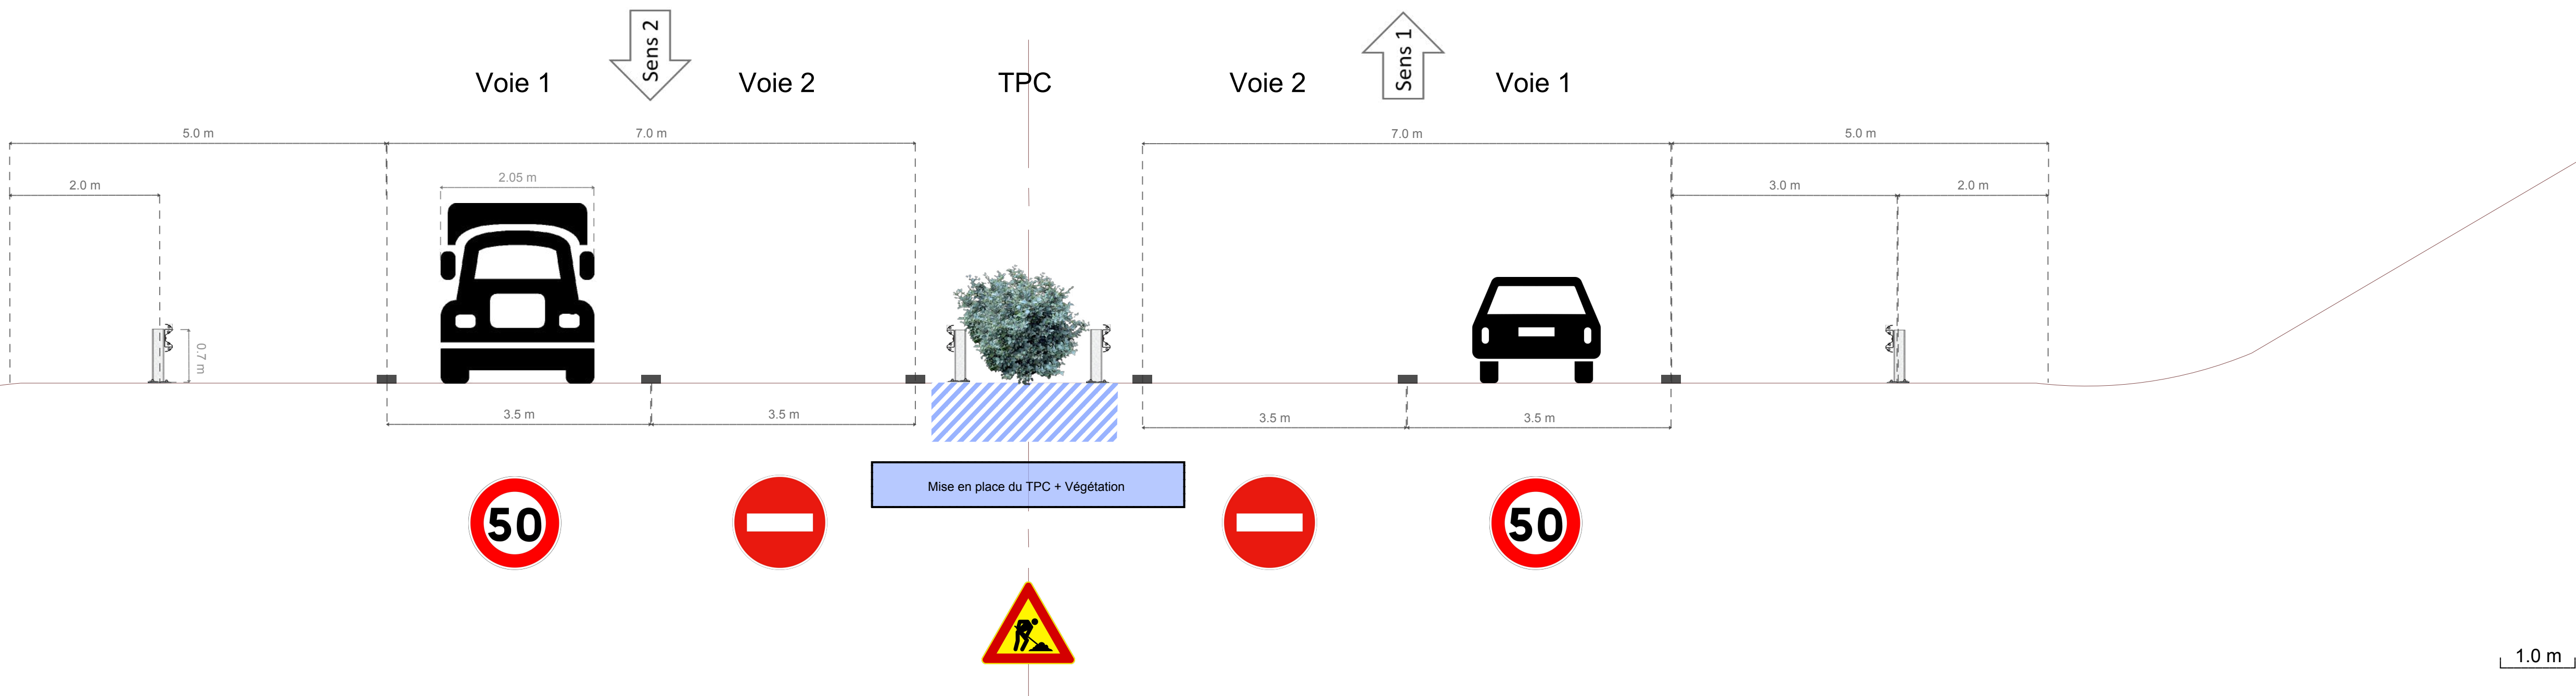


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier					Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de formé																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrasse..																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Ph..																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Ph																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							

Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2

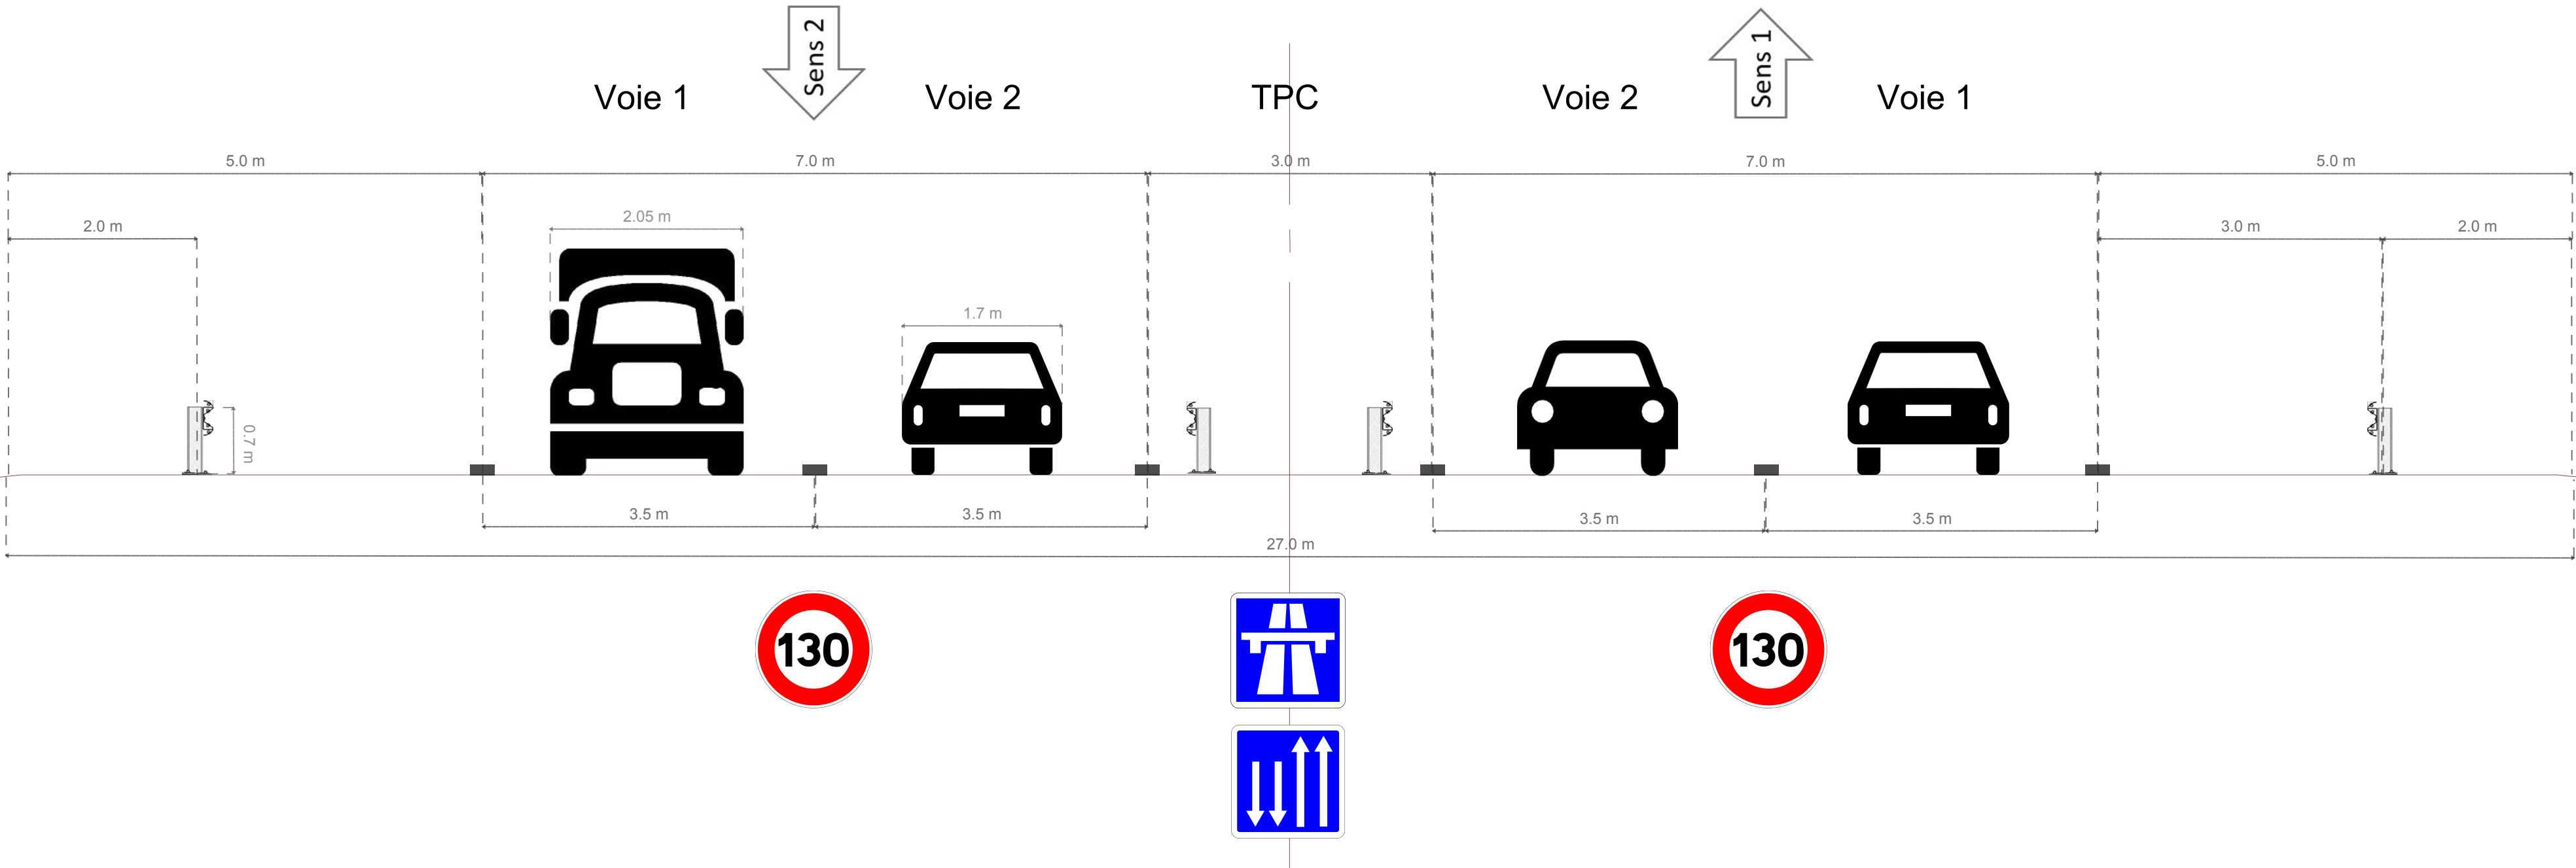


Diagramme de Gantt du phasage :

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019																							
			Janvier					Fevrier				Mars				Avril				Mai				Juin		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Phase 1 - Préparation chantier			Phase 1 - Préparation chantier																							
Préparation chantier	02/01/2019 08:00	03/01/2019 16:00	Préparation chantier																							
Phase 2 - Déboisement			Phase 2 - Déboisement																							
Déboisement	04/01/2019 08:00	17/01/2019 16:00	Déboisement																							
Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST			Phase 3 - Terrassement chaussée OUEST																							
Terrassement	18/01/2019 08:00	31/01/2019 13:10	Terrassement																							
Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST			Phase 4 - Mise en place chaussée OUEST																							
Couche de forme	31/01/2019 13:10	12/02/2019 13:10	Couche de forme																							
Couche d'assise	12/02/2019 13:10	21/02/2019 13:10	Couche d'assise																							
Couche de roulement	21/02/2019 13:10	04/03/2019 13:10	Couche de roulement																							
Phase 5 - Equipements chaussée OUEST			Phase 5 - Equipements chaussée OUEST																							
Installation équipements	04/03/2019 13:10	11/03/2019 16:00	Installation équipements																							
Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST			Phase 6 - Démontage équipements chaussée EST																							
Démontage équipements	12/03/2019 08:00	21/03/2019 13:39	Démontage équipements																							
Phase 7 - Terrassement chaussée EST			Phase 7 - Terrassement chaussée EST																							
Terrassement	21/03/2019 13:39	05/04/2019 11:55	Terrassement																							
Phase 8 - Mise en place chaussée EST			Phase 8 - Mise en place chaussée EST																							
Couche de forme	05/04/2019 11:55	18/04/2019 11:55	Couche de forme																							
Couche d'assise	18/04/2019 11:55	30/04/2019 11:55	Couche d'assise																							
Couche de roulement	30/04/2019 11:55	08/05/2019 13:14	Couche de roulement																							
Phase 9 - Equipements chaussée EST			Phase 9 - Equipements chaussée EST																							
Installation équipements	08/05/2019 13:14	20/05/2019 13:14	Installation équipements																							
Phase 10 - Terrassement TPC			Phase 10 - Terrassement TPC																							
Terrassement TPC	20/05/2019 13:14	31/05/2019 16:00	Terrassement TPC																							
Phase 11 - Mise en place TPC			Phase 11 - Mise en place TPC																							
Mise en place du TPC + Végétation	03/06/2019 08:00	12/06/2019 16:00	Mise en place du TPC + Végétation																							
Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2			Phase 12 - Ouverture autoroute en 2x2																							
Ouverture autoroute	13/06/2019 08:00	13/06/2019 08:00	Ouverture autoroute																							
