


2018																																						
Mai												Juin																										
20			21			22			23			24			25																							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Aménagement	
Bordures	
Bordures et pavés	
Chaussée et canalisations	
Couche roulement récap jour	
Couche roulement récap nuit	
Fraisage	
Planie	
Réseaux, remblayages et structure	
Revêtements	
Signalisation	
Terre végétale	

Commencée :

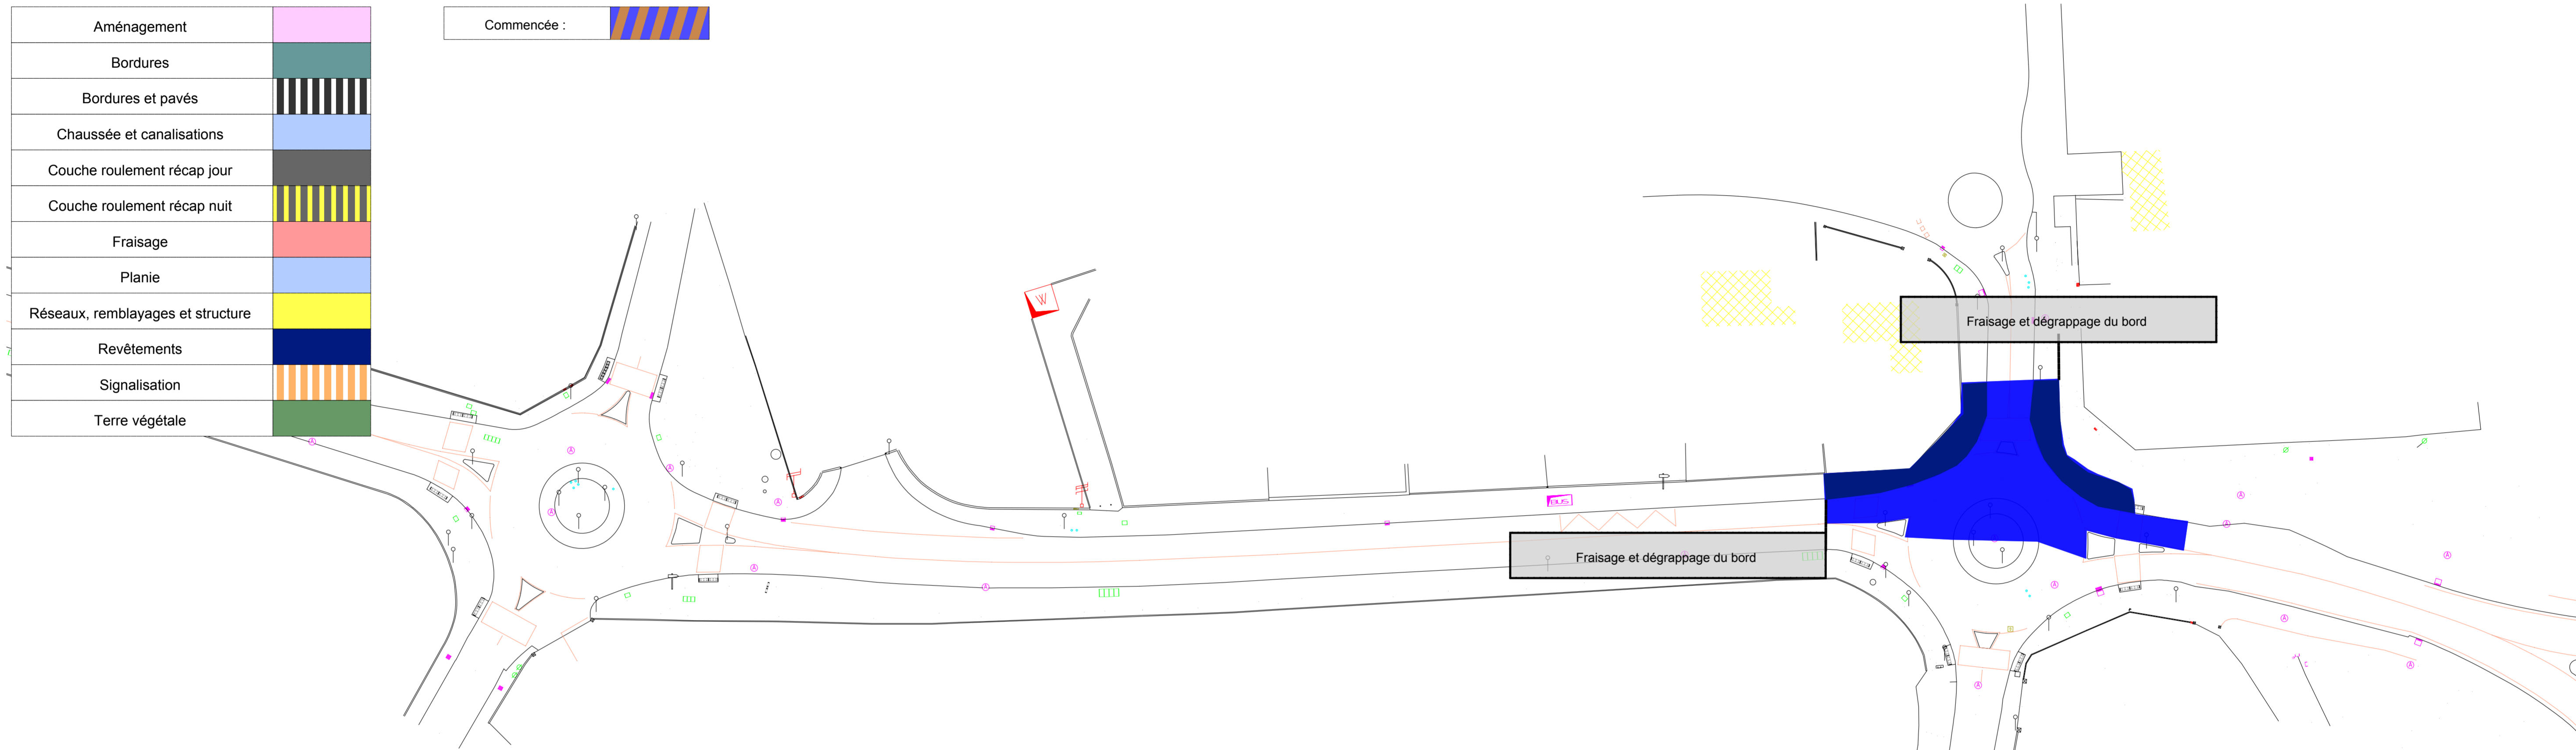


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2018																														
			Mai												Juin																		
			20			21			22			23			24			25			26												
Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord			[Gantt bar from May 20 to June 26]																														
GirNord : zone des trottoirs 2			[Gantt bar from May 21 to June 25]																														
Démolition bordures et pavés	22/05/2018 08:00	24/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 22 to 24]																														
Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2018 08:00	29/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 25 to 29]																														
Élargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2018 08:00	04/06/2018 15:01	[Gantt bar from May 30 to June 4]																														
Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord	04/06/2018 13:22	07/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 4 to 7]																														
Pose de bordures et pavés	07/06/2018 15:01	08/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 7 to 8]																														
Réglage terre végétale	08/06/2018 15:01	11/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 8 to 11]																														
GirNord : zone des trottoirs 1			[Gantt bar from May 21 to June 25]																														
Démolition bordures et pavés	22/05/2018 08:00	24/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 22 to 24]																														
Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2018 08:00	29/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 25 to 29]																														
Élargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2018 08:00	04/06/2018 15:01	[Gantt bar from May 30 to June 4]																														
Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord	04/06/2018 13:22	07/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 4 to 7]																														
Pose de bordures et pavés	07/06/2018 15:01	08/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 7 to 8]																														
Réglage terre végétale	08/06/2018 15:01	11/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 8 to 11]																														
GirNord : zone complète			[Gantt bar from May 20 to June 26]																														
Installations et signalisation	17/05/2018 08:00	18/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 17 to 18]																														
Fraisage de chaussée	11/06/2018 15:01	13/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 11 to 13]																														
Couche de réglage / planie	13/06/2018 15:01	18/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 13 to 18]																														
Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour)	18/06/2018 15:01	22/06/2018 09:55	[Gantt bar from June 18 to 22]																														
Signalisation	22/06/2018 14:10	25/06/2018 09:55	[Gantt bar from June 22 to 25]																														

2018																																						
Mai														Juin																								
20				21				22				23				24				25																		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Aménagement	
Bordures	
Bordures et pavés	
Chaussée et canalisations	
Couche roulement récap jour	
Couche roulement récap nuit	
Fraisage	
Planie	
Réseaux, remblayages et structure	
Revêtements	
Signalisation	
Terre végétale	

Commencée :

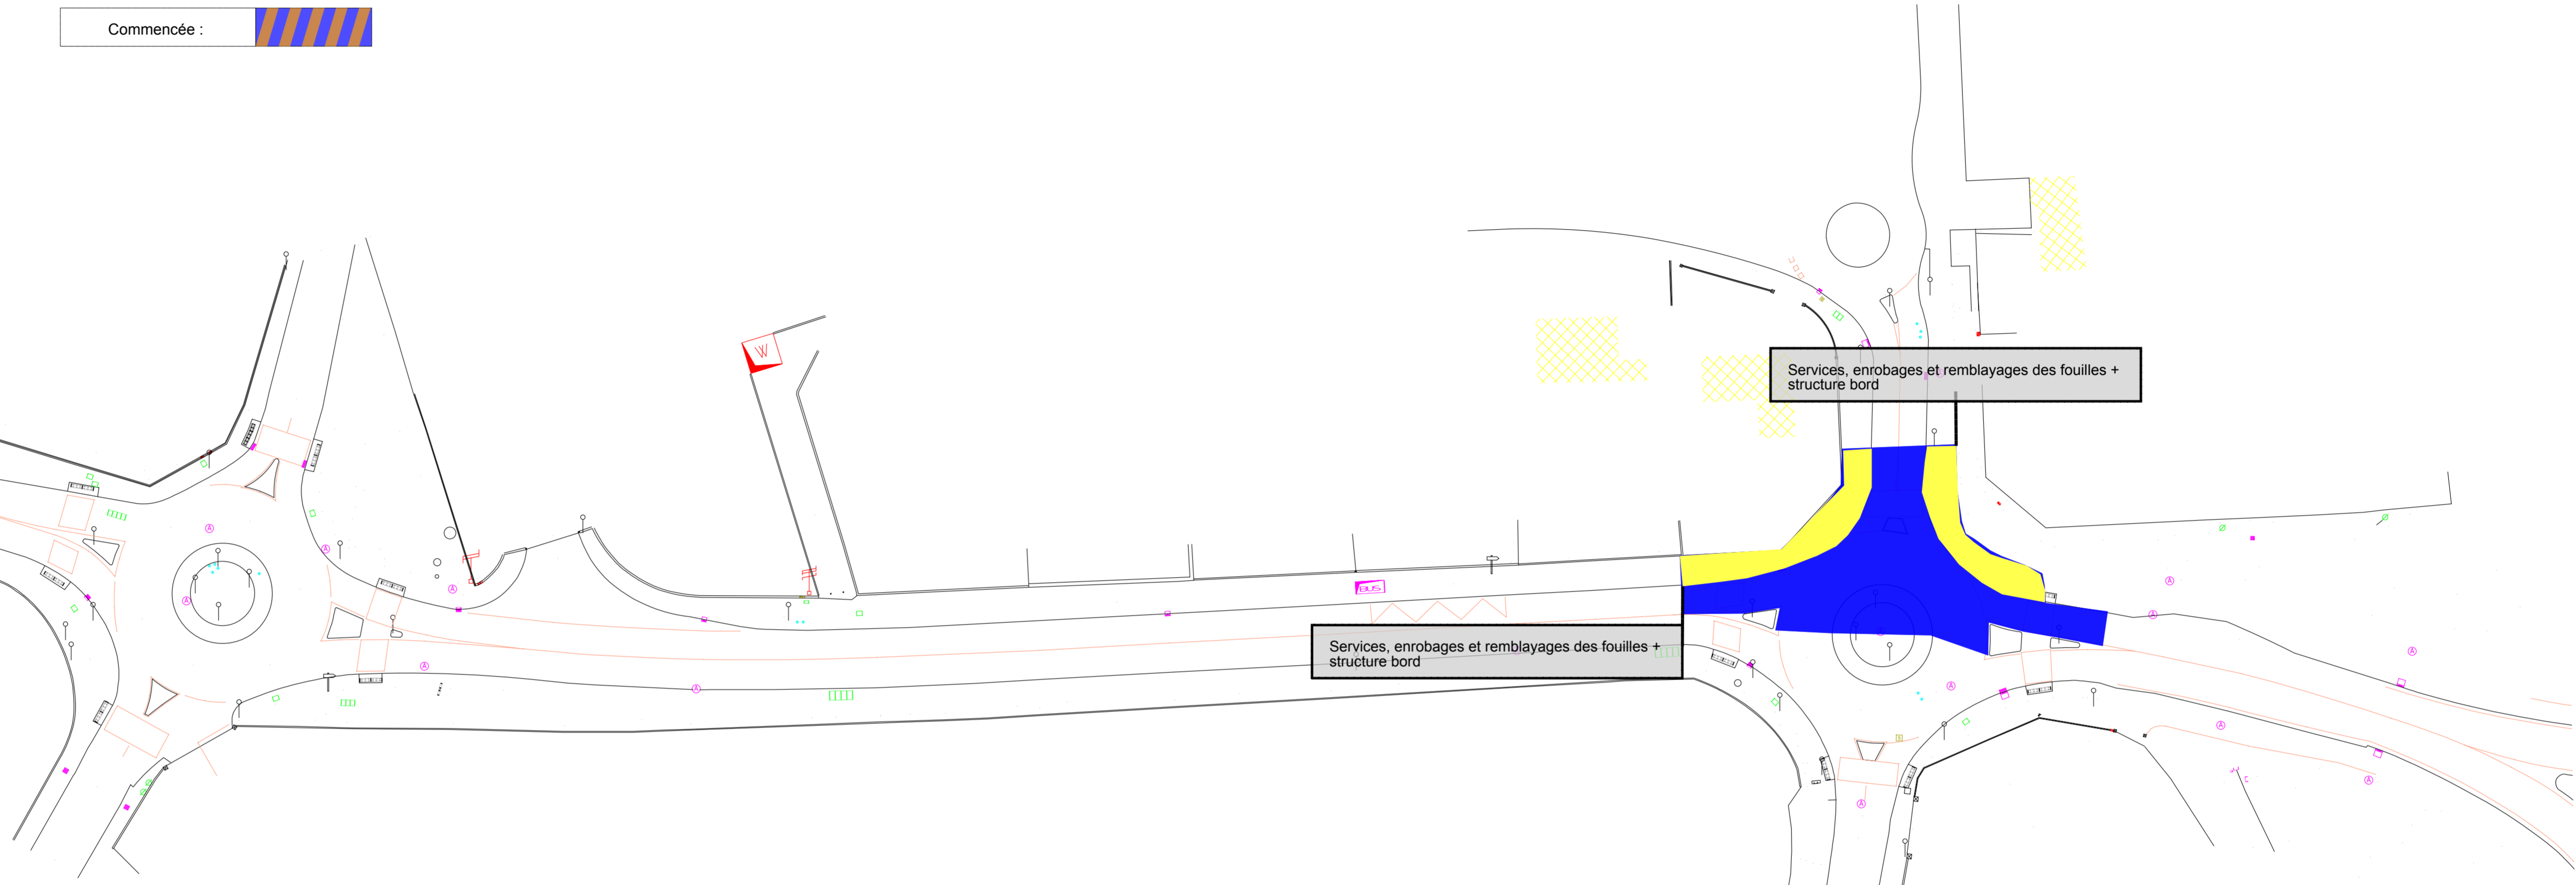

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2018																																	
			Mai														Juin																			
			20				21				22				23				24				25				26									
Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...	Jeudi	Vendr...	Samedi	Diman...	Lundi	Mardi	Mercr...
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord			[Gantt bar from May 20 to June 26]																																	
GirNord : zone des trottoirs 2			[Gantt bar from May 21 to June 26]																																	
Démolition bordures et pavés	22/05/2018 08:00	24/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 22 to 24]																																	
Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2018 08:00	29/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 25 to 29]																																	
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2018 08:00	04/06/2018 15:01	[Gantt bar from May 30 to June 4]																																	
Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord	04/06/2018 13:22	07/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 4 to 7]																																	
Pose de bordures et pavés	07/06/2018 15:01	08/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 7 to 8]																																	
Réglage terre végétale	08/06/2018 15:01	11/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 8 to 11]																																	
GirNord : zone des trottoirs 1			[Gantt bar from May 21 to June 26]																																	
Démolition bordures et pavés	22/05/2018 08:00	24/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 22 to 24]																																	
Fraisage et dégrappage du bord	25/05/2018 08:00	29/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 25 to 29]																																	
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2018 08:00	04/06/2018 15:01	[Gantt bar from May 30 to June 4]																																	
Services, enrobages et remblayages des fouilles + structure bord	04/06/2018 13:22	07/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 4 to 7]																																	
Pose de bordures et pavés	07/06/2018 15:01	08/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 7 to 8]																																	
Réglage terre végétale	08/06/2018 15:01	11/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 8 to 11]																																	
GirNord : zone complète			[Gantt bar from May 20 to June 26]																																	
Installations et signalisation	17/05/2018 08:00	18/05/2018 16:00	[Gantt bar from May 17 to 18]																																	
Fraisage de chaussée	11/06/2018 15:01	13/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 11 to 13]																																	
Couche de réglage / planie	13/06/2018 15:01	18/06/2018 15:01	[Gantt bar from June 13 to 18]																																	
Couche de base 3A (Circulation bi-directionnel de jour)	18/06/2018 15:01	22/06/2018 09:55	[Gantt bar from June 18 to 22]																																	
Signalisation	22/06/2018 14:10	25/06/2018 09:55	[Gantt bar from June 22 to 25]																																	

