

Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

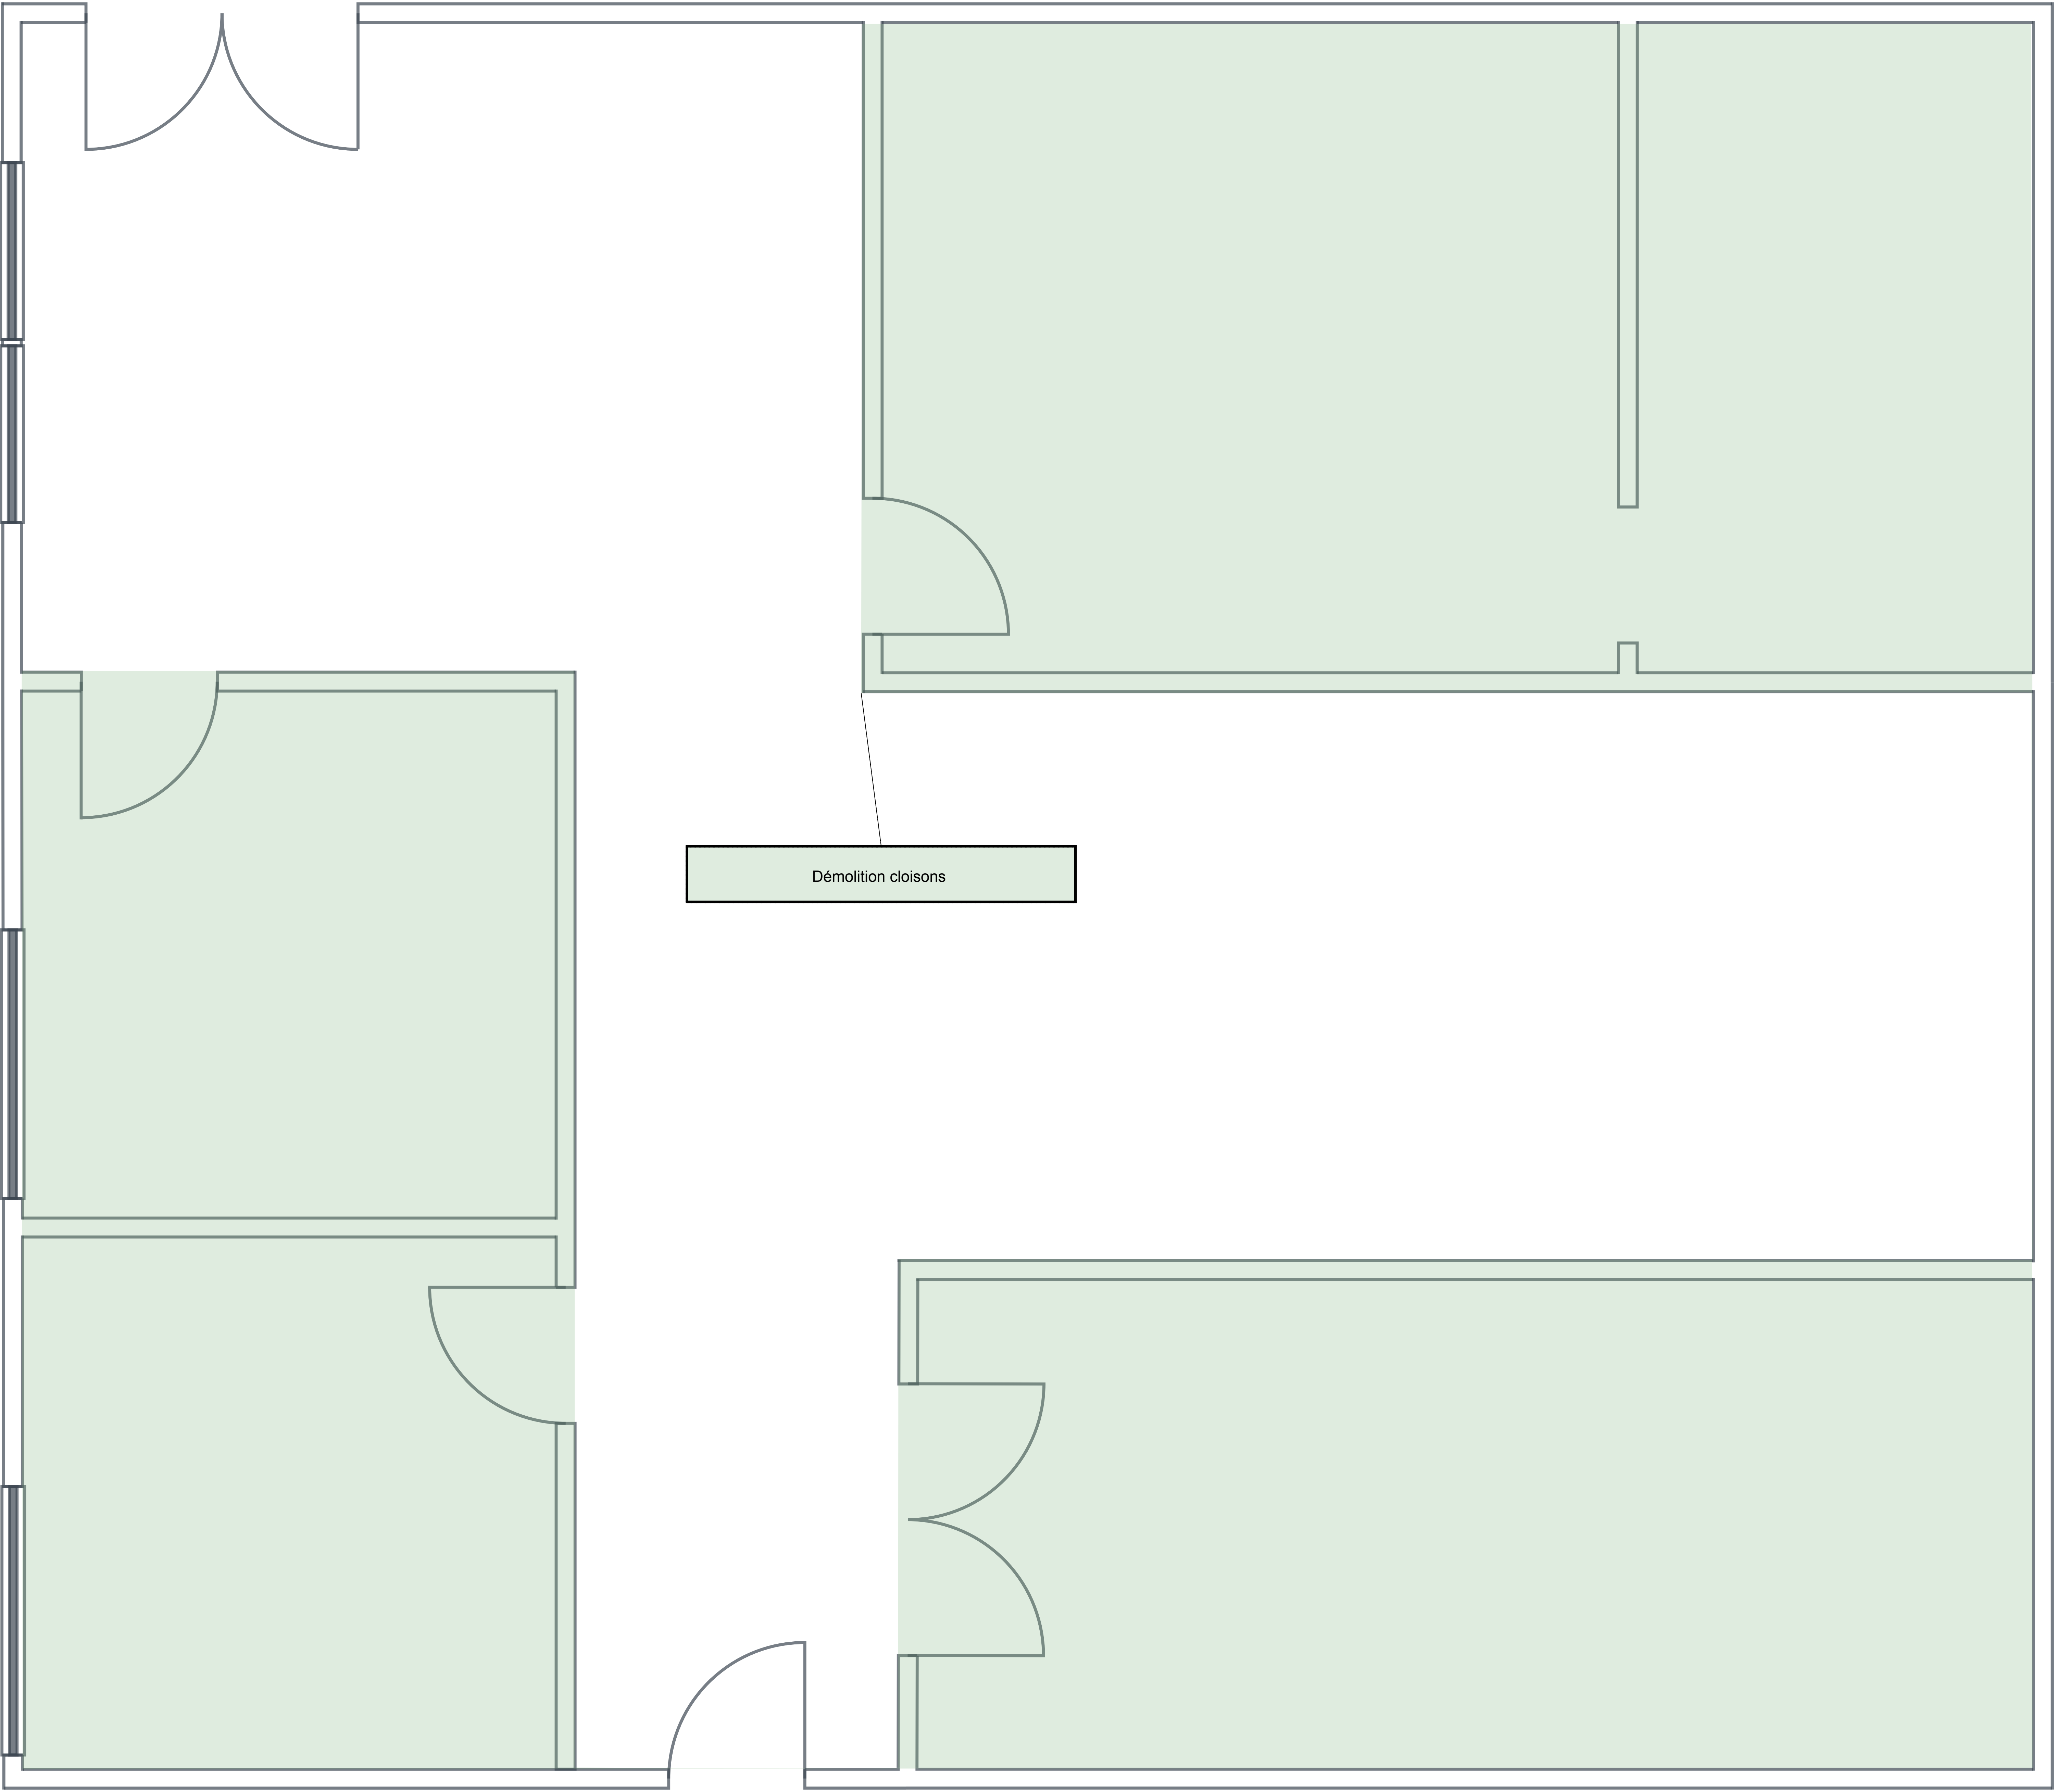
Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème coucheSolPrisesFinitionsAménagementSécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Démolition cloisons	04/07/2018 08:00 06/07/2018 16:00											
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												



Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol

Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Préparation chantier	07/07/2018 08:00 08/07/2018 16:00											
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												



Préparation chantier


Localisation des travaux



Légende

	Démolition Cloisons		Tirage câbles		Peinture 2ème couche		Finitions
	Cloisons		Préparation peinture		Sol		Aménagement
	Chemin câble		Plinthes		Prises		Sécurité



Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Pose cloison salle réunion	09/07/2018 08:00 11/07/2018 16:00											
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												






















Localisation des travaux



Légende

	Démolition Cloisons		Tirage câbles		Peinture 2ème couche		Finitions
	Cloisons		Préparation peinture		Sol		Aménagement
	Chemin câble		Plinthes		Prises		Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00  29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Pose cloison bureaux	12/07/2018 08:00  14/07/2018 16:00											
Pose des chemins de câbles	12/07/2018 08:00  13/07/2018 16:00											
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

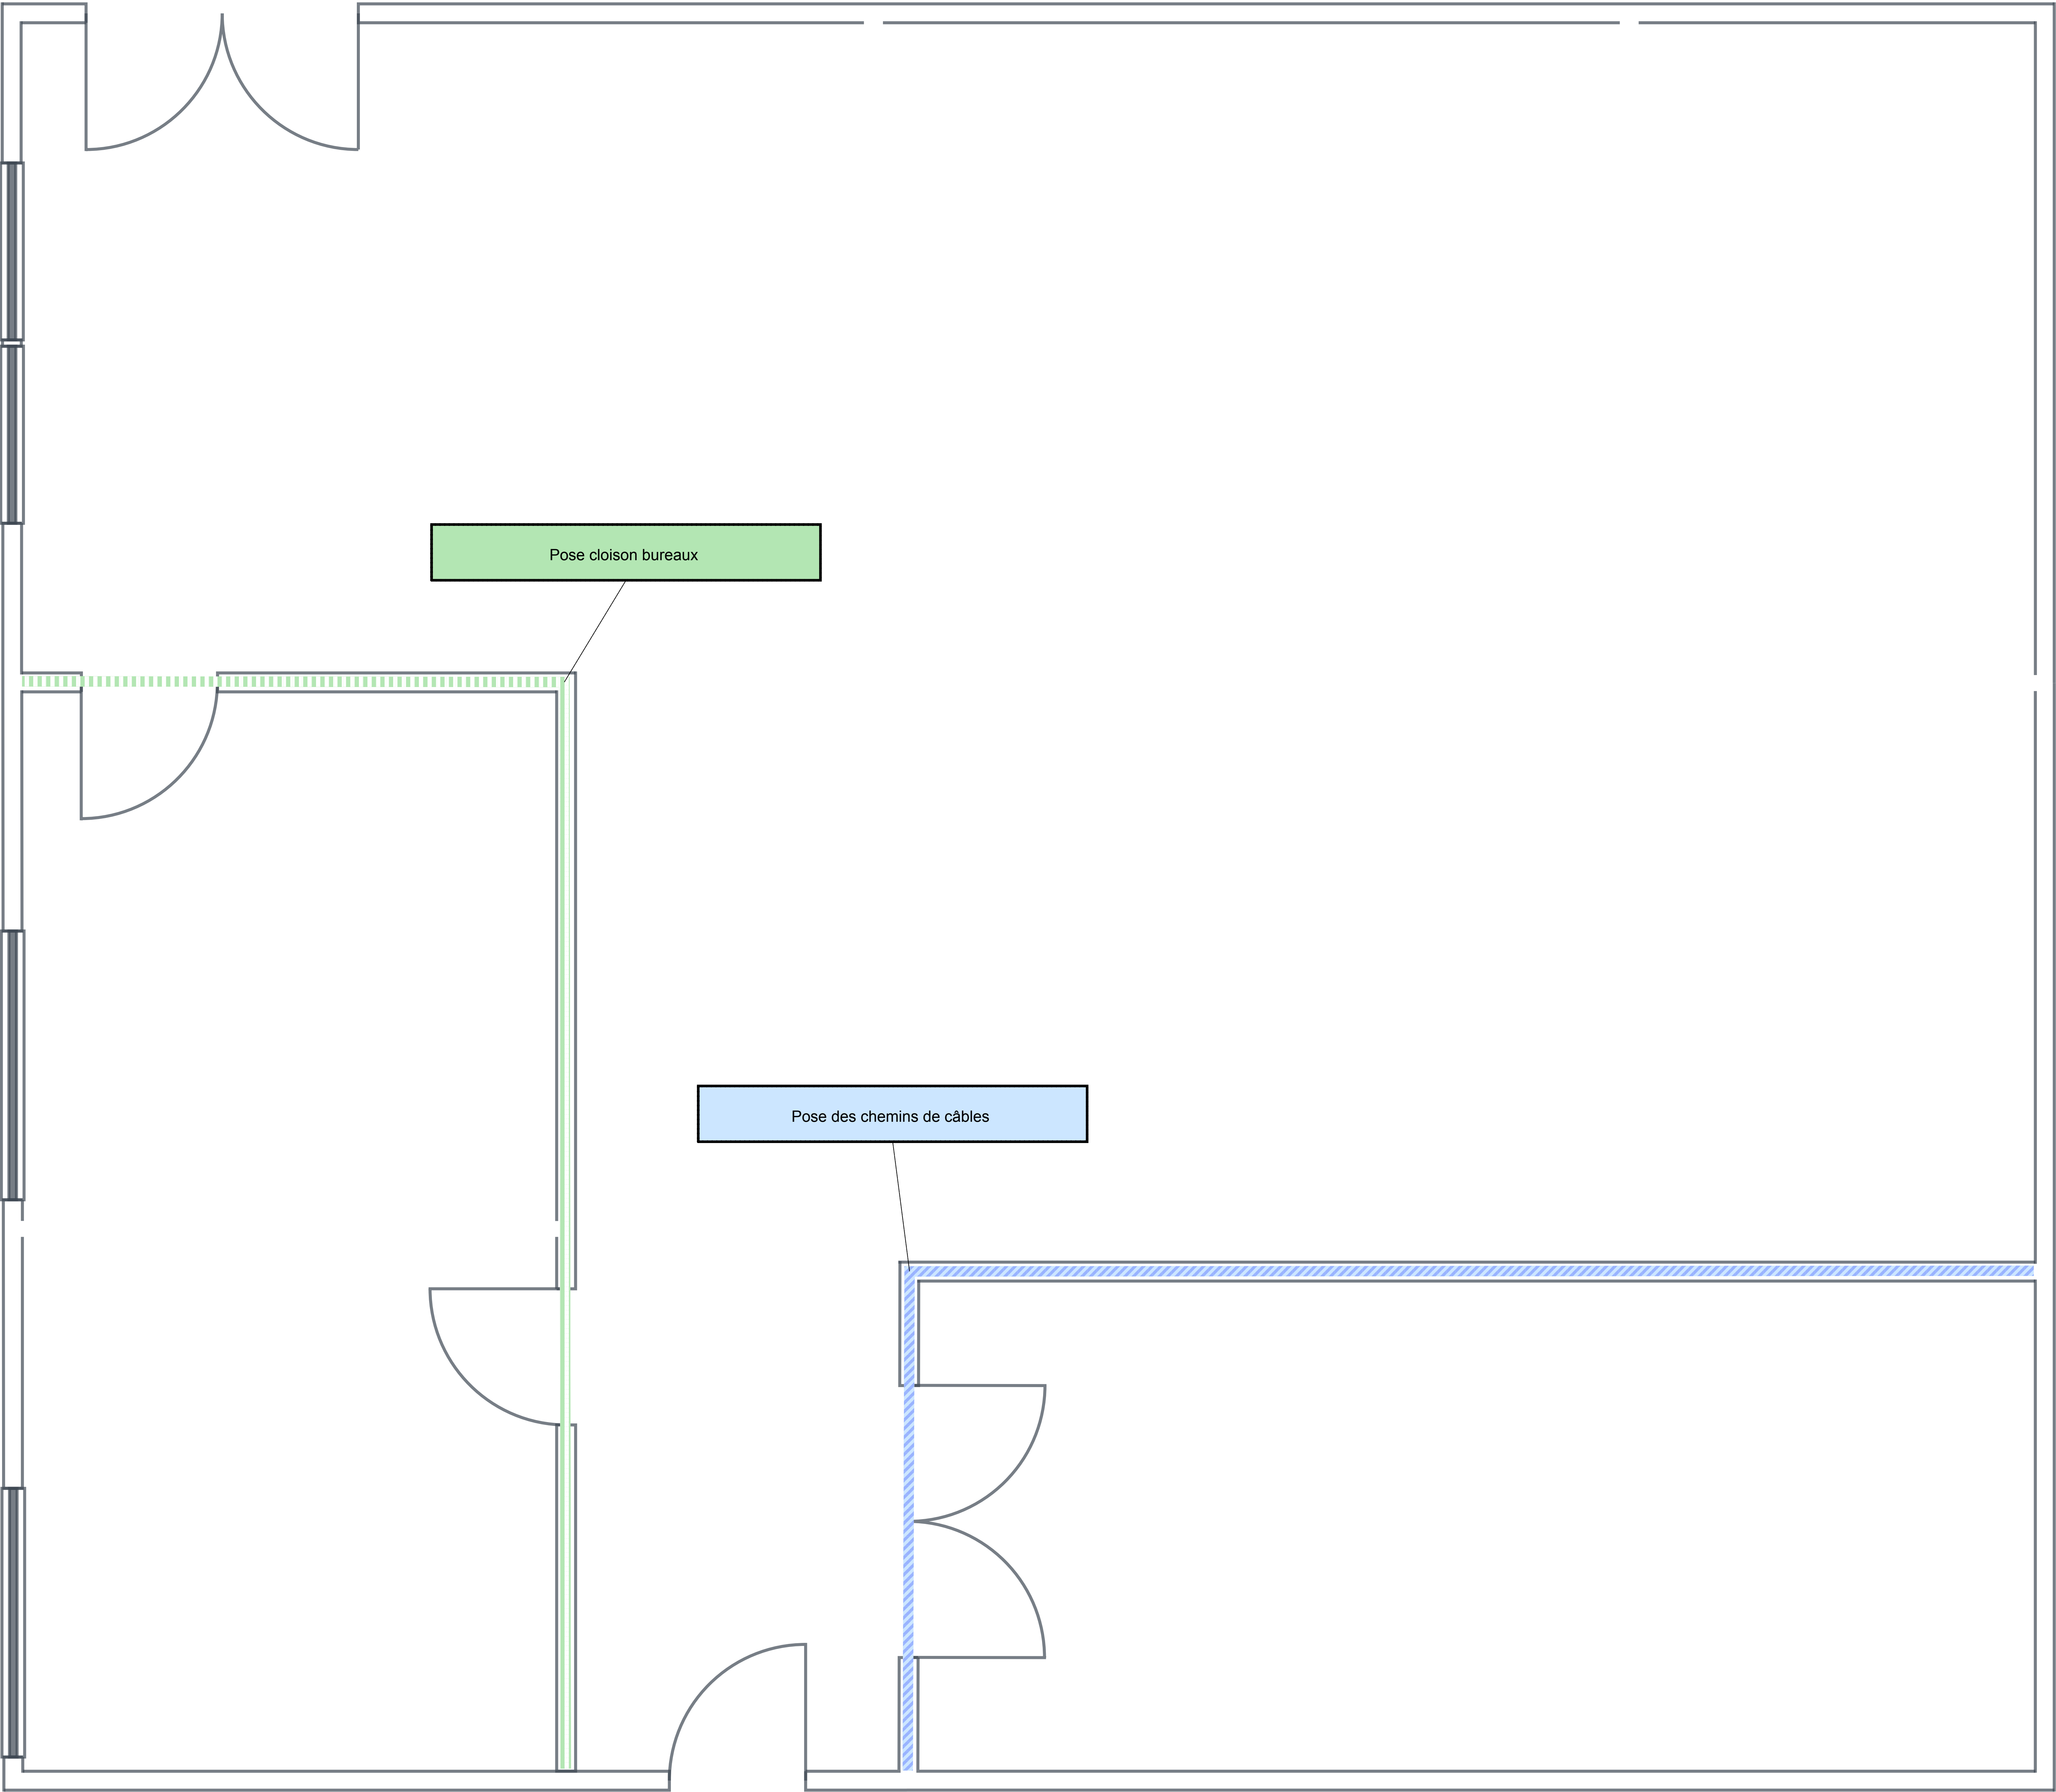

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 - 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Pose cloison séparation bureaux												
Tirage câbles salle réunion												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

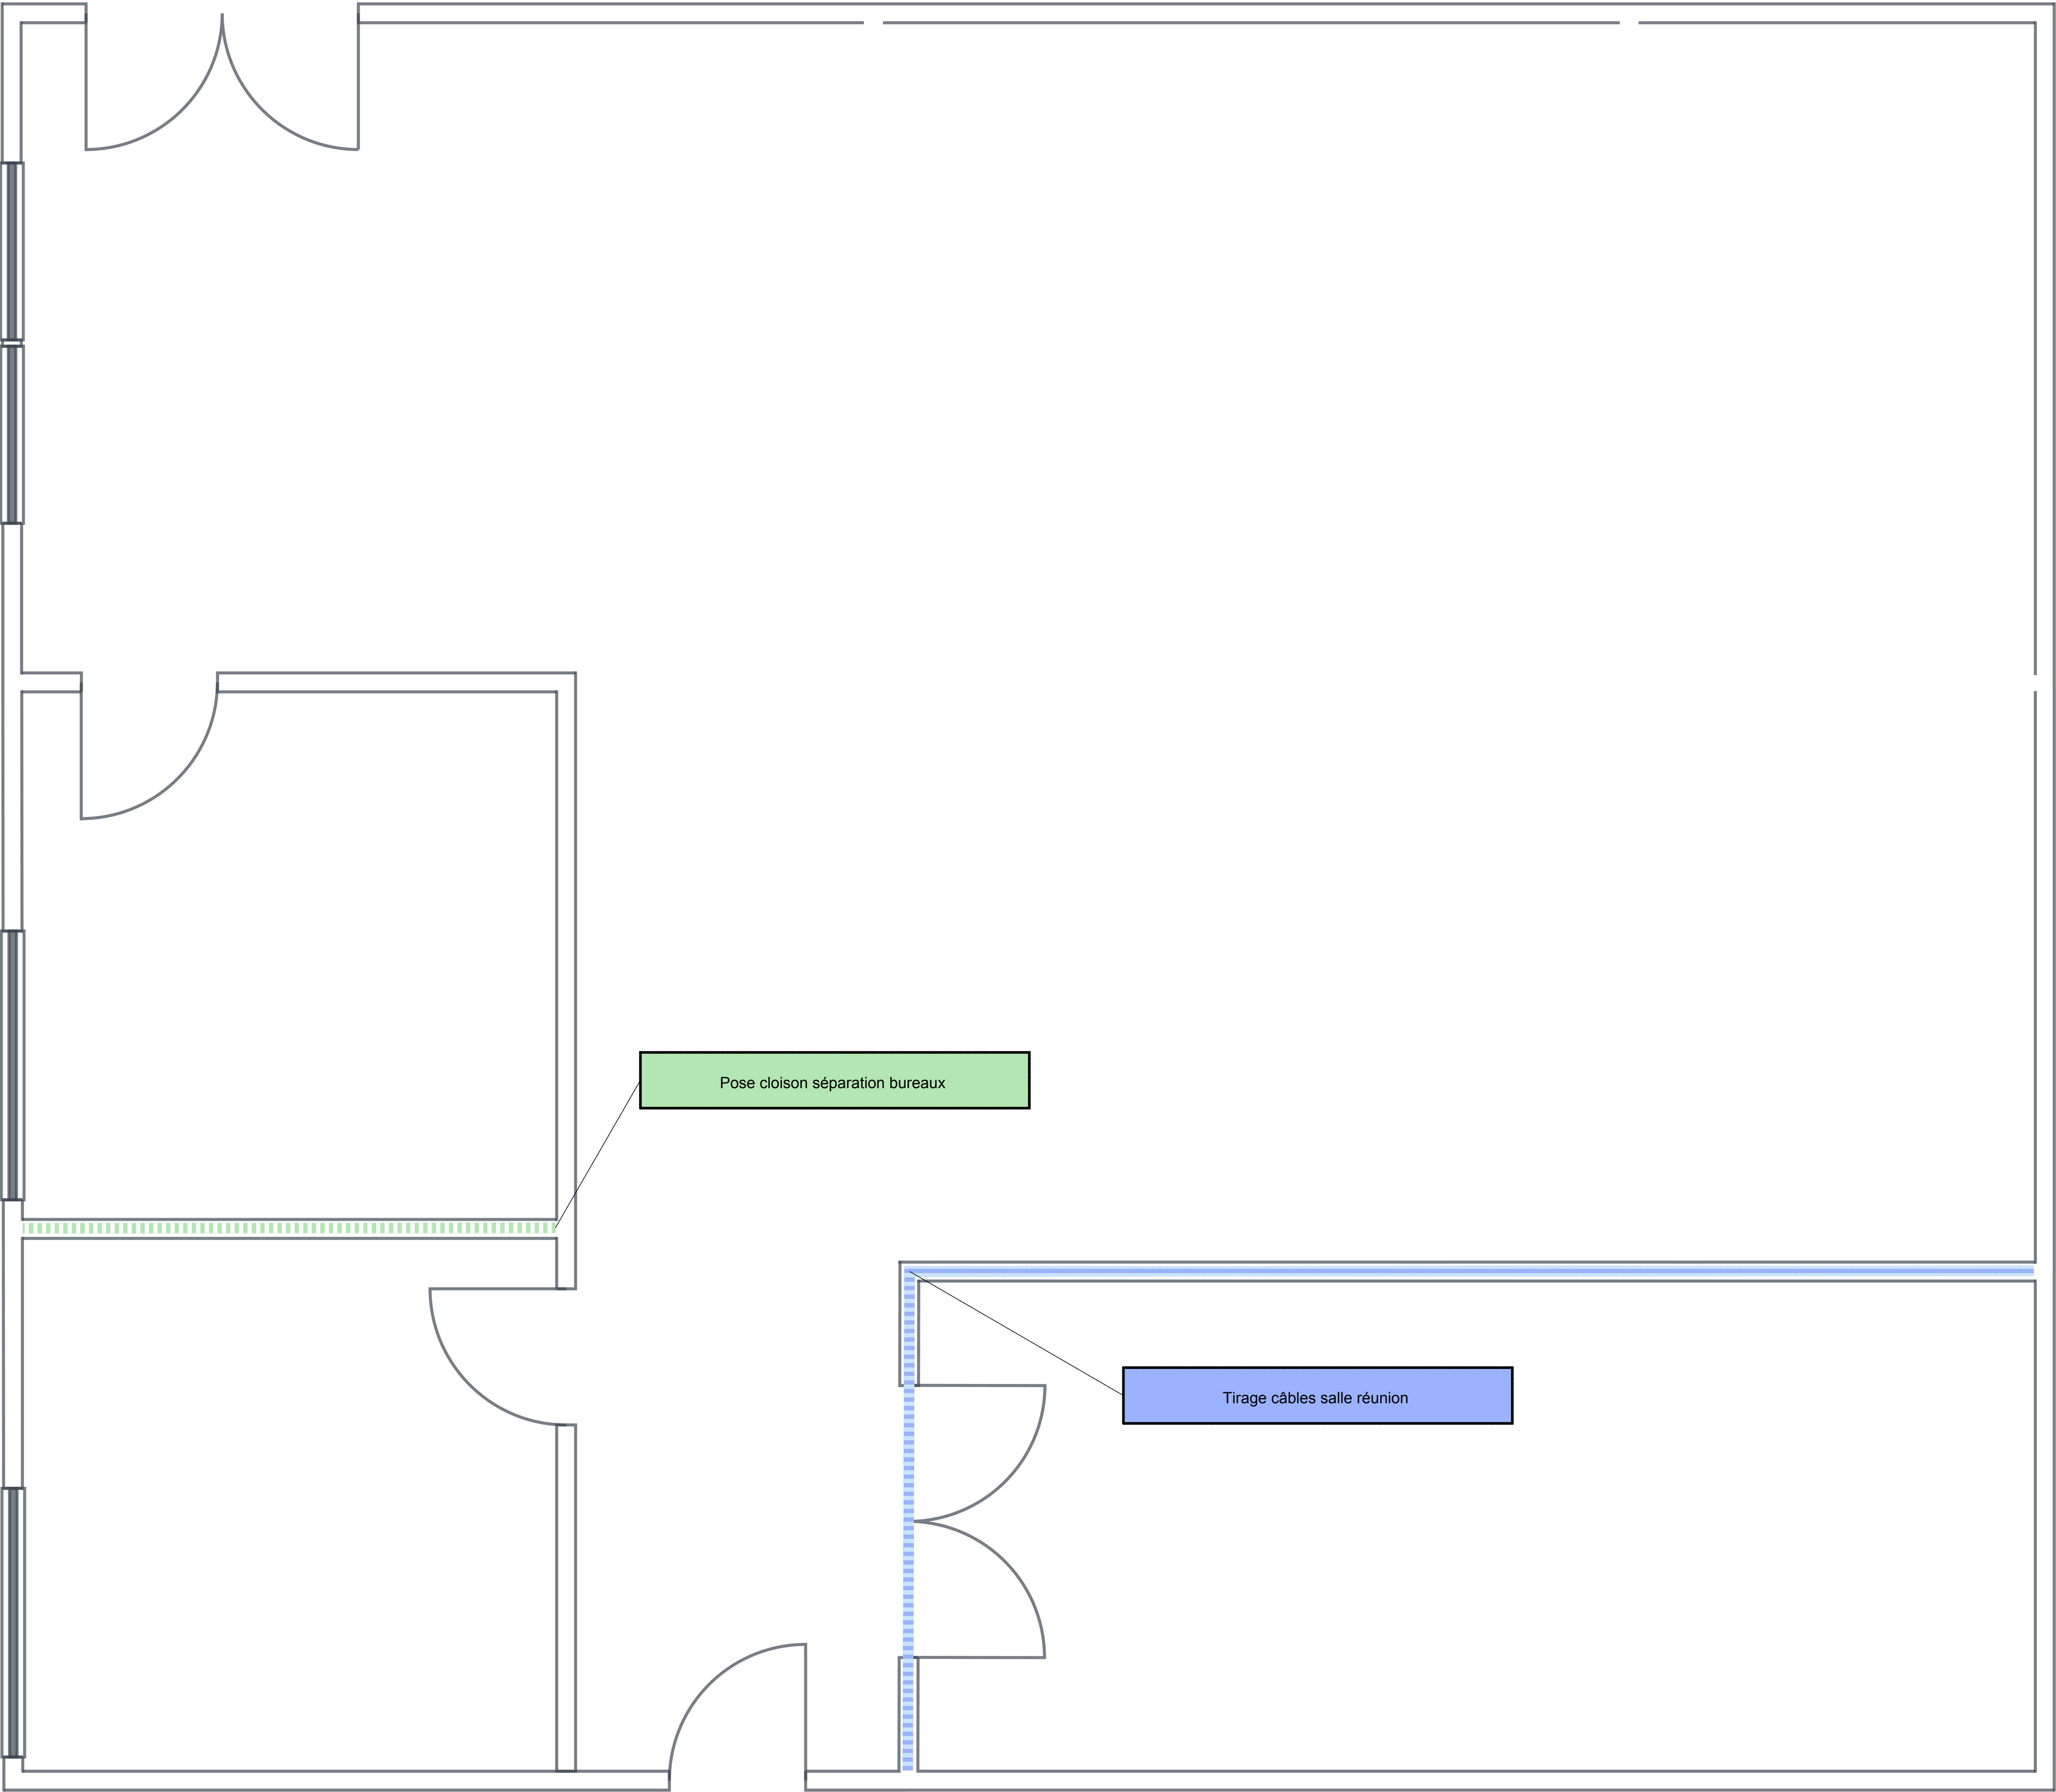

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Pose cloison cuisine & réfectoire												
Pose des chemins de câbles												
Pose des chemins de câbles												
Préparation peinture (enduit + 1ère couche)												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

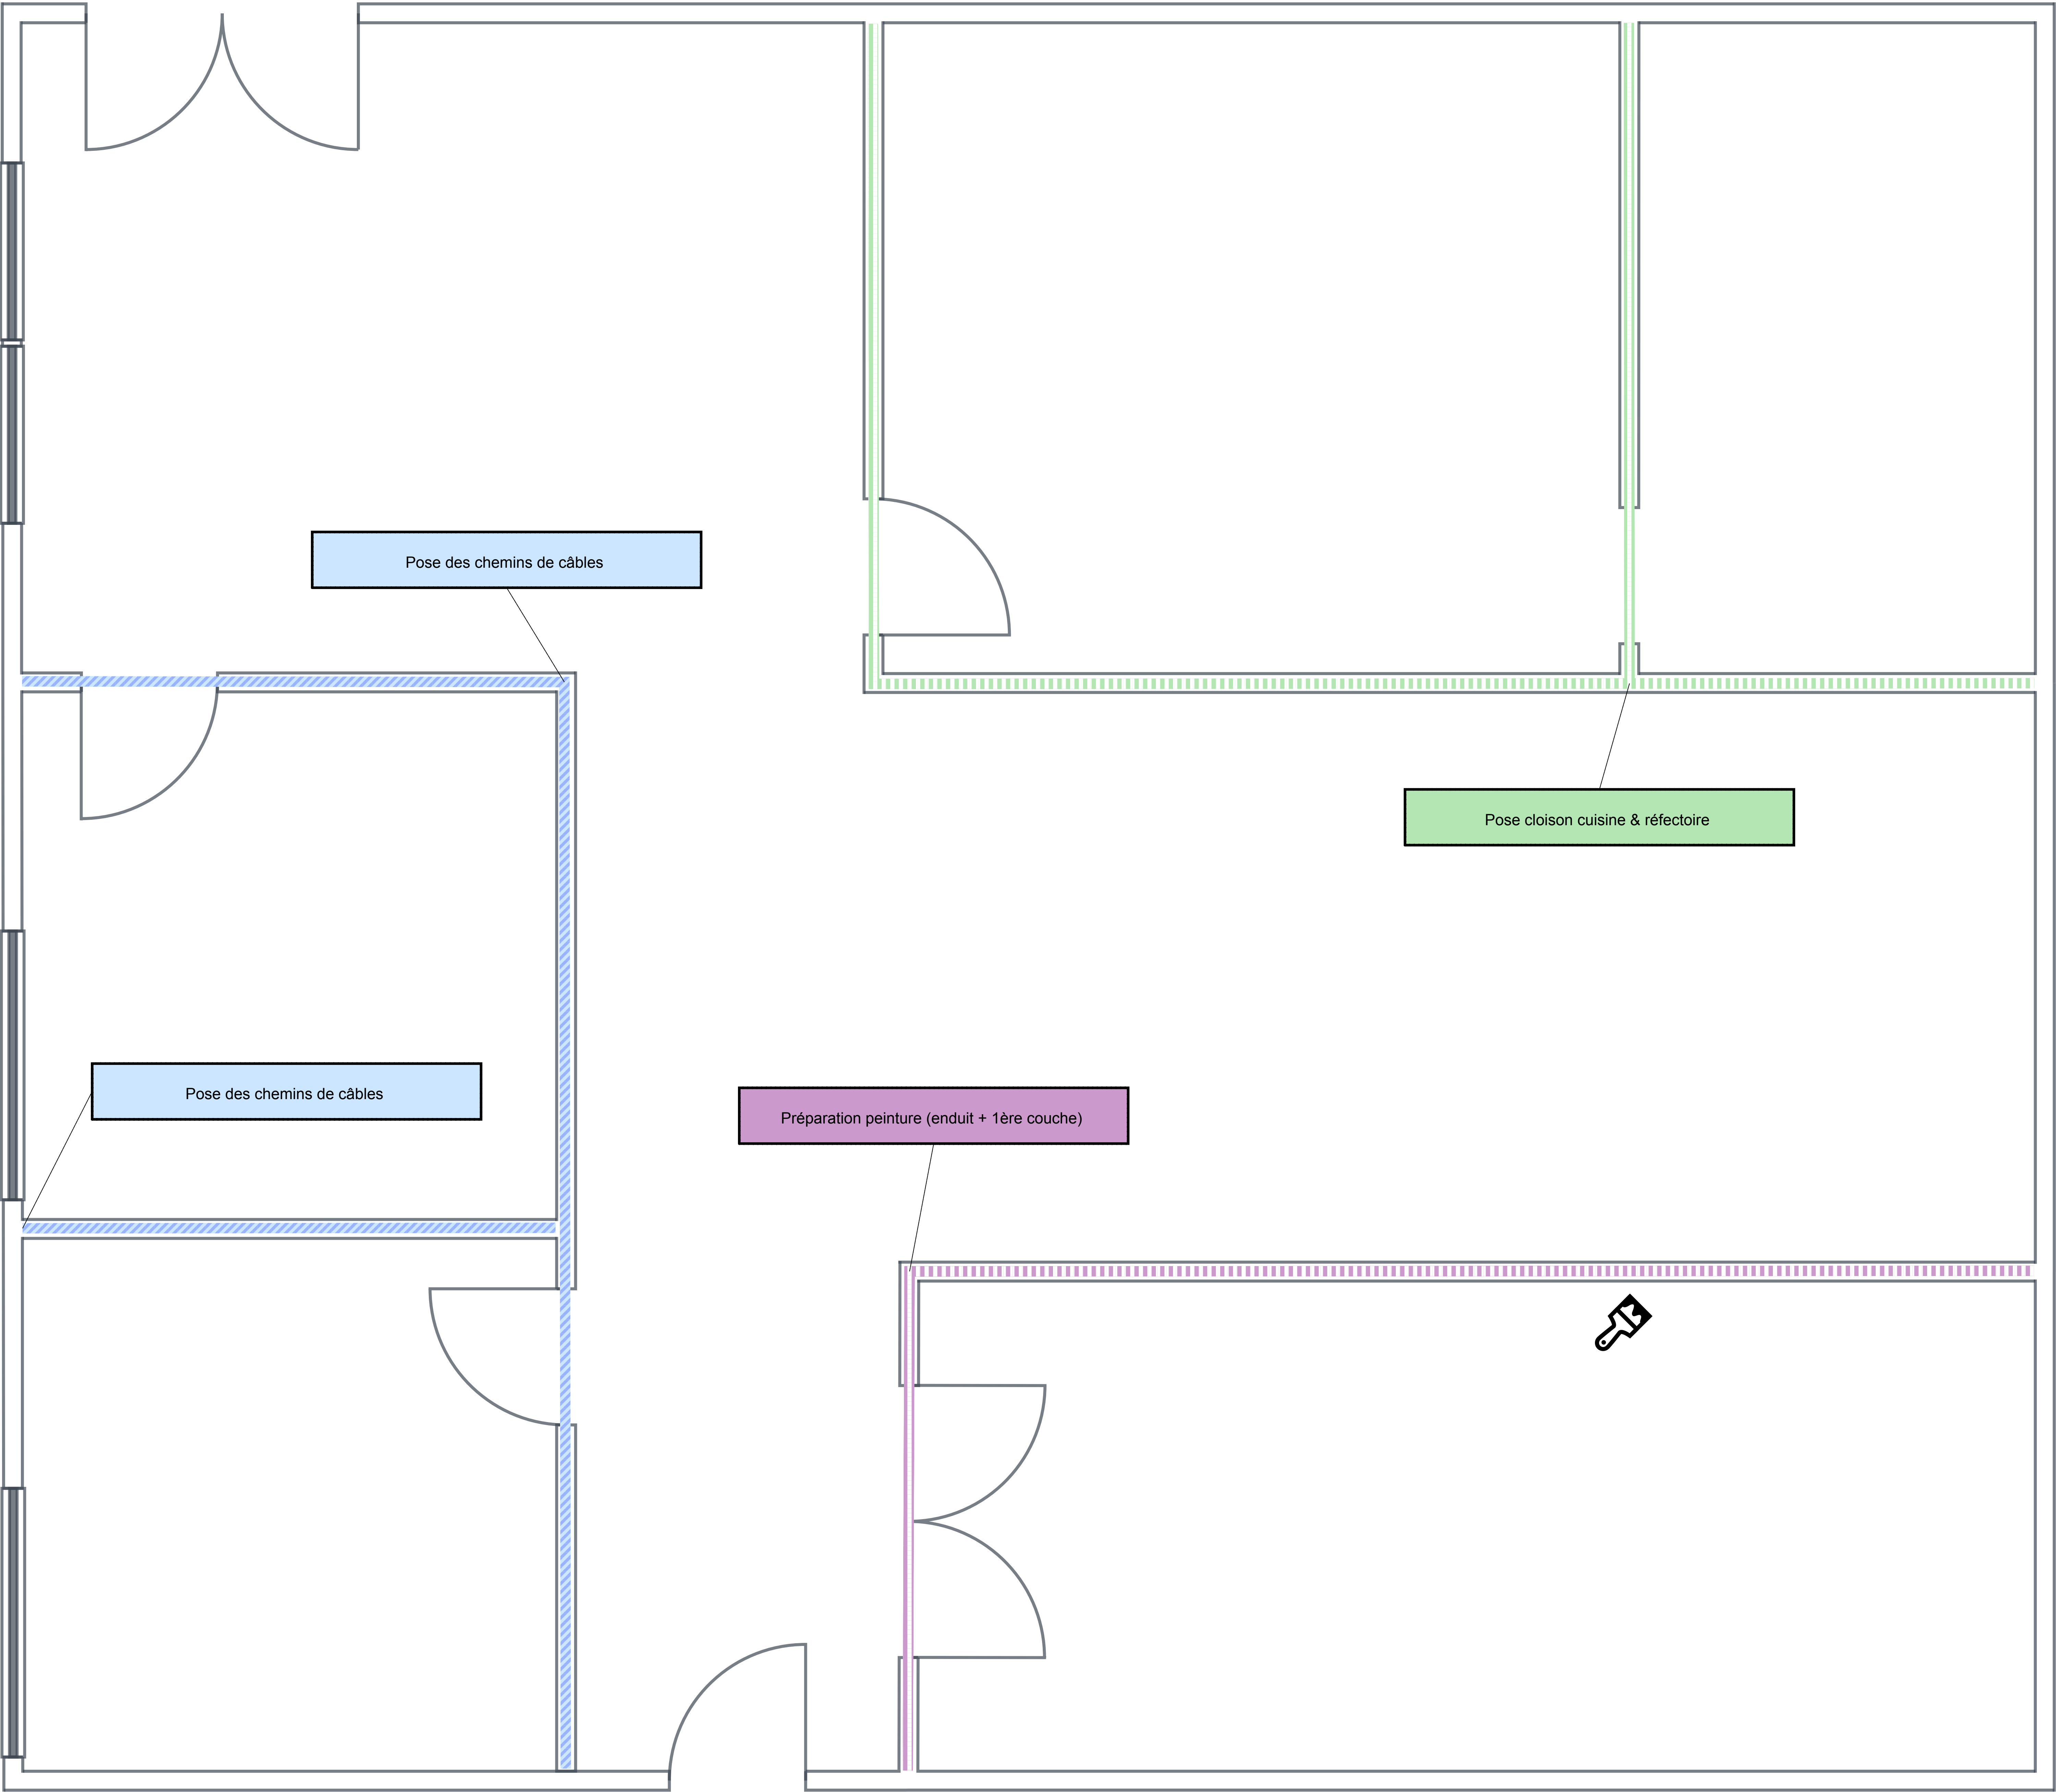

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 - 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Pose des chemins de câbles												
Pose plinthes												
Tirage câbles bureaux												
Tirage câbles séparation bureaux												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

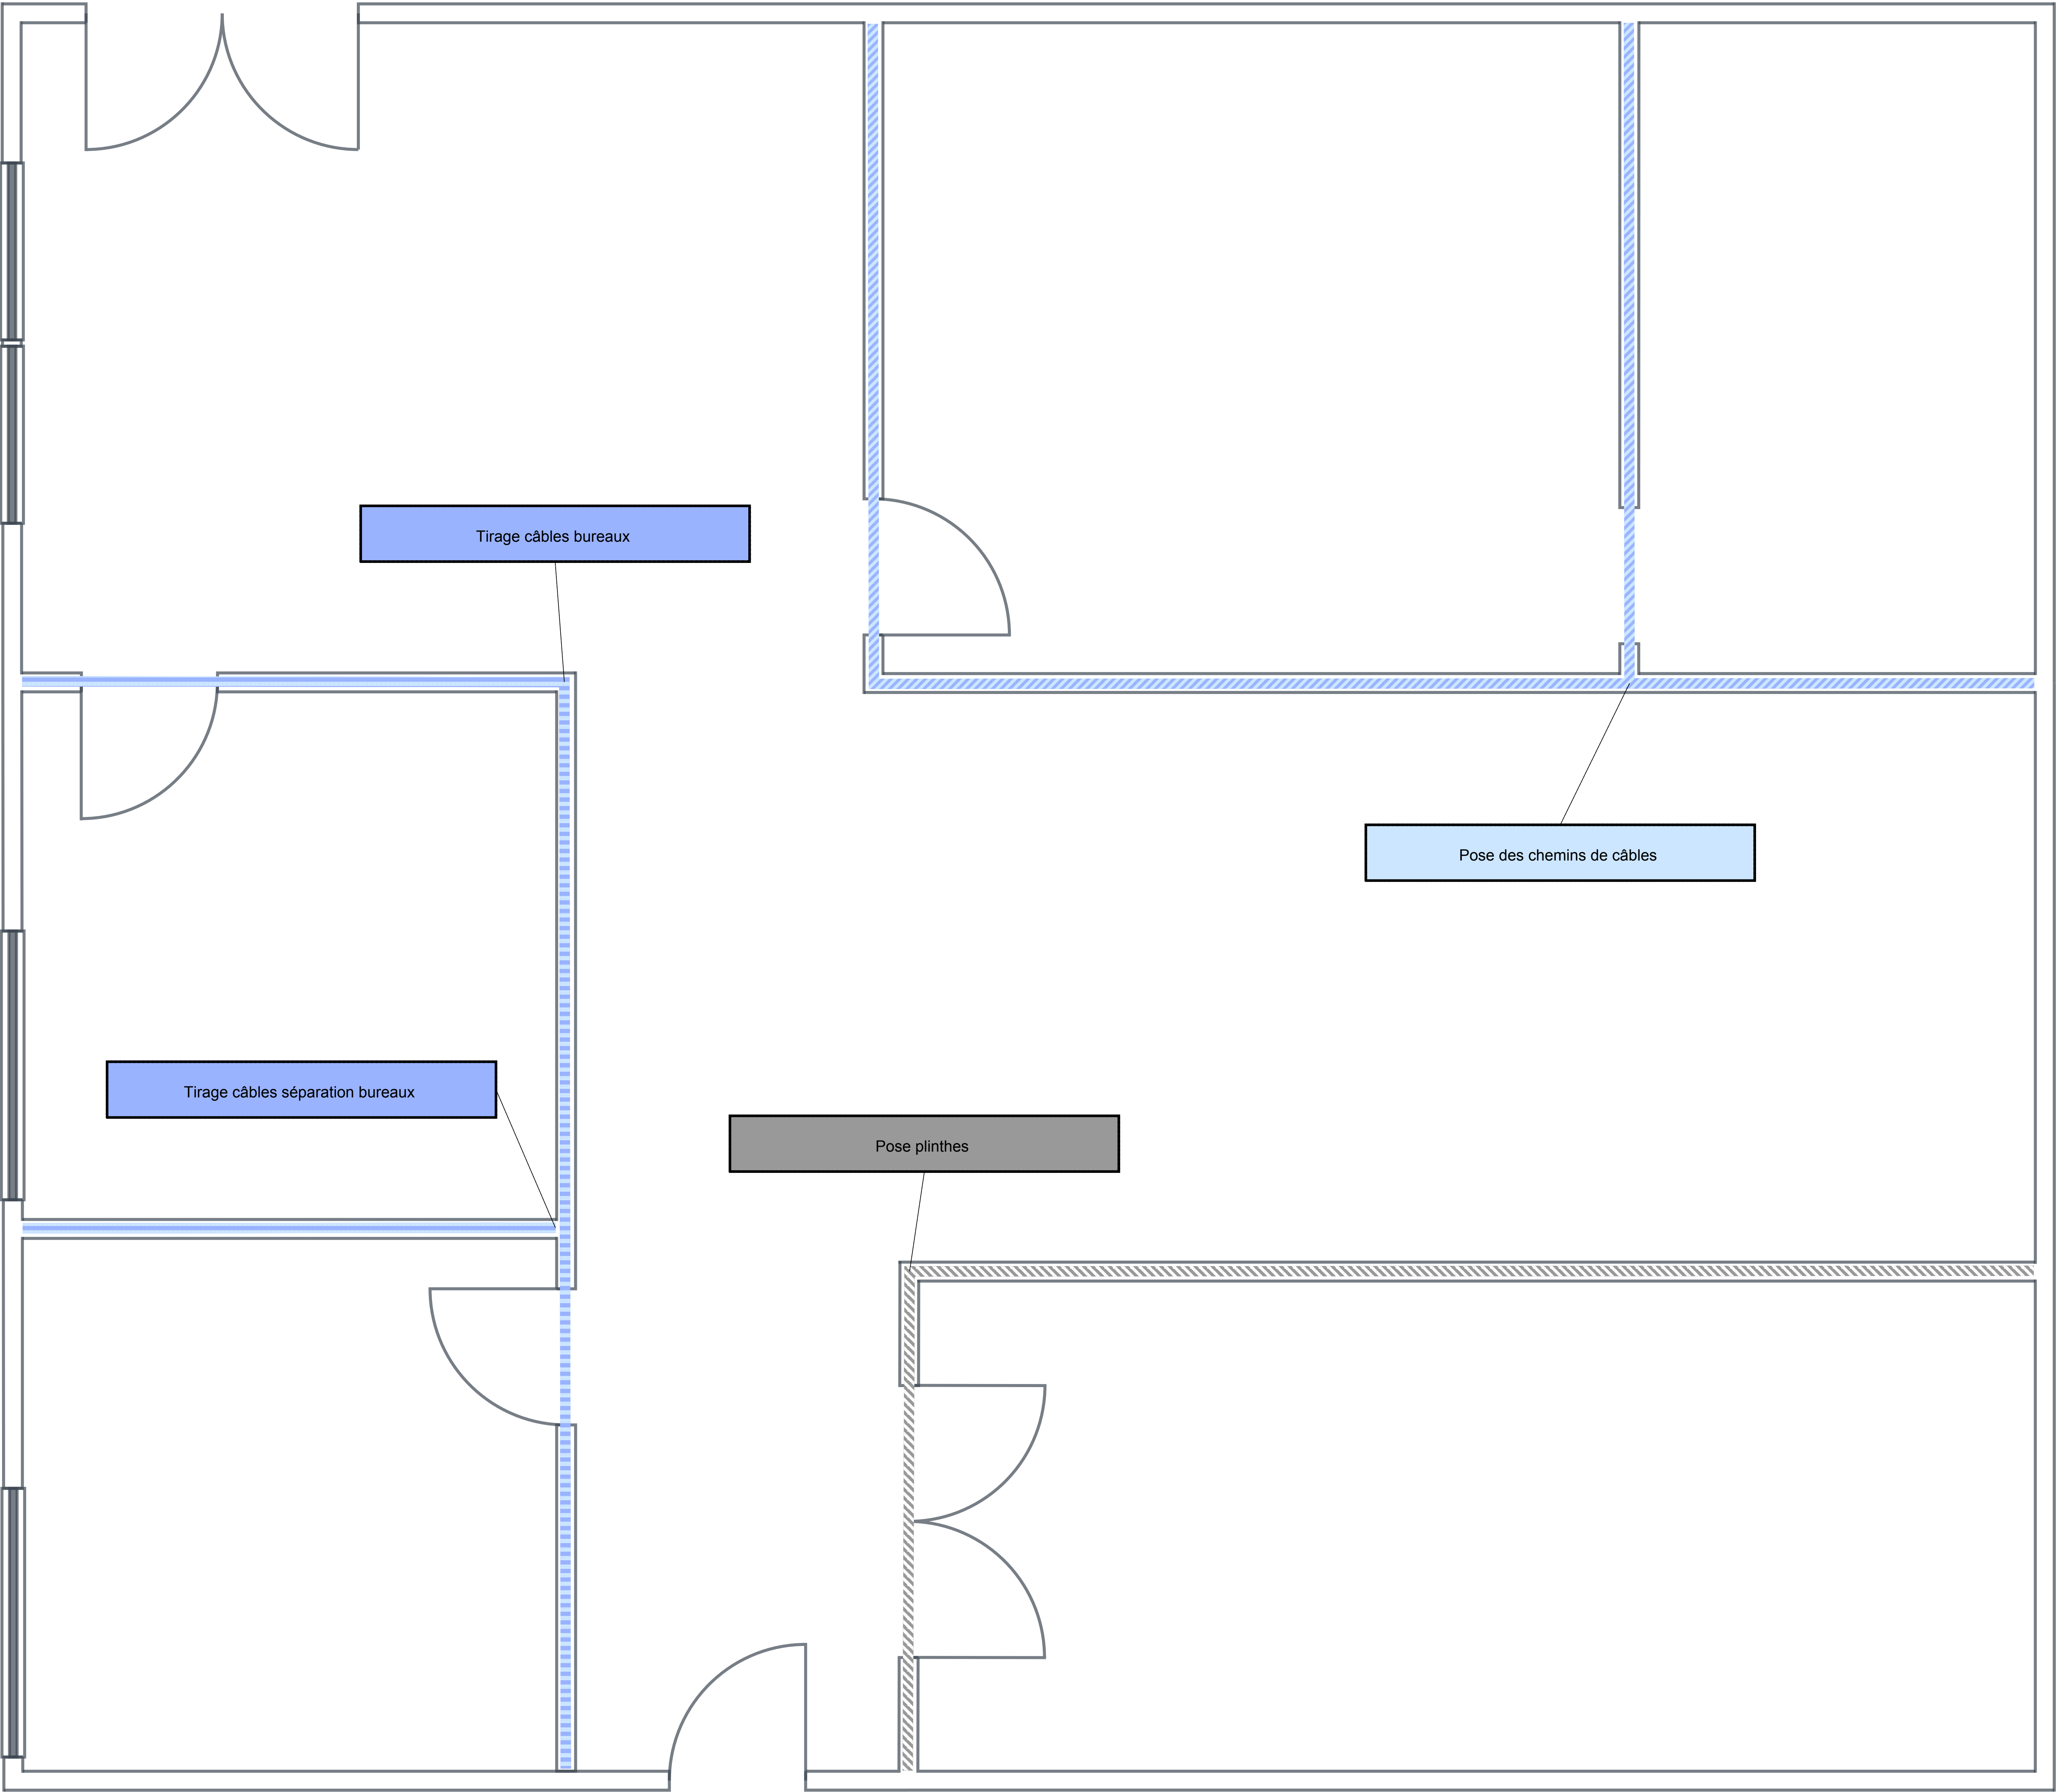

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité


Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 - 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Peinture 2ème couche												
Préparation peinture (enduit + 1ère couche)												
Préparation peinture (enduit + 1ère couche)												
Tirage câbles cuisine & réfectoire												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

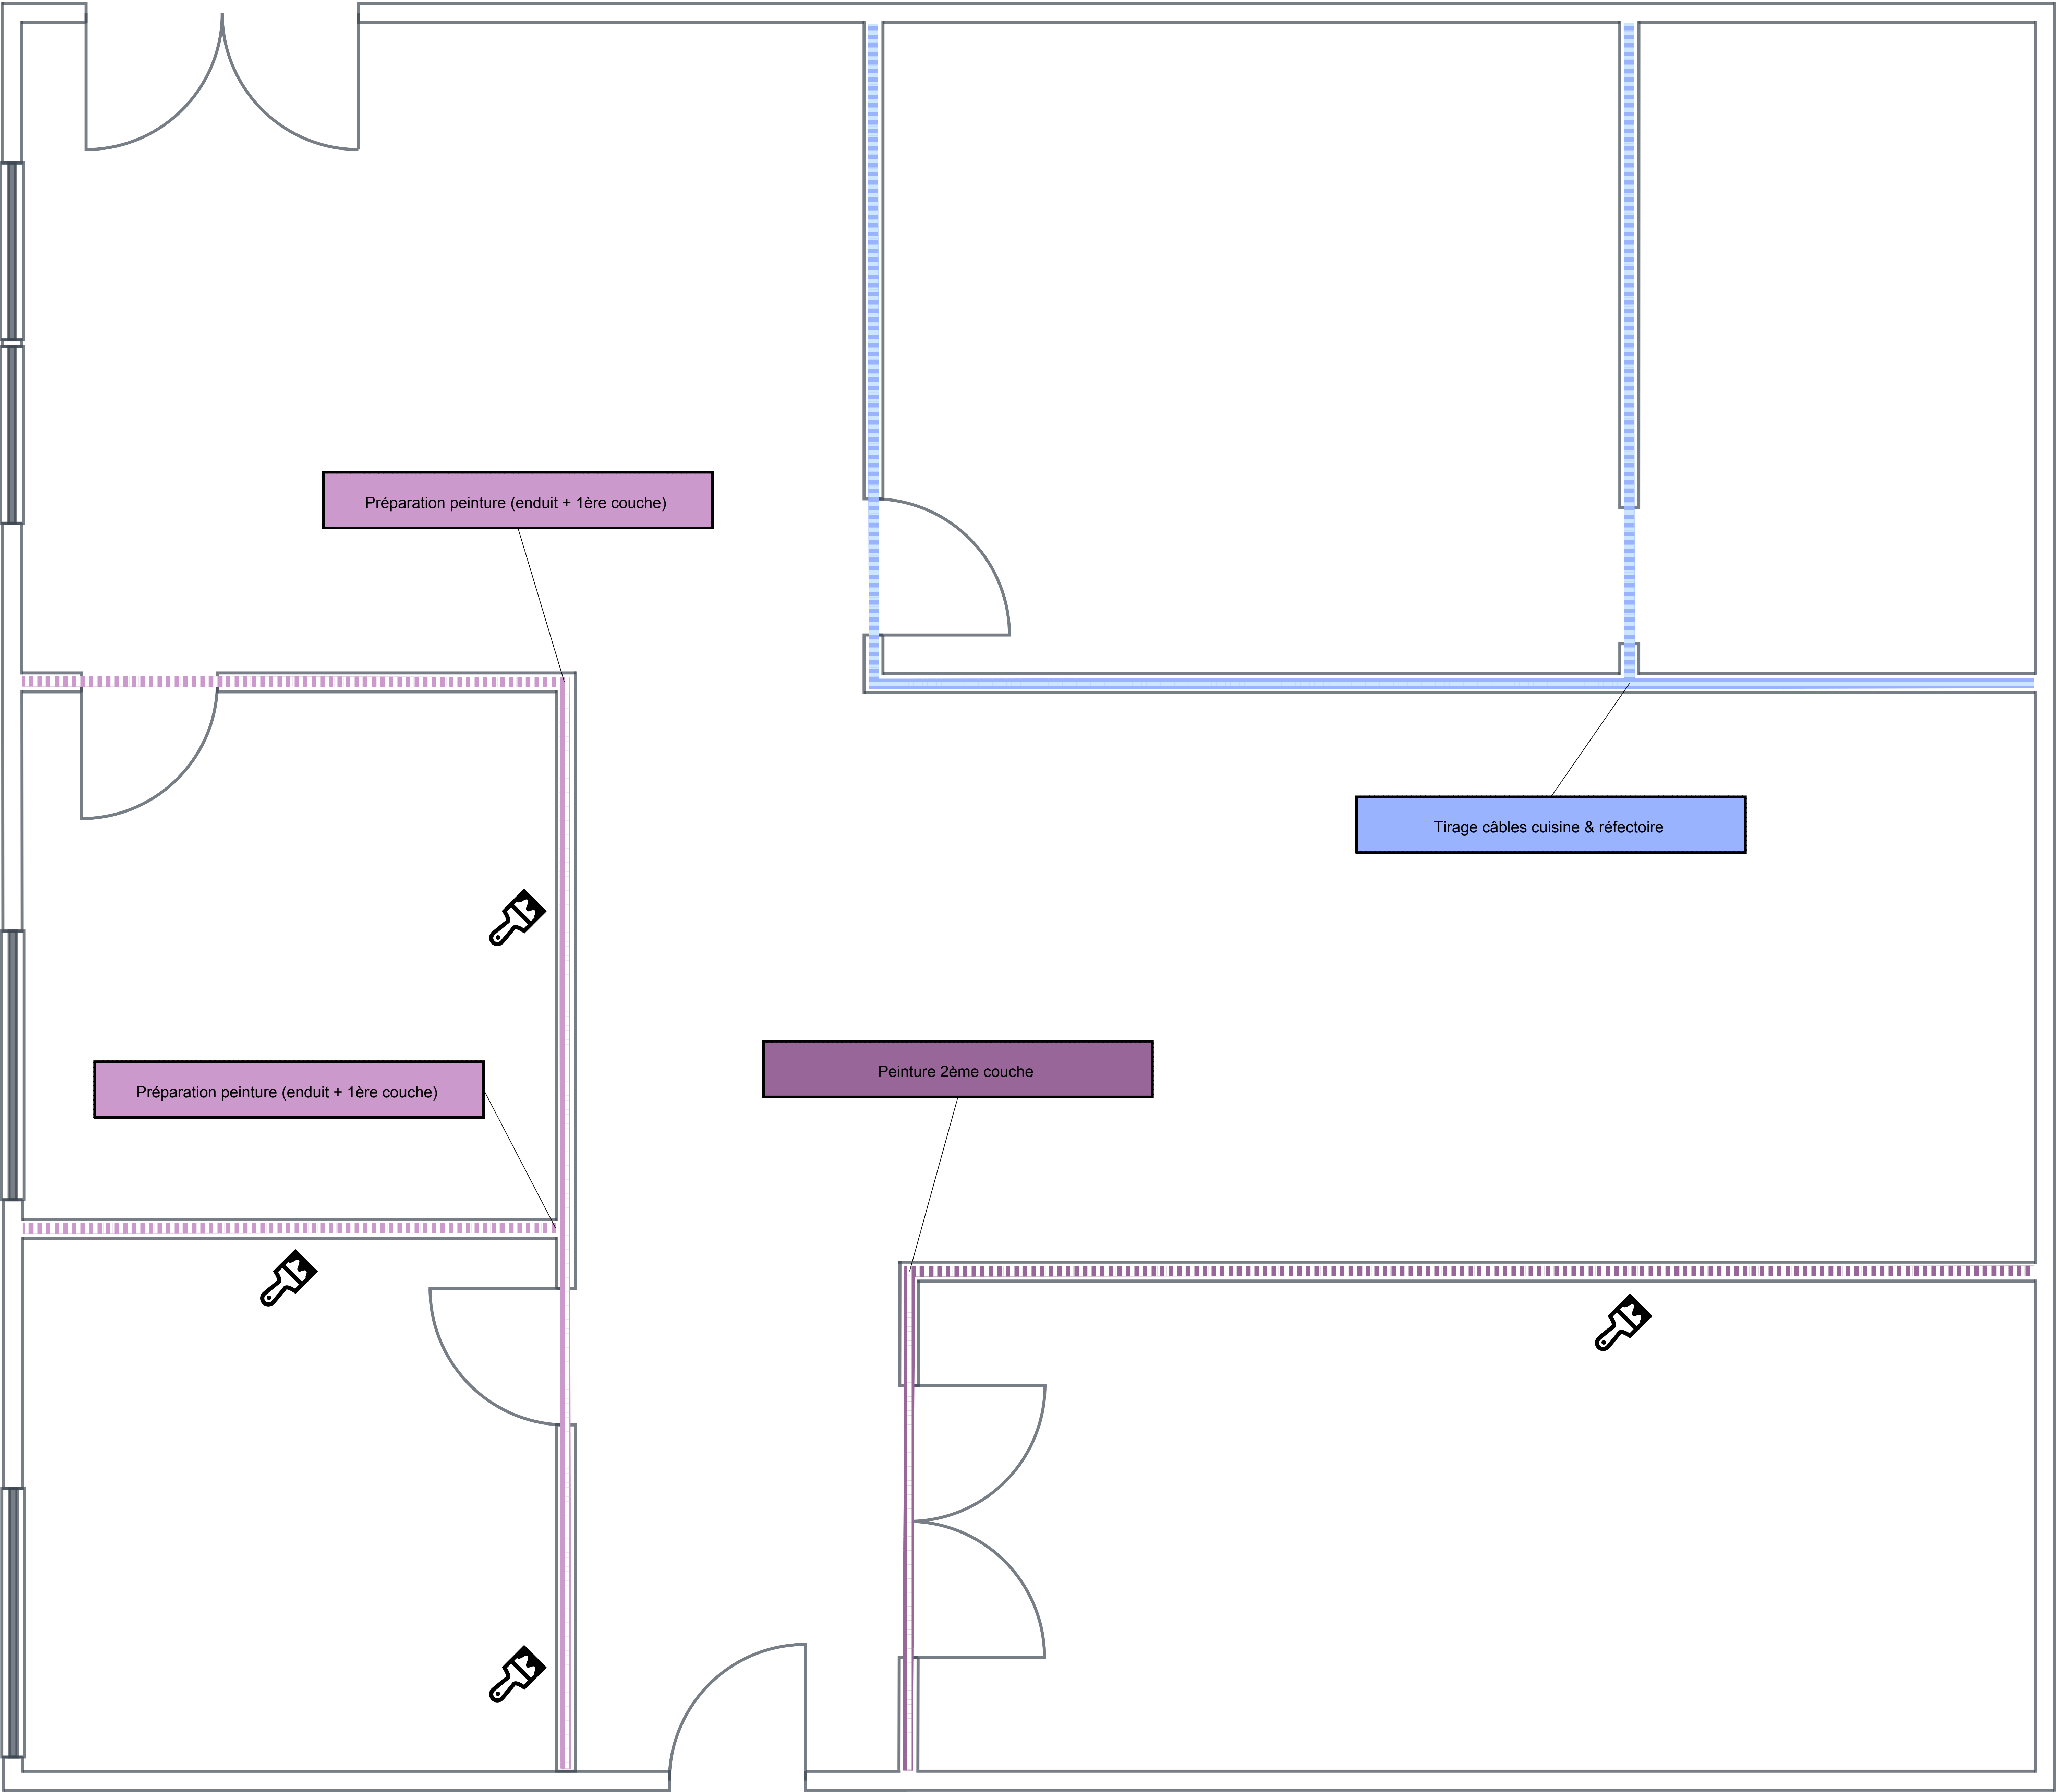

Localisation des travaux





Légende:

	Démolition Cloisons		Tirage câbles		Peinture 2ème couche		Finitions
	Cloisons		Préparation peinture		Sol		Aménagement
	Chemin câble		Plinthes		Prises		Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux												
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Pose plinthes												
Pose plinthes												
Pose sol												
Préparation peinture (enduit + 1ère couche)												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

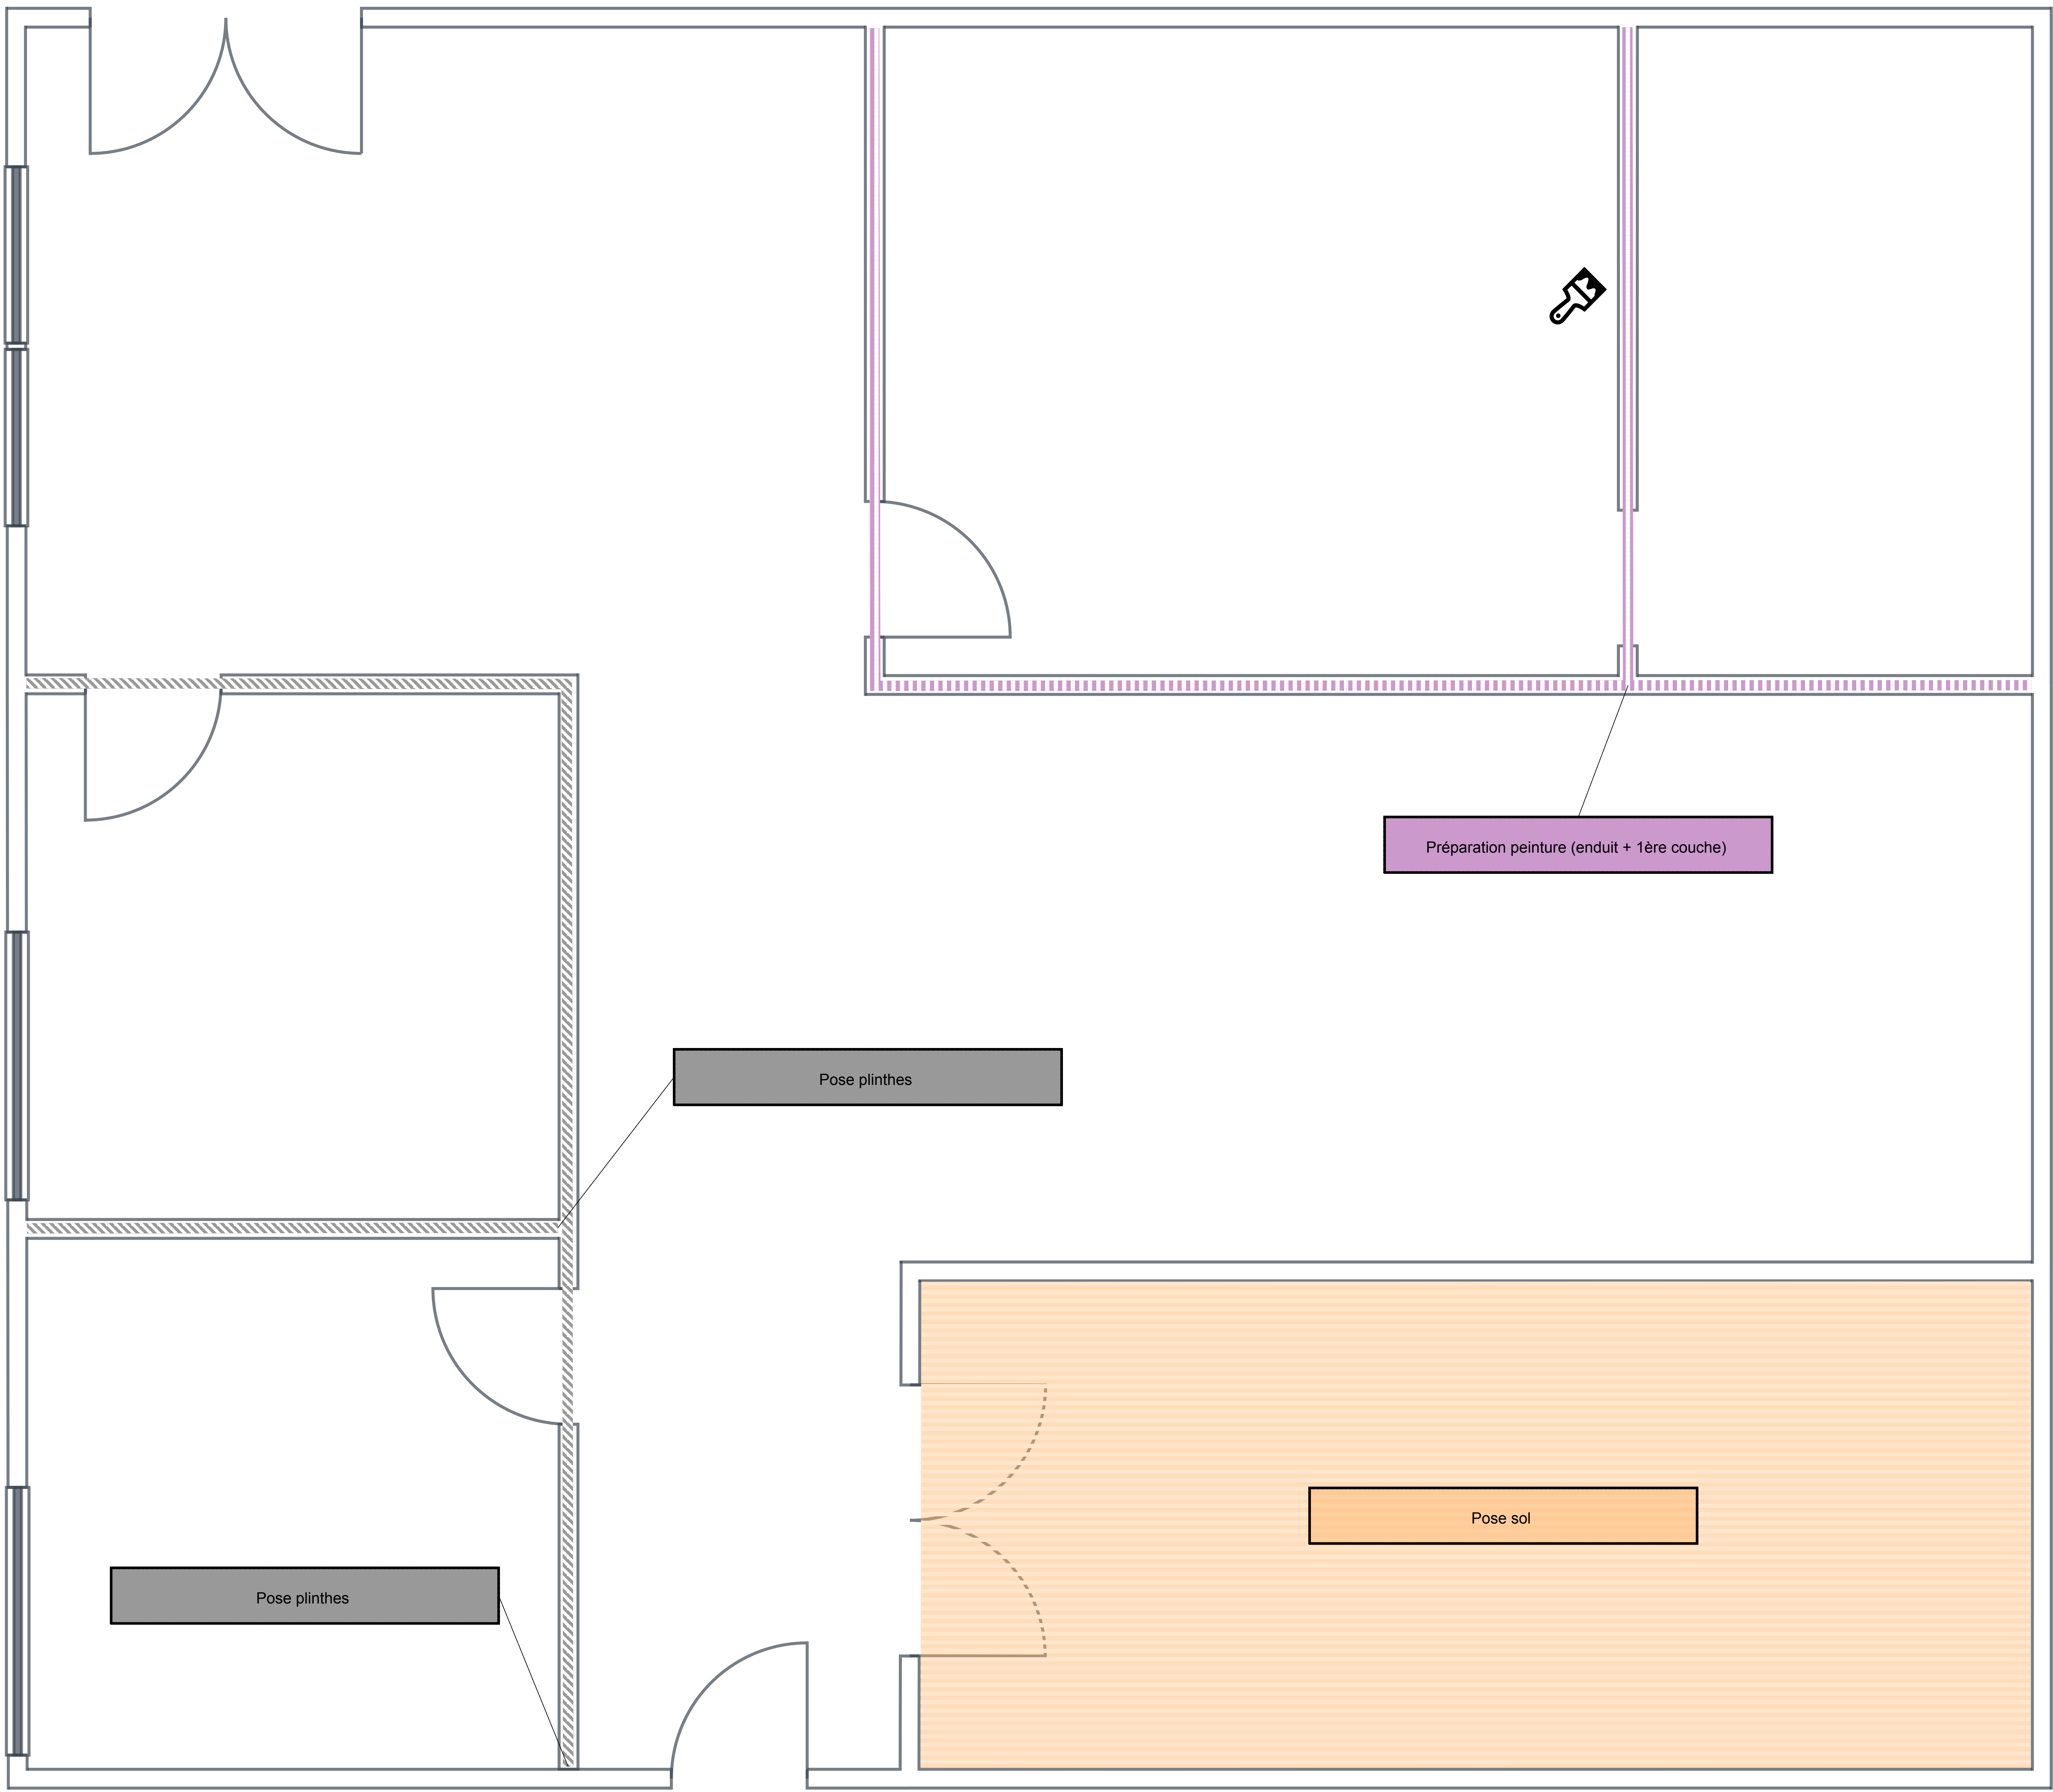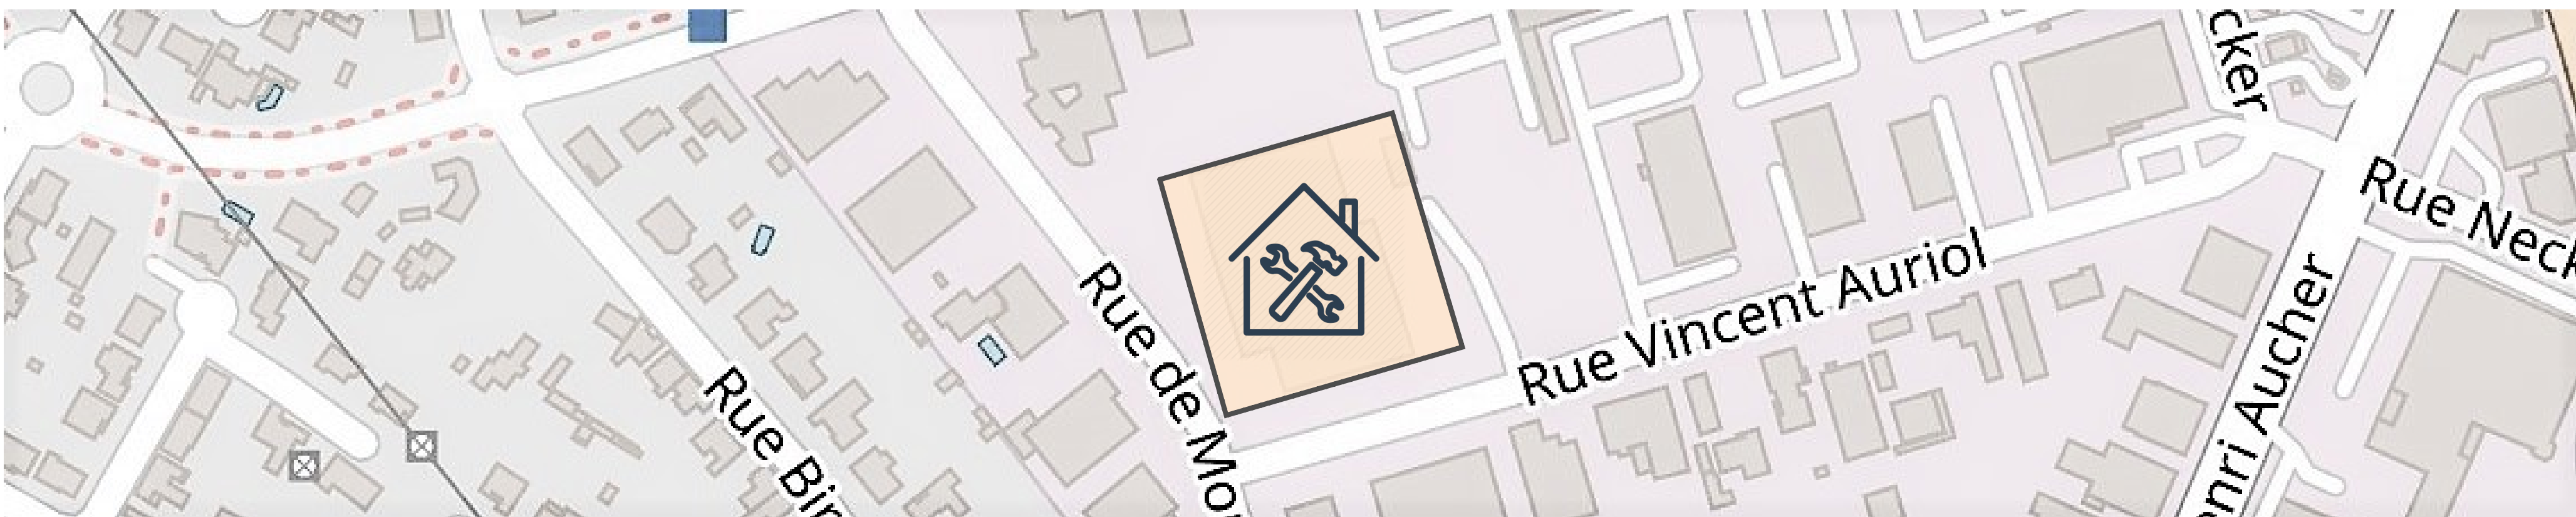Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:0029/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Peinture 2ème couche	02/08/2018 08:0005/08/2018 16:00											
Peinture 2ème couche	02/08/2018 08:0004/08/2018 16:00											
Pose plinthes	02/08/2018 08:0004/08/2018 16:00											
Pose prises (Téléphone-RJ45-Interrupteur)	02/08/2018 08:0003/08/2018 16:00											
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

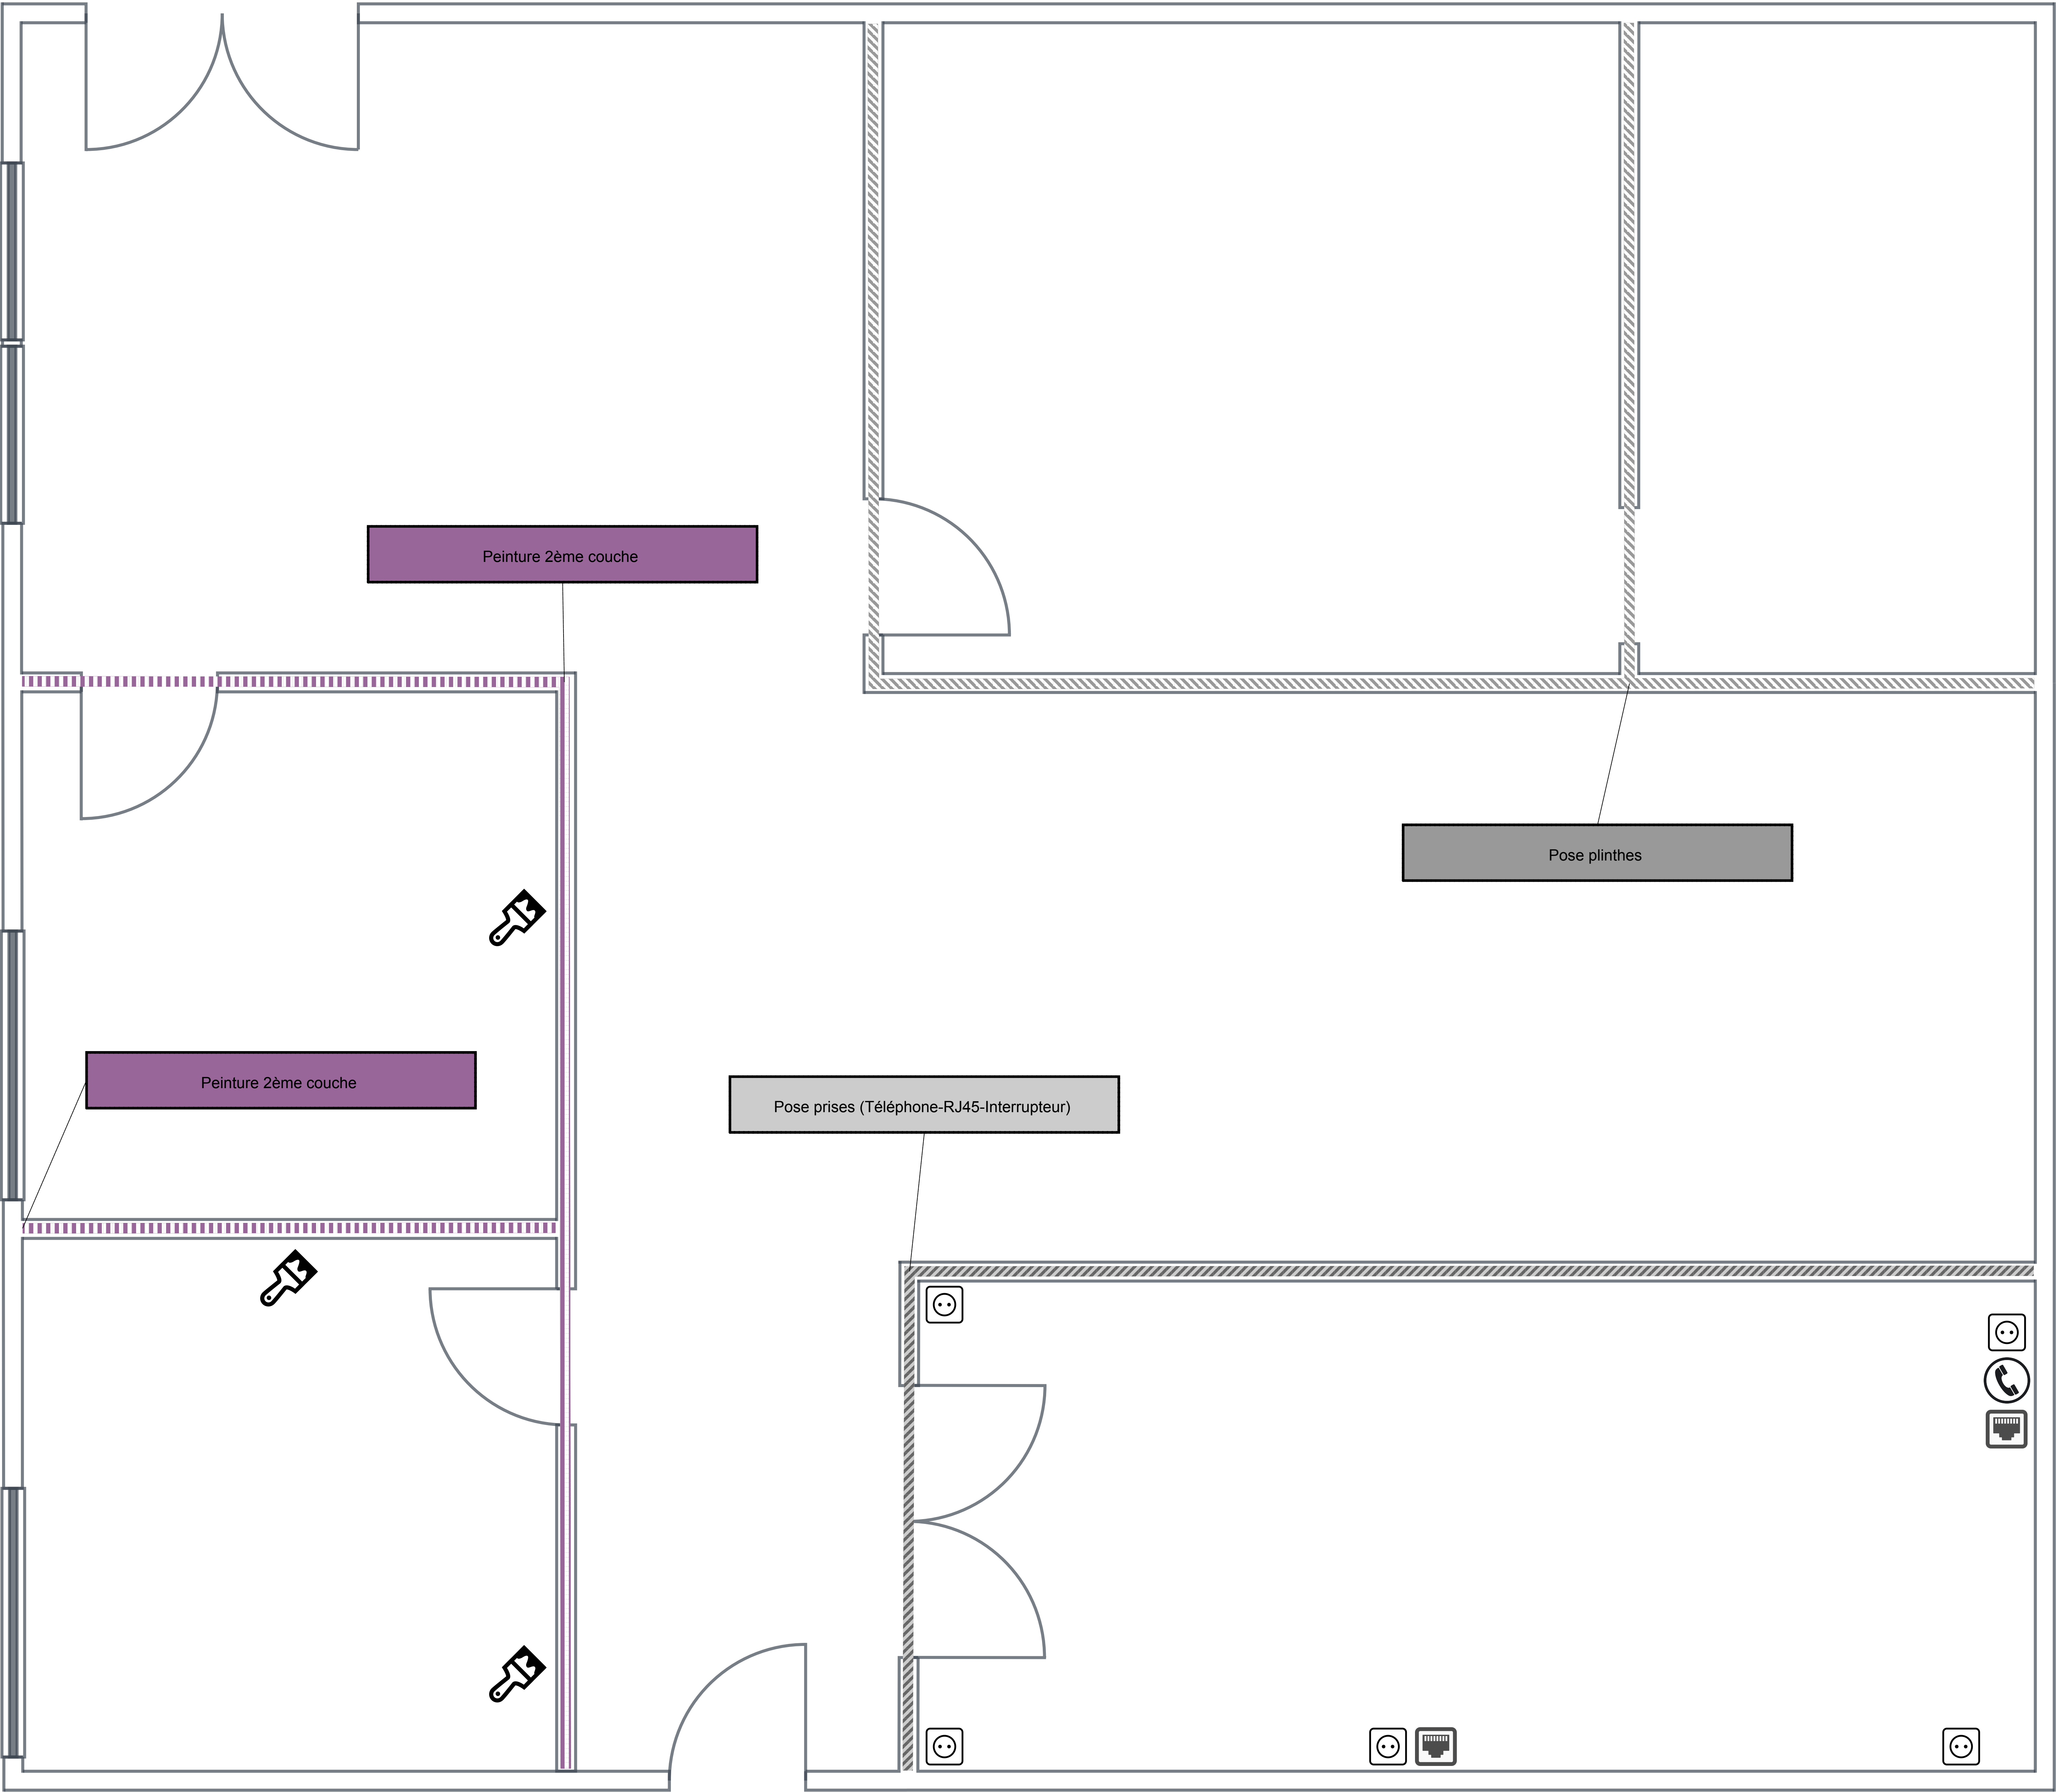

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Finitions								06/08/2018 08:00 07/08/2018 16:00				
Pose sol								06/08/2018 08:00 09/08/2018 16:00				
Pose sol								06/08/2018 08:00 09/08/2018 16:00				
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

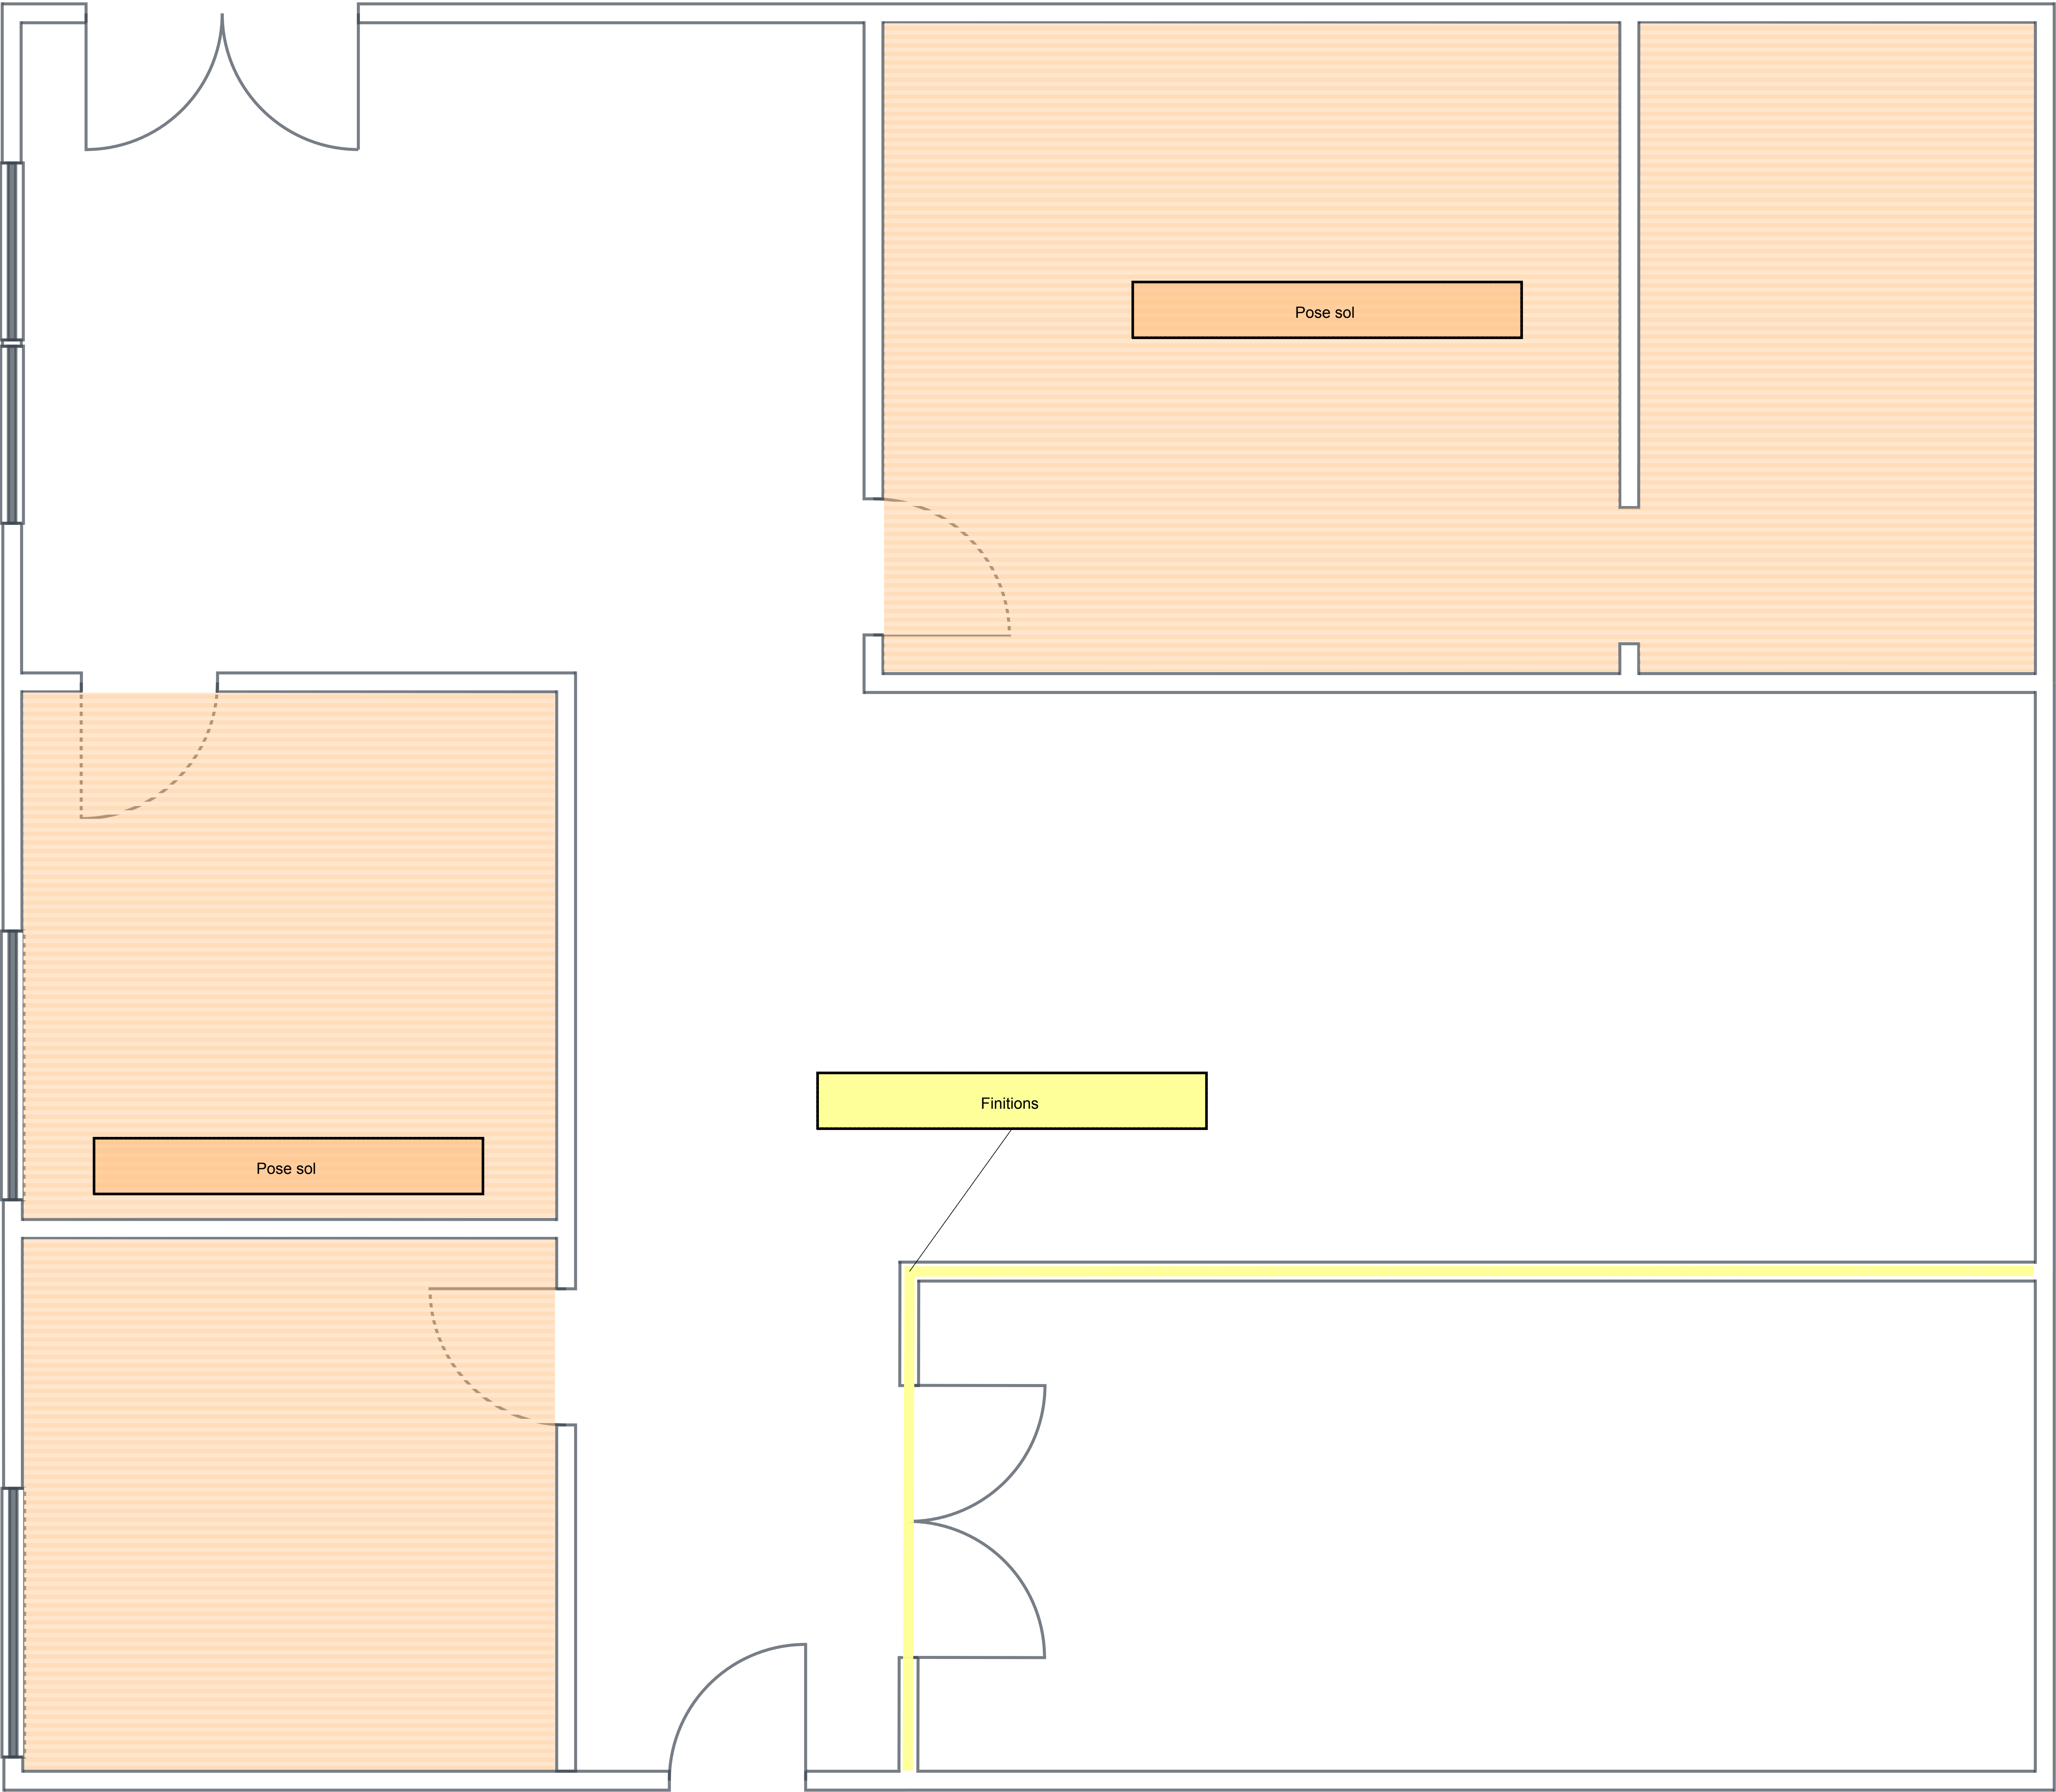

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol

Prises


Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Aménagement réfectoire												
Peinture 2ème couche												
Pose prises (Téléphone-RJ45-Interrupteur)												
Pose prises (Téléphone-RJ45-Interrupteur)												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

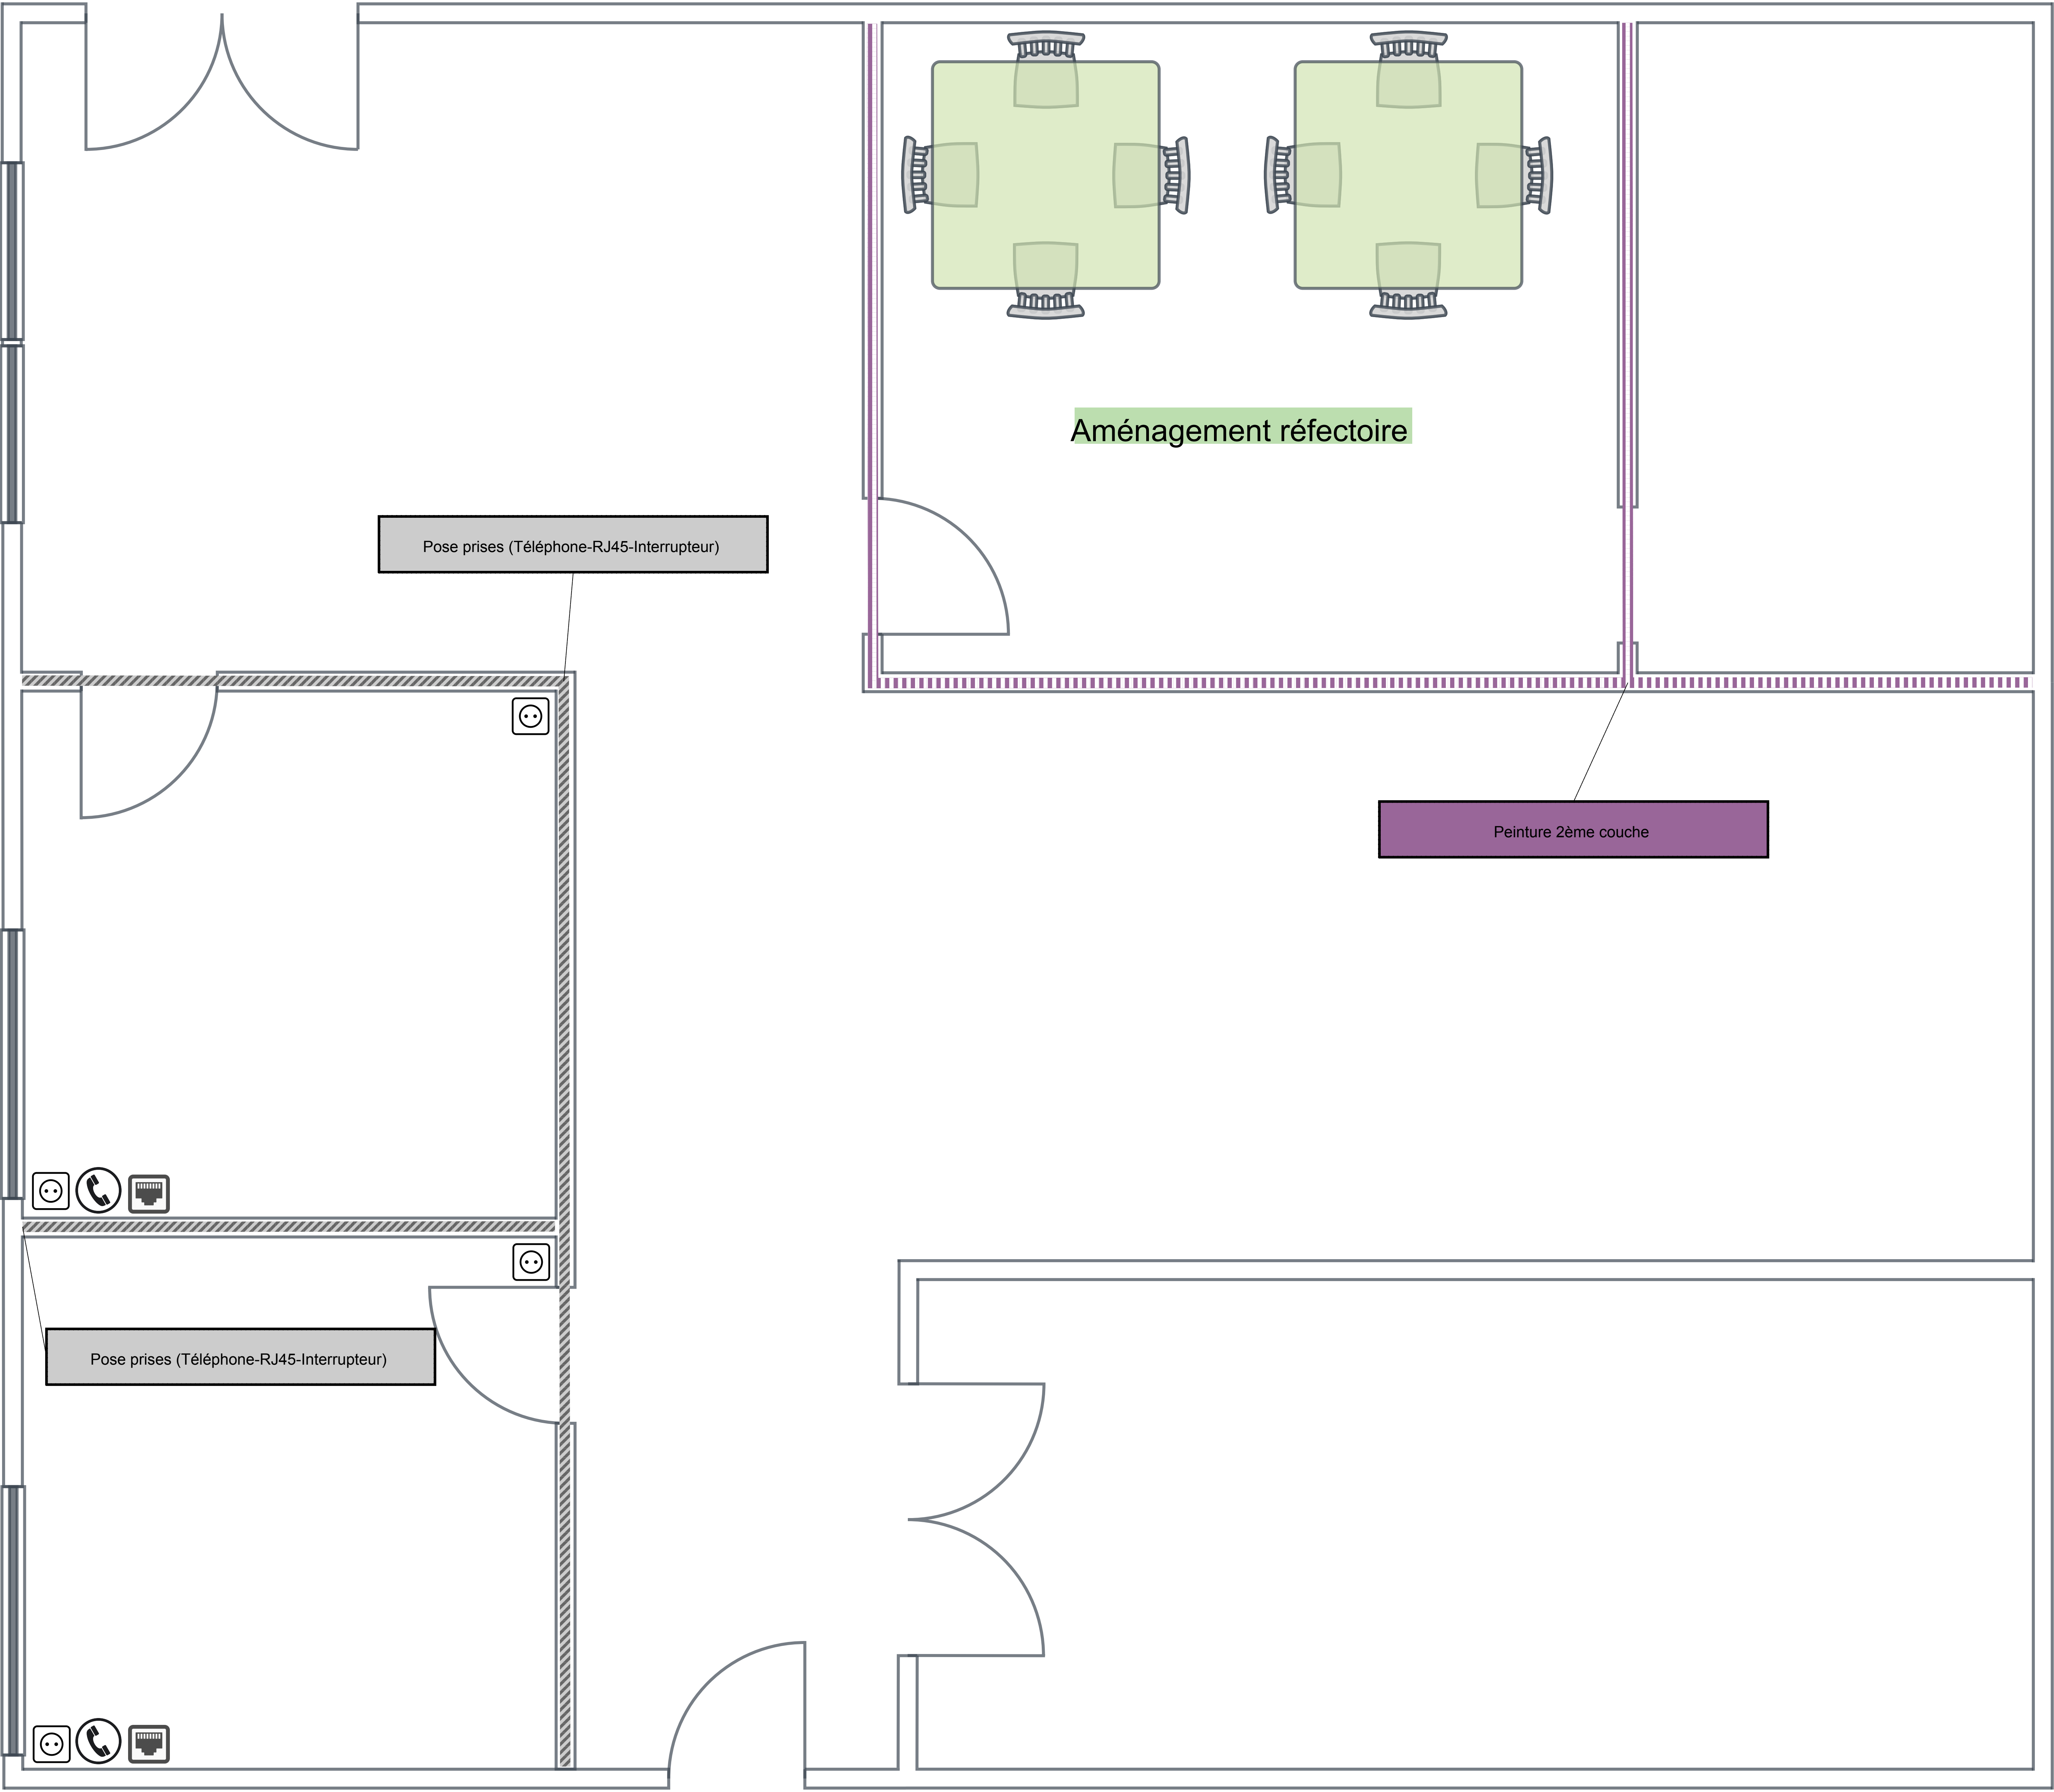Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Jun	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 - 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Aménagement Salle attente	14/08/2018 08:00 - 16/08/2018 16:00											
Finitions	14/08/2018 08:00 - 17/08/2018 16:00											
Finitions	14/08/2018 08:00 - 17/08/2018 16:00											
Pose prises (Téléphone-RJ45-Interrupteur)	14/08/2018 08:00 - 17/08/2018 16:00											
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

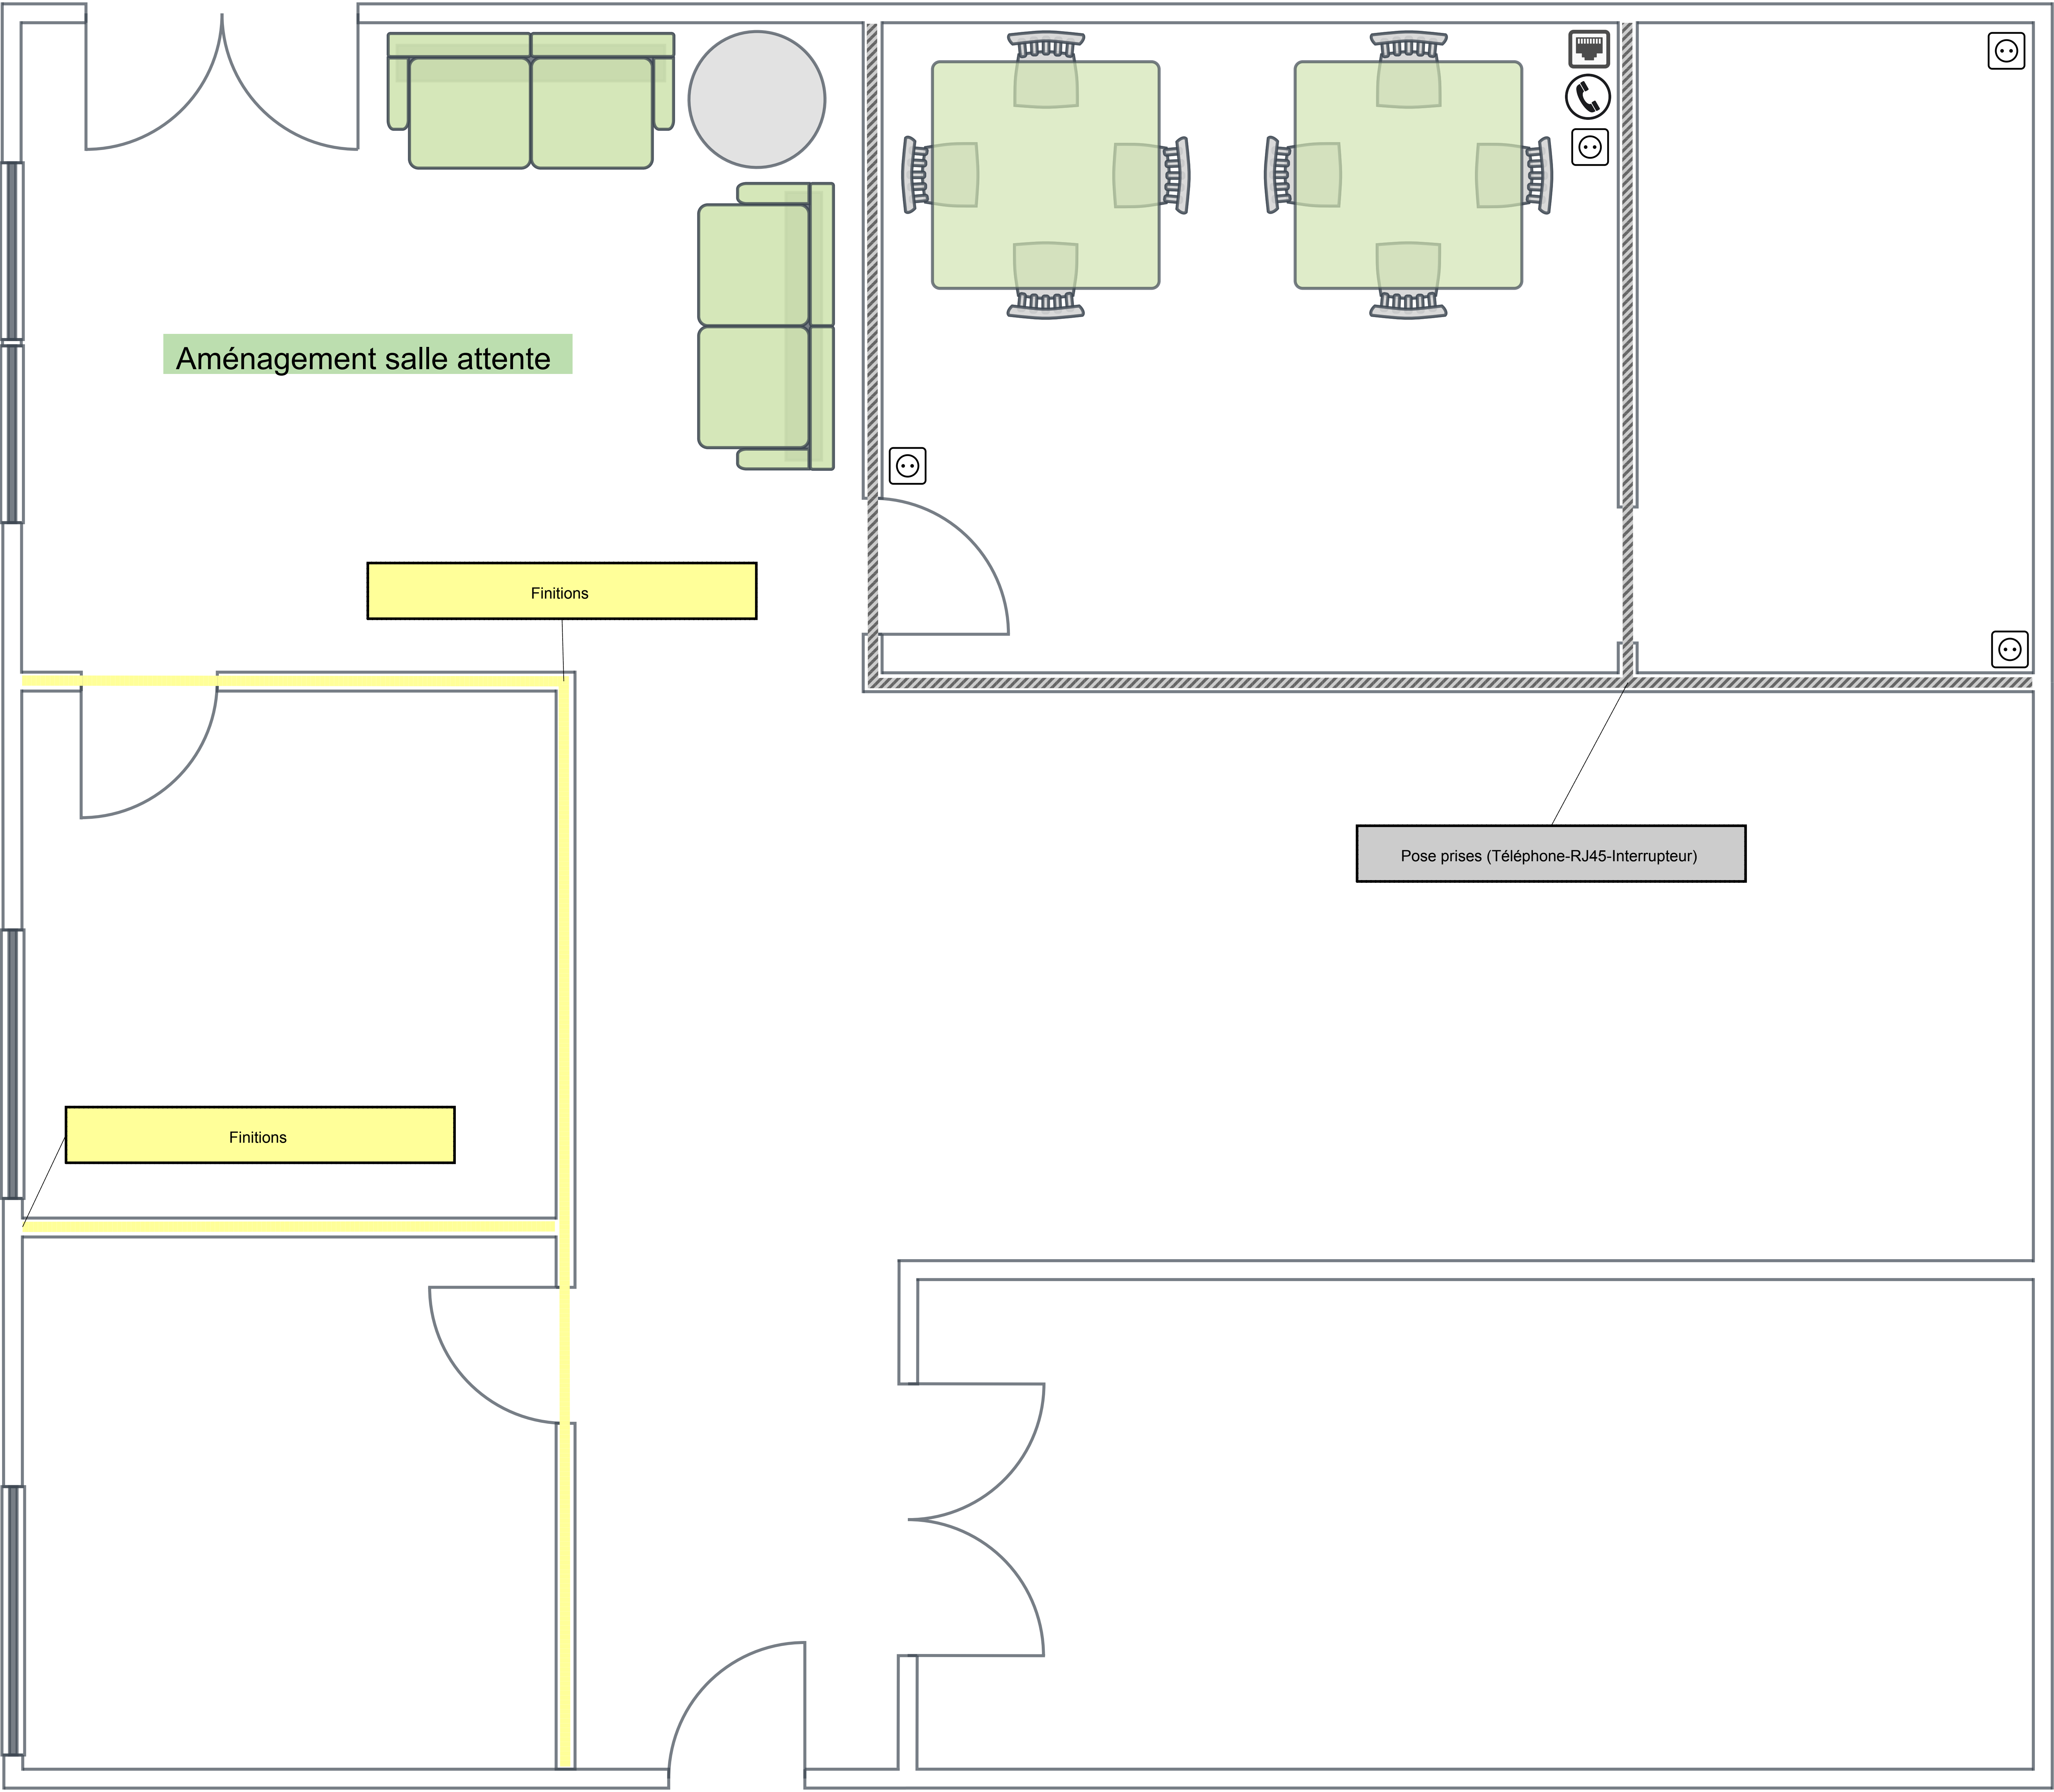

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Aménagement Bureaux												
Finitions												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

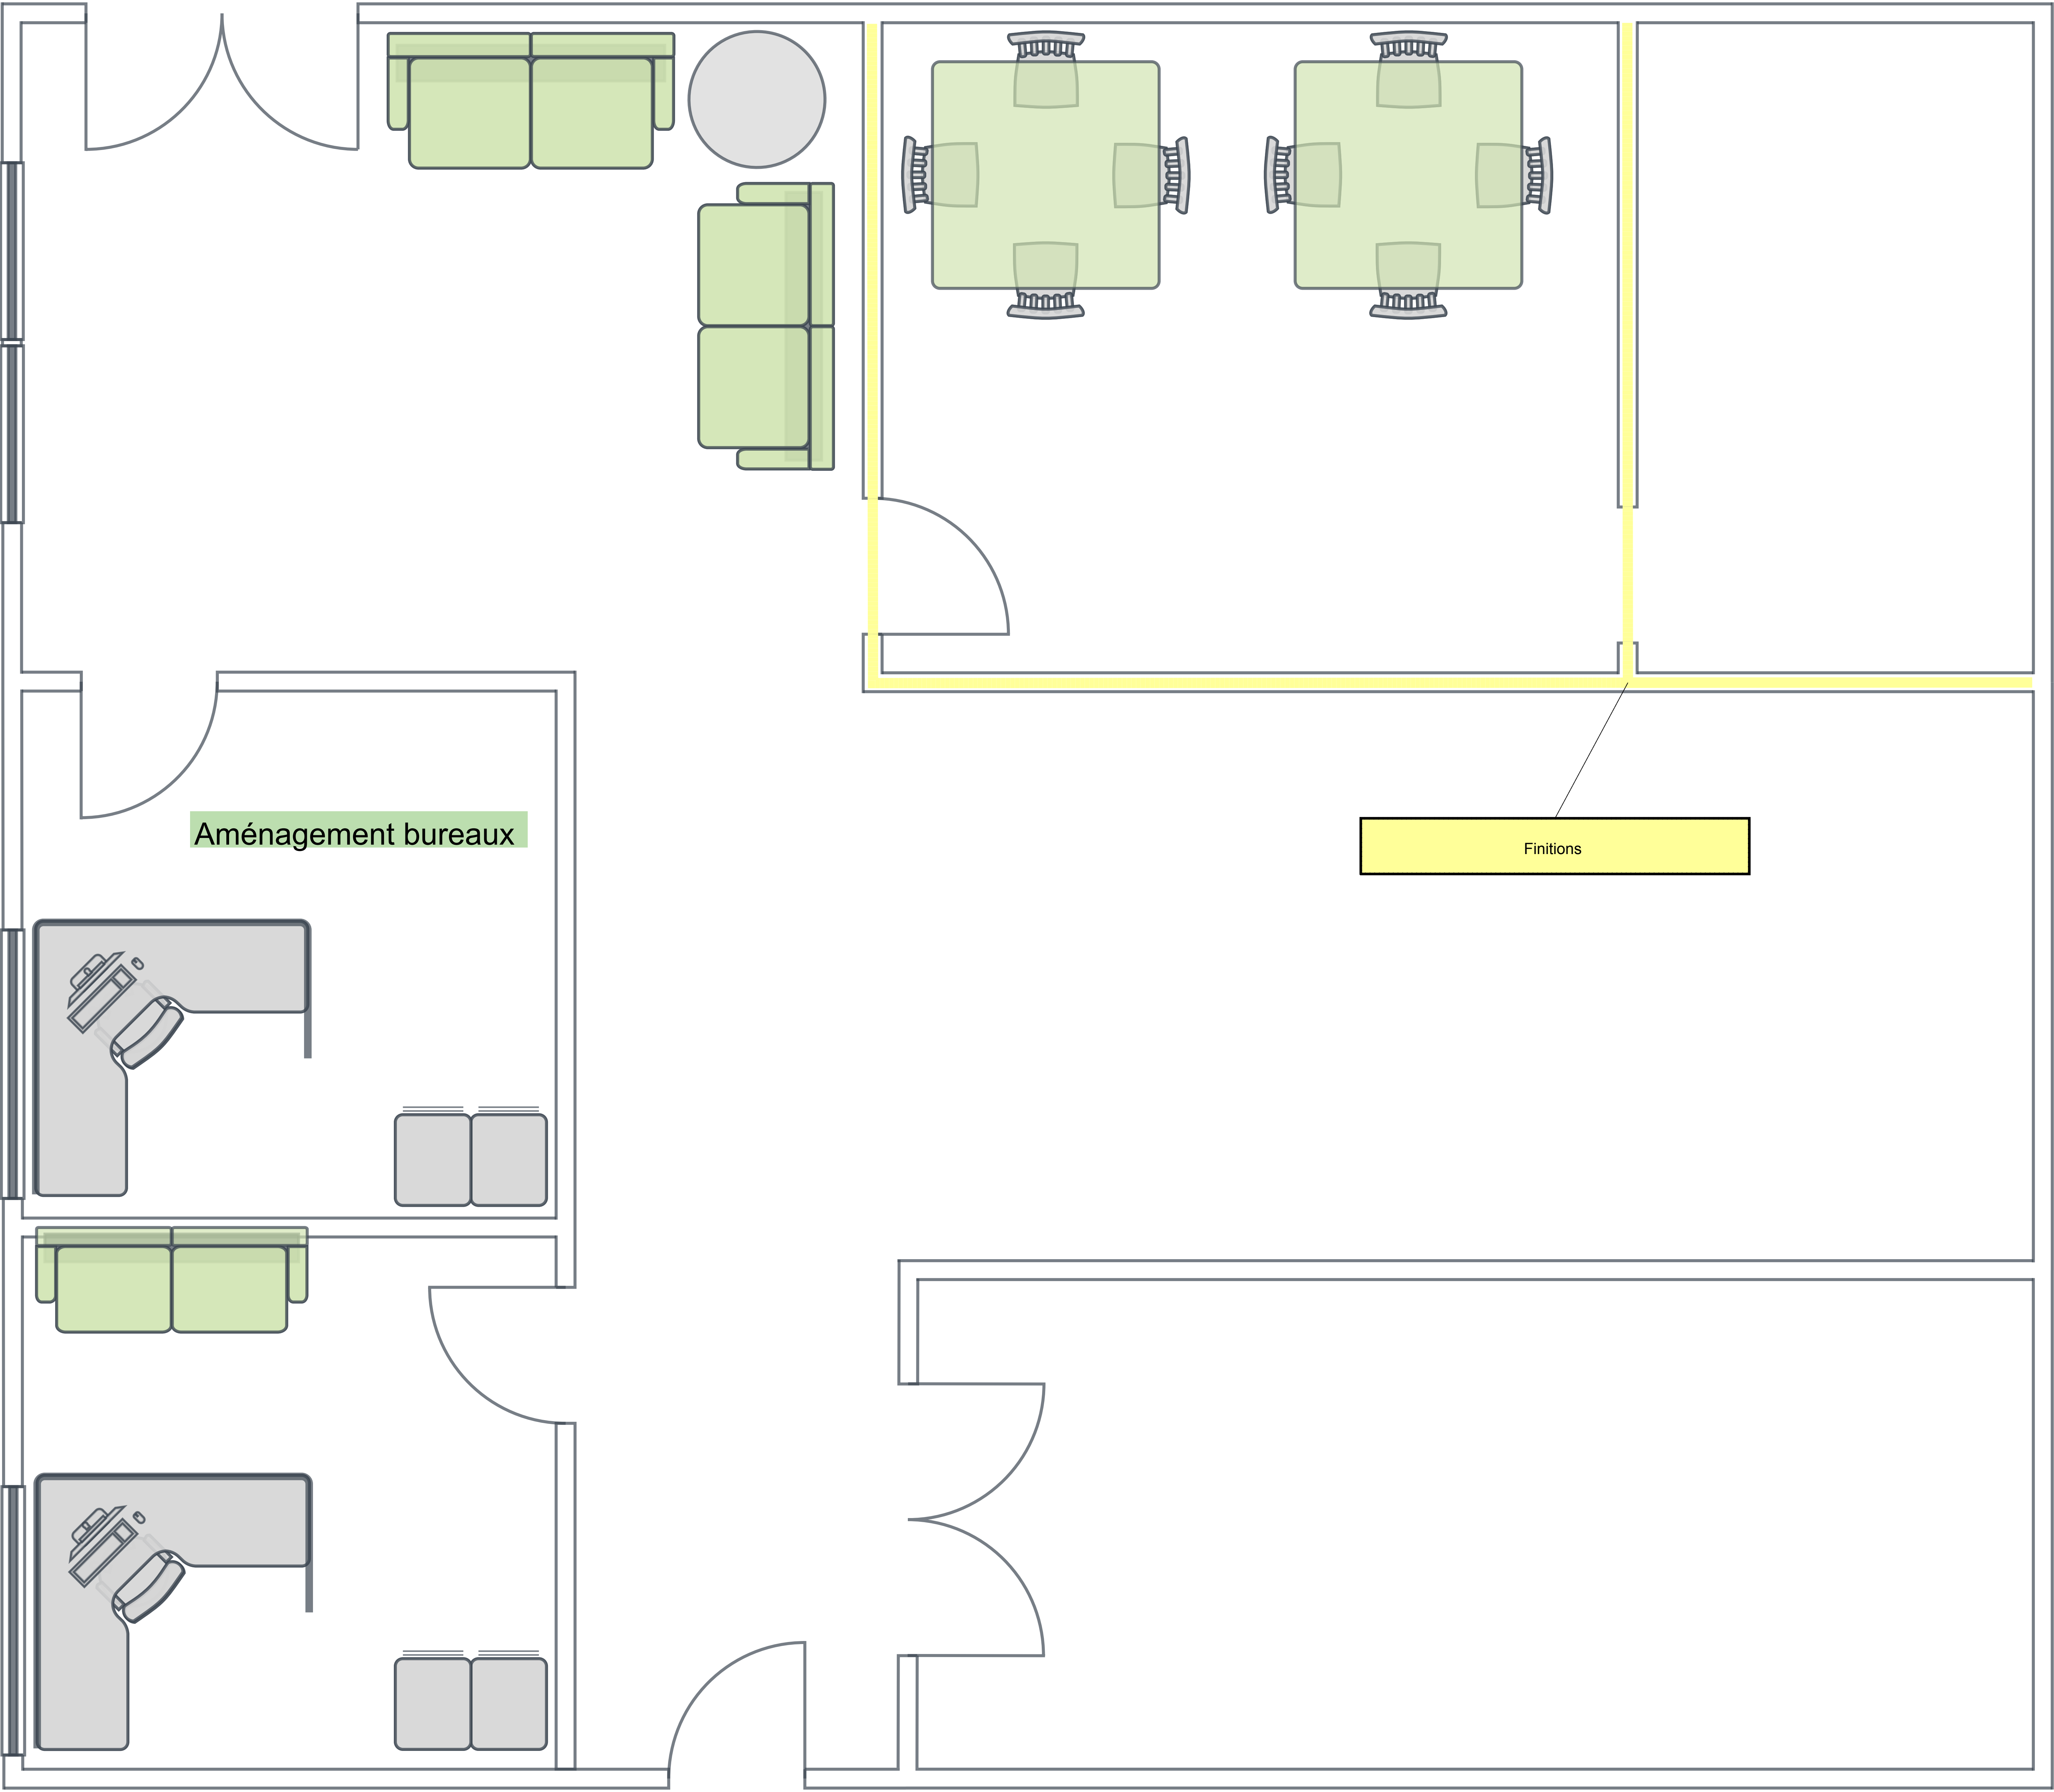

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol


Prises

Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Aménagement Cuisine & Accueil												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

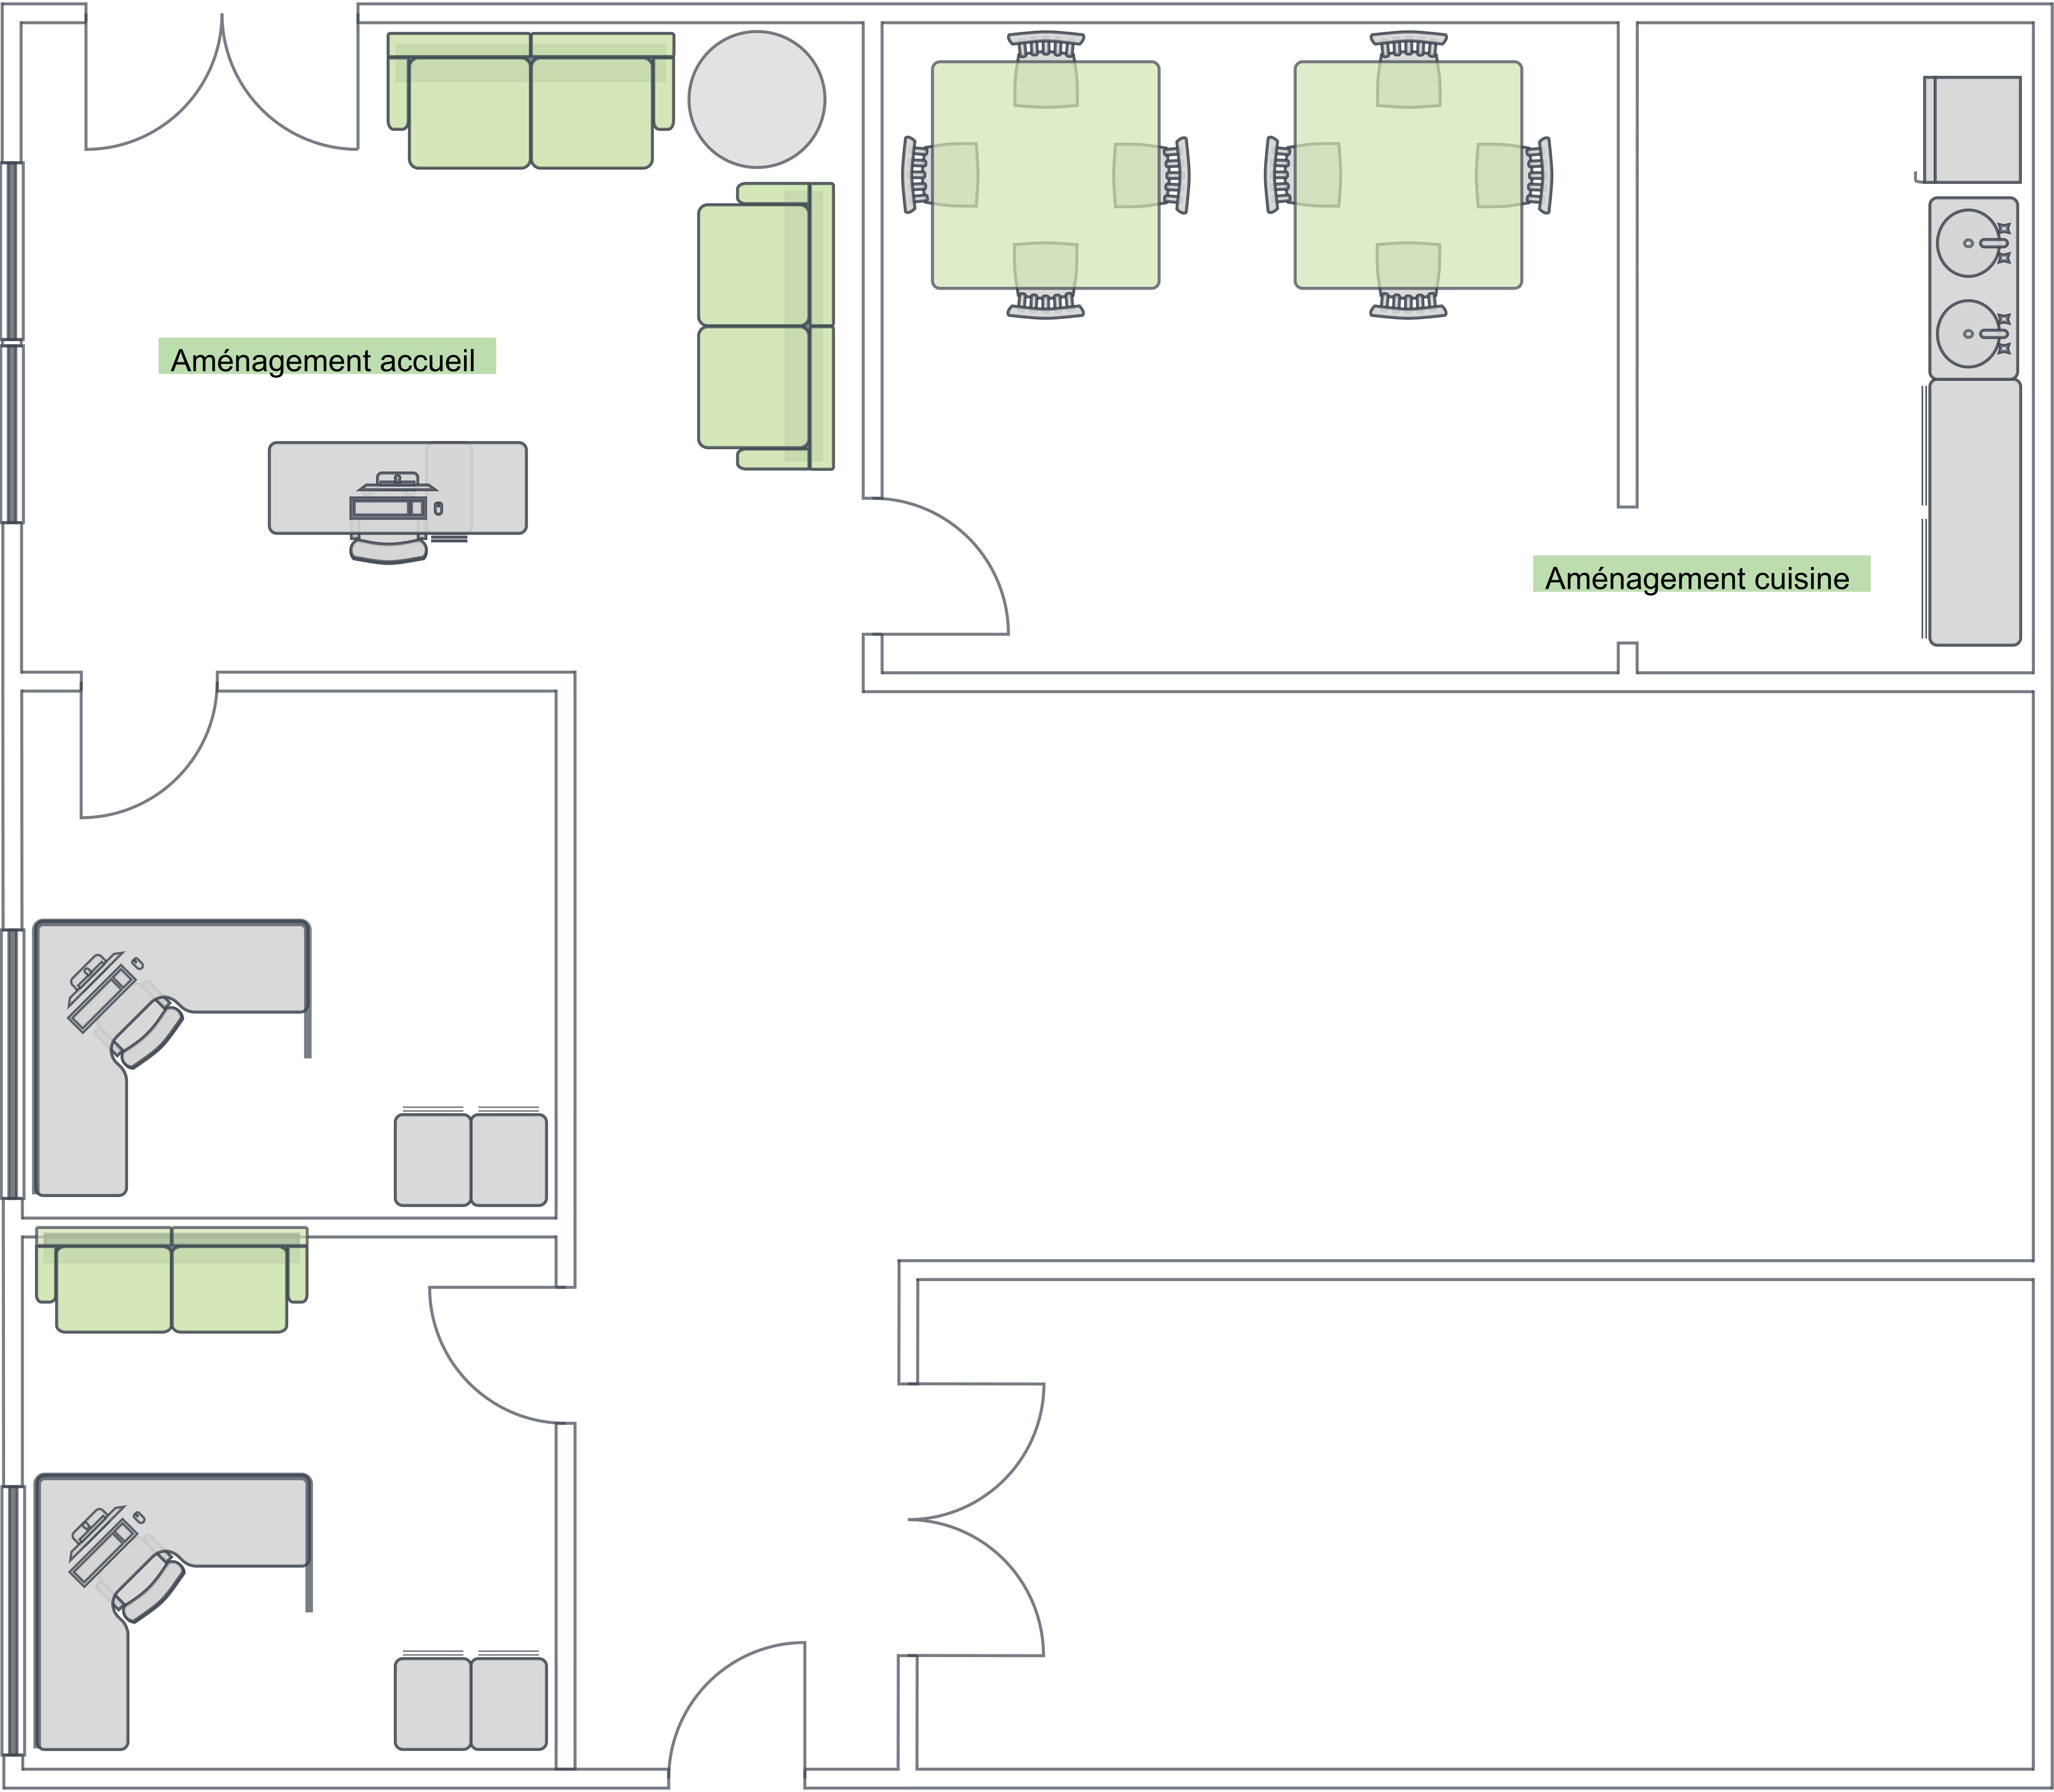

Localisation des travaux



Légende

Démolition Cloisons

Cloisons

Chemin câble

Tirage câbles

Préparation peinture

Plinthes

Peinture 2ème couche

Sol

Prises



Finitions

Aménagement

Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août				Septembre	
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux	04/07/2018 08:00 29/08/2018 16:00											
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Aménagement Open space & Salle de réunion												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												

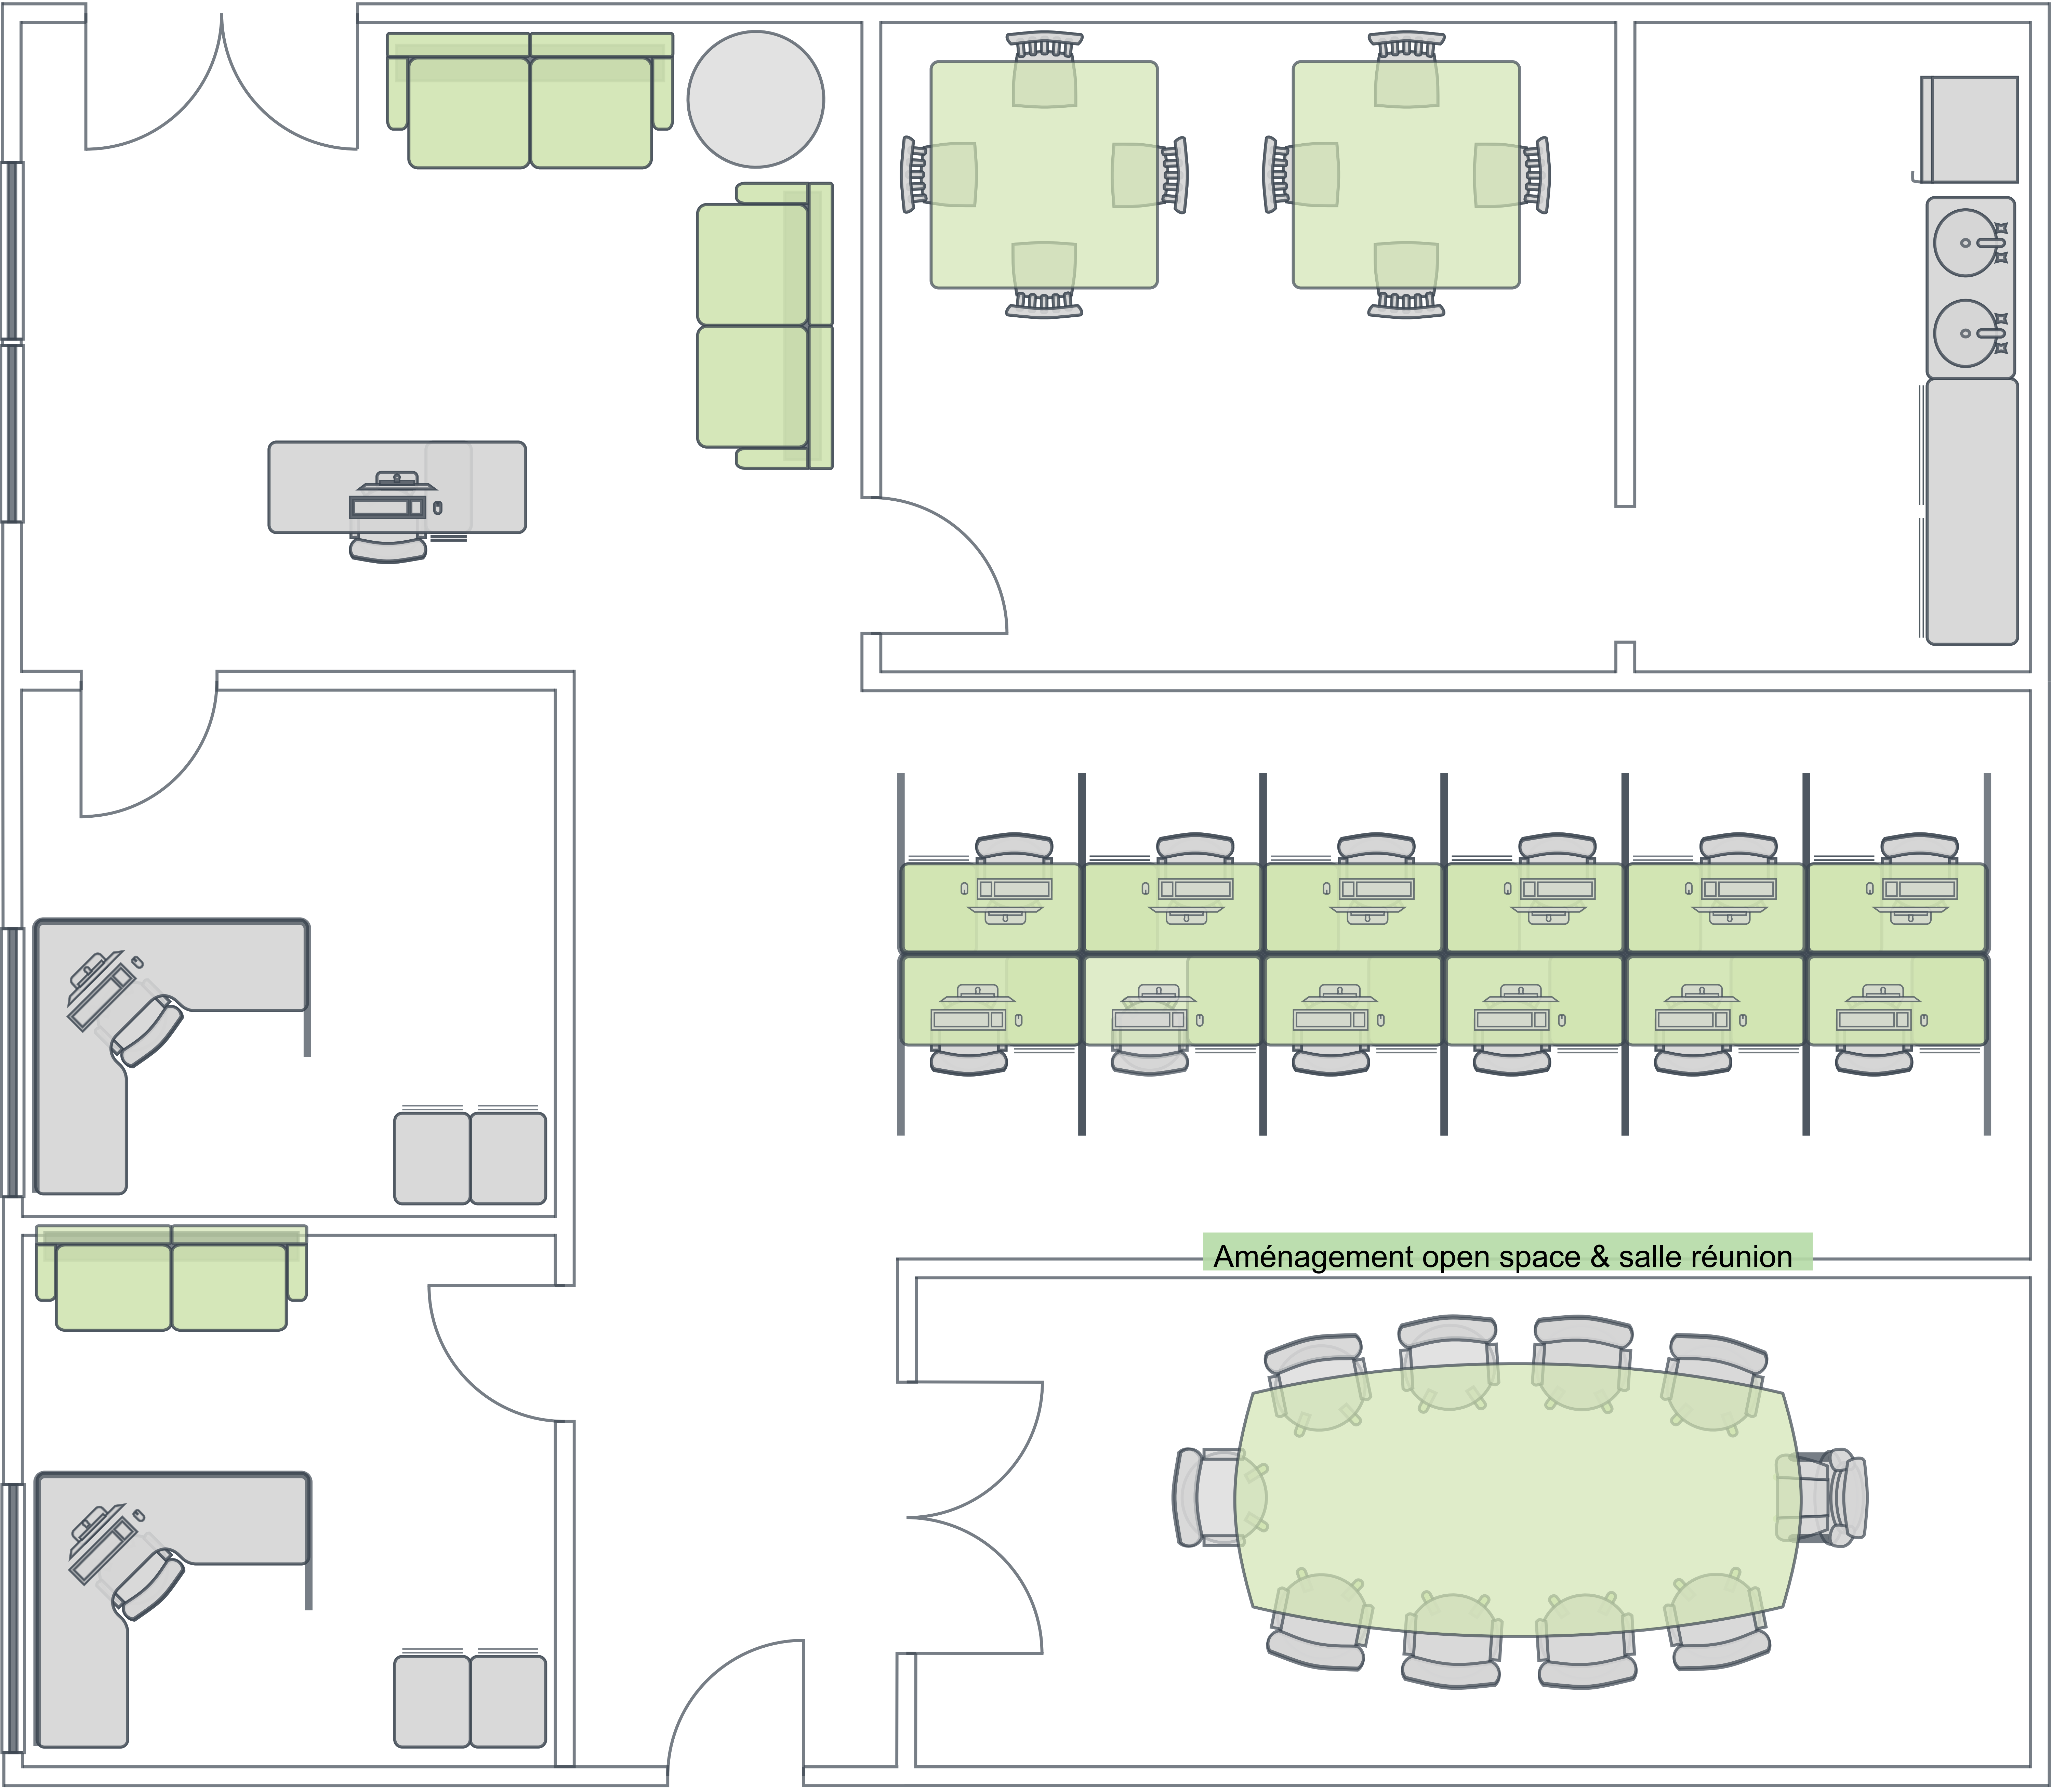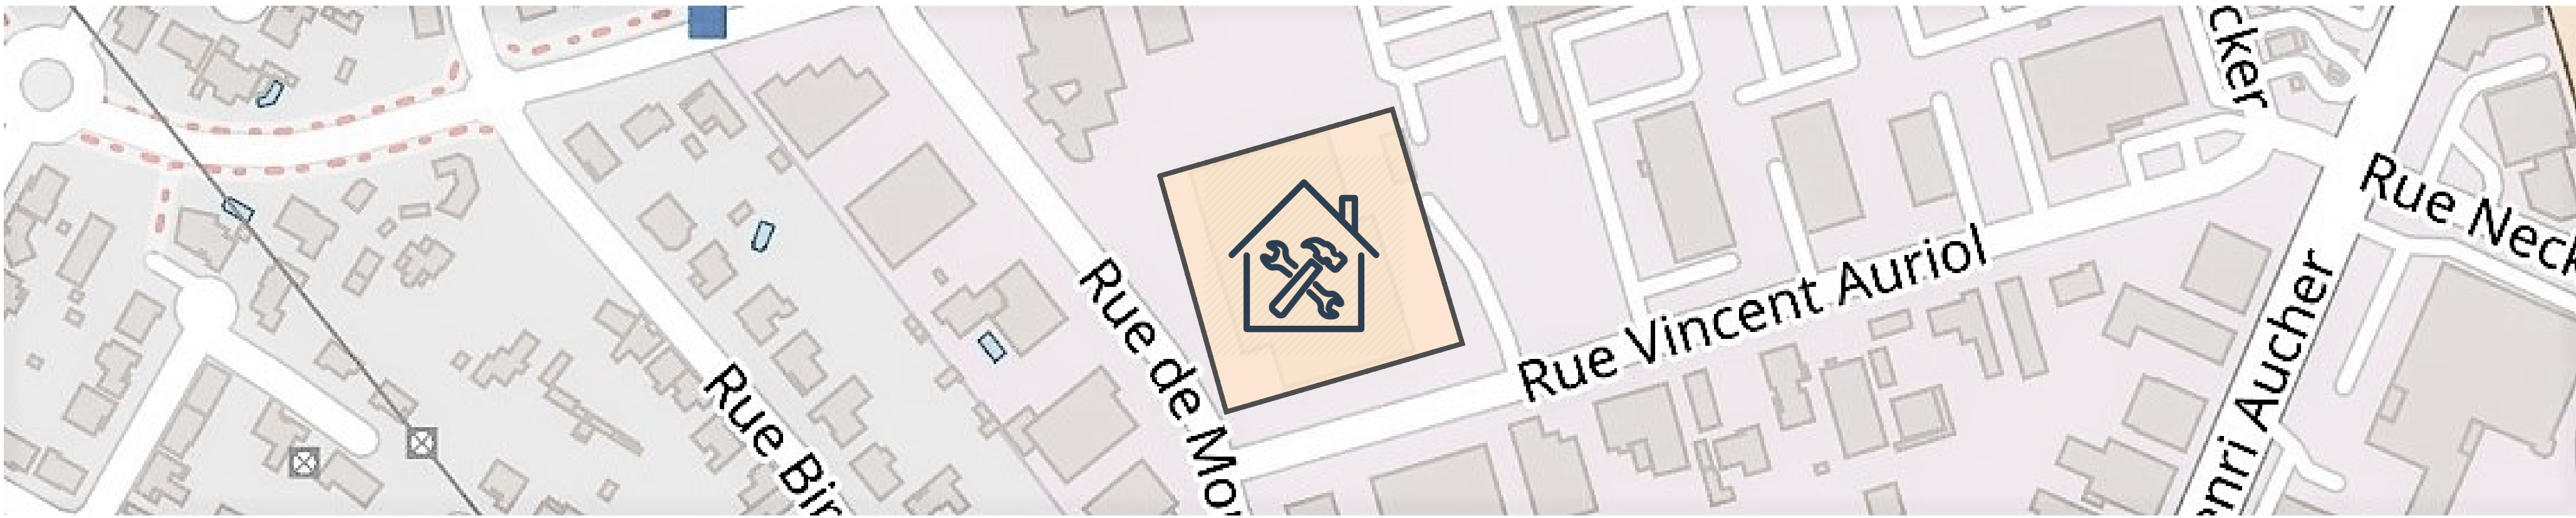Localisation des travaux



Légende

	Démolition Cloisons		Tirage câbles		Peinture 2ème couche		Finitions
	Cloisons		Préparation peinture		Sol		Aménagement
	Chemin câble		Plinthes		Prises		Sécurité

Nom (PM)	2018											
	Juin	Juillet					Août					Septembre
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Localisation bureau												
Rénovation bureaux												
Phase 0 - Démolition Cloisons												
Phase 01 - Préparation chantier												
Phase 02 - Travaux de cloisons												
Phase 03- Travaux de cloisons												
Phase 04- Travaux de cloisons												
Phase 05- Travaux de cloisons												
Phase 06- Travaux de cloisons												
Phase 07- Travaux de cloisons												
Phase 08- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 09- Travaux de cloisons												
Phase 10- Travaux de cloisons + Pose sol												
Phase 11- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 12- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 13- Travaux de cloisons + Aménagement												
Phase 14- Aménagement												
Phase 15- Aménagement												
Phase 16 - Installation équipements de sécurité												
Installation DI - Alarme - Extincteurs - Sortie sec.												

Localisation des travaux

